



DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLIAS

DIRECTOR

ARQ. CESAR ALEJANDRO MACIAS BRIONES

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**LIC. SAÚL MONRELA ÁVILA**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**ARQ. ALEJANDRO CESAR MACIAS BRIONES**

OBRA	No. DE CONTRATO	PROGRAMA
CONSTRUCCIÓN DE 5,154.05 M2 DE PAVIMENTO, 907 ML DE GUARNICIONES Y 1,780 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 481.00 ML DE TUBO P.V.C. SANITARIO LISO Y 481.00 ML DE TUBO CAMPANA P.V.C. HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO	MF OP CP FEMM-22-18	FONDO MINERO
	PERIODO DE EJECUCIÓN	25/OCTUBRE/2018 al 21/FEBRERO/2019
	AVANCE FINANCIERO	62.56%
	AVANCE DE OBRA	100%
	CONTRATISTA	<u>CONSTRUCTORA PARROQUIA S.A. DE C.V.</u>







## PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**LIC. SAÚL MONRELA ÁVILA**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**ARQ. ALEJANDRO CESAR MACIAS BRIONES**

OBRA	No. DE CONTRATO	PROGRAMA
<b>Pavimentación de 16,800 m2 mediante carpeta asfáltica, del camino entre las localidades Guadalupe de Trujillo y Matías Ramos, tramo km 0 + 00 al 2 + 400. en el Municipio de Fresnillo.</b>		<b>FONDO MINERO</b>
	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN</b>	<b>01/enero/2018 al 29/junio/2019</b>
	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	<b>42%</b>
	<b>AVANCE DE OBRA</b>	<b>54%</b>
	<b>CONTRATISTA</b>	<b><u>TRITURADOS SANTO NIÑO S.A. DE C.V.</u></b>

COMPACTACION DE FONDO DE EXCAVACION COMPACTADO AL 95%, TRAZO PARA LA REALIZACION DE EXCAVACIONES EN OBRAS DE DRENAJE



## PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**LIC. SAÚL MONRELA ÁVILA**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ARQ. ALEJANDRO CESAR MACIAS BRIONES**

OBRA	No. DE CONTRATO	PROGRAMA
IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA A BASE DE UNA MEMBRANA LIQUIDA DE POLIURETANO, CON UN TOTAL DE 1,662.54 M2 EN MUSEO ÁGORA JOSÉ GONZÁLEZ	<u>MF OP IR FEMM-37-18</u>	FONDO MINERO
	PERIODO DE EJECUCIÓN	01/ENERO/2019 al 01/MARZO/2019
	AVANCE FINANCIERO	75.5%
	AVANCE DE OBRA	100%
	CONTRATISTA	C. JOSÉ MANUEL FÉLIX ROMÁN JARAMILLO

LA CUBIERTA DE AZOTEA, PRETILES, Y CHÁFALES, ESTOS CONCEPTOS ESTÁN TERMINADO AL 100%.

## PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. SAÚL MONRELA ÁVILA

ARQ. ALEJANDRO CESAR MACIAS BRIONES

OBRA	No. DE CONTRATO	PROGRAMA
<b>CONSTRUCCIÓN DE 1,096.53 M2 DE PAVIMENTO, 445.00 ML DE GUARNICIONES Y 447.00 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ÁLAMO, VADO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 176.00 M2, 57.00 ML DE GUARNICIONES Y 57.00 M2 DE BANQUETAS EN LA AVENIDA VILLA MAYELA DE LA LOCALIDAD</b>	MF OP IR FEMM-33-18	FONDO MINERO
	PERIODO DE EJECUCIÓN	27/NOVIEMBRE/2018 al 26/MARZO/2019
	AVANCE FINANCIERO	57%
	AVANCE DE OBRA	100%
	CONTRATISTA	<u>ALFREDO ÁVILA RAMÍREZ</u>



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**LIC. SAÚL MONRELA ÁVILA**

**ARQ. ALEJANDRO CESAR MACIAS BRIONES**

OBRA	No. DE CONTRATO	PROGRAMA
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMELLÓN CENTRAL DE BOULEVARD SAN JOSÉ ENTRE PASEO DEL MINERAL Y CARRETERA 45D, Y BOULEVARD PASEO DEL MINERAL ENTRE CALLE DE LAS CAMELIAS Y LOMA DE SANTA CRUZ, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE 441 LUMINARIAS LED, 89 POSTES Y 221 DADOS PARA POSTE, EN LA LOCALIDAD DE		FONDO MINERO
	PERIODO DE EJECUCIÓN	29/diciembre/2018 al 27/abril/2019
	AVANCE FINANCIERO	75%
	AVANCE DE OBRA	75%
	CONTRATISTA	<u>ING. RAFAEL RORIGUEZ RODRIGUEZ</u>



SE TERMINO LA COLOCACION DE POSTES Y LUMINARIOS EN BOULEVARD PASEO DEL MINERAL Y SE TIENE UN AVANCE DEL 15% EN LA COLOCACION DE LUMINARIOS EN BOULEVARD SAN JOSE



## PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SAÚL MONRELA ÁVILA  
BRIONES

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. ALEJANDRO CESAR MACIAS

OBRA	No. DE CONTRATO	PROGRAMA
CONSTRUCCIÓN DE 279 METROS LINEALES DE MURO PERIMETRAL A BASE DE BLOCK HUECO LIGERO DE 15X20X40 CM., EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CON CLAVE 32DPR09670. EN LA LOCALIDAD SAUCITO DEL POLEO. FRESNILLO.	<u>MF OP IR FEMM-23-18</u>	FONDO MINERO
	PERIODO DE EJECUCIÓN	13/OCTUBRE/2018 al 09/FEBRERO/19
	AVANCE FINANCIERO	55%
	AVANCE DE OBRA	50%
	CONTRATISTA	<u>GRUPO CONSTRUCTORA RAMSA S.A. DE</u>





## PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SAÚL MONRELA ÁVILA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. ALEJANDRO CESAR MACIAS BRIONES

OBRA	No. DE CONTRATO	PROGRAMA
<i>Construcción de 6 Sectorizaciones mediante puntos de alimentación, (Sector 1.- Del Valle, Sector 2.-Parque Industrial, Sector 3.-Solidaridad, Sector 4.- Estación San José, Sector 5.- Laguna Seca, Sector 6.-San Felipe.) y dos puntos de presión en Sector 1 Del Valle y Colonia Lomas del Mineral, para el mejoramiento de la eficiencia física de la red de agua potable mediante aumento de capacidad de bombeo, en el Municipio de Fresnillo,</i>	MF OP CP FEMM-23-18	FONDO MINERO
	PERIODO DE EJECUCIÓN	29/DICIEMBRE/2018 al 27/ABRIL/2019
	AVANCE FINANCIERO	47.12 %
	AVANCE DE OBRA	45%
	CONTRATISTA	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERÍA PARA





## PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS


PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. SAÚL MONRELA ÁVILA

ARQ. ALEJANDRO CESAR MACIAS BRIONES

OBRA	No. DE CONTRATO	PROGRAMA
CONSTRUCCIÓN DE 923.70 M2 DE PAVIMENTO, 250.00 ML DE GUARNICIONES Y 340.50 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 129.00 ML DE TUBO P.V.C. SANITARIO LISO Y 129.00 ML DE TUBO CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO EN LA CALLE SEGUNDA DE DURANGUITO, COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	<u>MF OP IR FEMM-29-18</u>	FONDO MINERO
	PERIODO DE EJECUCIÓN	23/OCTUBRE/2018 al 19/FEBRERO/19
	AVANCE FINANCIERO	70%
	AVANCE DE OBRA	100%
	CONTRATISTA	<u>FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO, S.A. DE V.C</u>

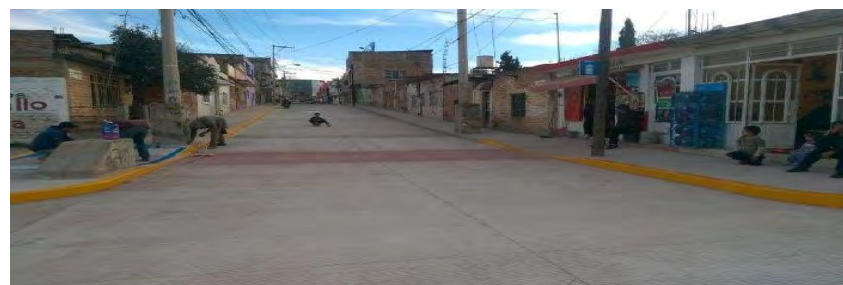

**INFORME DE ENTRADAS A FINANZAS Y TESORERÍA POR PERMISOS VARIOS  
EXPEDIDOS EN EL DEPTO. DE DES. URBANO, ADSCRITO A LA DIR. DE OBRAS  
PÚBLICAS EN EL MES DE ENERO - MARZO DEL 2019.**

PERMISOS VARIOS	PERMISOS EXPEDIDOS	TOTAL \$
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	94	397,985.00
PERMISOS VARIOS	424	180,437.00
CONTRATOS DE DRENAJE	22	13,549.00
CONSTANCIAS DE TERMINACIÓN DE OBRA	97	30,115.00
COMPATIBILIDAD URB. Y USO DE SUELO	123	37,322.00
CONSTANCIA DE ADJUDICACIÓN Y VACANCIA	4	1,508.00
CONSTANCIAS VARIAS	14	3,934.00
AUTORIZACIÓN DE ANUNCIOS VARIOS	52	59,199.00
AUTORIZACIÓN DE SUBDIVISIONES	46	24,883.00
AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS Y RELOTIFICACIONES.	0	-
ALINEAMIENTO Y NO. OFICIALES	270	85,071.00



RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO	1	6,991.00
TOTAL DE PERMISOS:	<b>1147</b>	
	TOTAL DE ENTRADAS:	<b>840,994.00</b>

## BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA 2/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
2/01/2019	PANTEÓN RESURRECCIÓN	EXCAVACIÓN DE FOSAS	MODULO DE TERRACERIAS	225	
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON EL APOYO A PANTEONES CON LA EXCAVACIÓN DE 6 FOSAS EN EL PANTEÓN RESURRECCIÓN				





## BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA 3/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
3/01/2019	COM. DE HIDALGO CALLE SIN NOMBRE	CONSTRUCCION DE DRENAJE	MODULO DE TERRACERIAS	204, 228 Y 231	30
<b>NOTA:</b>	EN ESPERA A QUE LA CUADRILLA DE DRENAJEROS COMIENCEN A INSTALAR LA RED GENERAL DE DRENAJE, YA QUE EN TODO EL DÍA NO SE PRESENTARON . POR DICHA RAZÓN SE ABUNDA UN POCO DE MATERIAL, SE CHECA LA OBRA DE GUARNICIONES Y SE LE EXIGE AL ENCARGADO QUE ENTIERRE LA GUARNICIÓN SE LE AYUDA CON LA EXCAVACIÓN				





## BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA 3/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
3/01/2019	PANTEÓN RESURRECCIÓN	EXCAVACIÓN DE FOSAS	MODULO DE TERRACERIAS	225 Y 239	
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON EL APOYO A PANTEONES CON LA EXCAVACIÓN DE 3 FOSAS EN EL PANTEÓN RESURRECCIÓN EN EL AREA DE NIÑO, AL IGUAL QUE POR INSTRUCCIONES DE LA DIRECTORA SE APOYO A HUMECTAR Y VOLTEAR LA MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO DEL TALLER				





## BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA 4/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
4/01/2019	COM. DE HIDALGO CALLE SIN NOMBRE	CONSTRUCCION DE DRENAJE	DRENAJEROS	204, 228 Y 231	20
<b>NOTA:</b>	SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE LINEA GENERAL DE DRENAJE SE COLOCAN 6 TRAMOS DE TUBO. MAL INSTALADOS YA QUE NO SE COLOCO NINGUNA CAMA Y SE SENTARON EN PEQUEÑOS BANCOS DE MATERIAL GRUESO SE LES HIZO EL COMENTARIO PERO DE MANERA REITERADA HACE CASO OMISO DE LAS INDICACIONES				





## BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA 4/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
4/01/2019	PANTEÓN RESURRECCIÓN	EXCAVACIÓN DE FOSAS	MODULO DE TERRACERIAS	225	
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON EL APOYO A PANTEONES CON LA EXCAVACIÓN DE 4 FOSAS EN EL PANTEÓN RESURRECCIÓN Y 3 MAS EN EL AREA DE LOS ANGELITOS				





# BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA 4/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
4/01/2019	COM. DE HIDALGO CALLE SIN NOMBRE	DESPALME DE NUEVO BANCO DE MATERIAL	MODULO DE TERRACERIAS	204, 228 Y 231	20
<b>NOTA:</b>	SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE DESPALME DE BANCO DE MATERIAL ESTO POR LA RAZÓN DE QUE LOS EJIDATARIOS NO QUISIERON REGALAR MAS MATERIAL PARA LA CALLE LA RAZÓN ES QUE EL TRAMO DONDE SE ESTA TRABAJANDO YA NO ES DE OJUELOS SI NO DE LA COLONIA				





## BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA 5/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
5/01/2019	COM. DE HIDALGO CALLE SIN NOMBRE	CONSTRUCCION DE DRENAJE	MODULO DE TERRACERIAS	204, 228 Y 231	70
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE LA INSTALACIÓN DE 190 METRO LINEAL PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOS AYUDA UNA EMPRESA CON UNA CUADRILLA DE MAISTROS PARA HACER DICHOS TRABAJOS				





## BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA 5/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
5/01/2019	COM. DE HIDALGO CALLE SIN NOMBRE	DESPALME DE NUEVO BANCO DE MATERIAL	MODULO DE TERRACERIAS	204, 228 Y 231	30
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE DESPALME DE BANCO DE MATERIAL ESTO POR LA RAZÓN DE QUE LOS EJIDATARIOS NO QUISIERON REGALAR MAS MATERIAL PARA LA CALLE				





## BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA 7/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
7/01/2019	COM. DE HIDALGO CALLE SIN NOMBRE	CONSTRUCCION DE DRENAJE	MODULO DE TERRACERIAS	204, 228 Y 231	85
<b>NOTA:</b>	SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE EN 190 LINEALES. POR INSTRUCCIONES DEL PRESIDENTE SE AMPLIARÁ 2 TRAMOS MAS DE TUBERÍA DE PVC DE 12 PULGADAS ESTO POR LA PETICIÓN DE VARIOS COLONOS PARA DEJAR UN TIRO DE DESCARGA PARA EN UN FUTURO METER LA RED GENERAL DE DRENAJE DE LA DEPORTIVA				





## BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA 7/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
7/01/2019	COM. DE HIDALGO CALLE SIN NOMBRE	EXTRACCIÓN DE MATERIAL	MODULO DE TERRACERIAS	204, 244, 228 Y 231	10
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL SE ABUNDA UN APROXIMADO DE 70 M3. DE MATERIAL				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 9/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
9/01/2019	PANTEÓN SANTA TERESA	LIMPIEZA DE ÁREA	MODULO DE TERRACERIAS	225 Y 236	100
<b>NOTA:</b>	SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE CARGA Y TRASLADO DE 28 M3 DE ESCOMBROS DEL PANTEÓN SANTA TERESA A EL RELLENO SANITARIO				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 9/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
9/01/2019	COM. DE HIDALGO CALLE SIN NOMBRE	APERTURA DE CAJÓN	MODULO DE TERRACERIAS	204, 209, 228 Y 231	
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CORTE, LEVANTAMIENTO Y TRASLADO DE 196 M3 DE TIERRA				






## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 9/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
9/01/2019	COM. DE PLATEROS CALLE GENARO CODINA	PINTA DE 3 TOPES	BACHEO ASFALTICO	251	100
<b>NOTA:</b>	SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE PINTA DE 3 TOPES CON COLOR AMARILLO TRÁFICO EN CALLE GENARO CODINA				

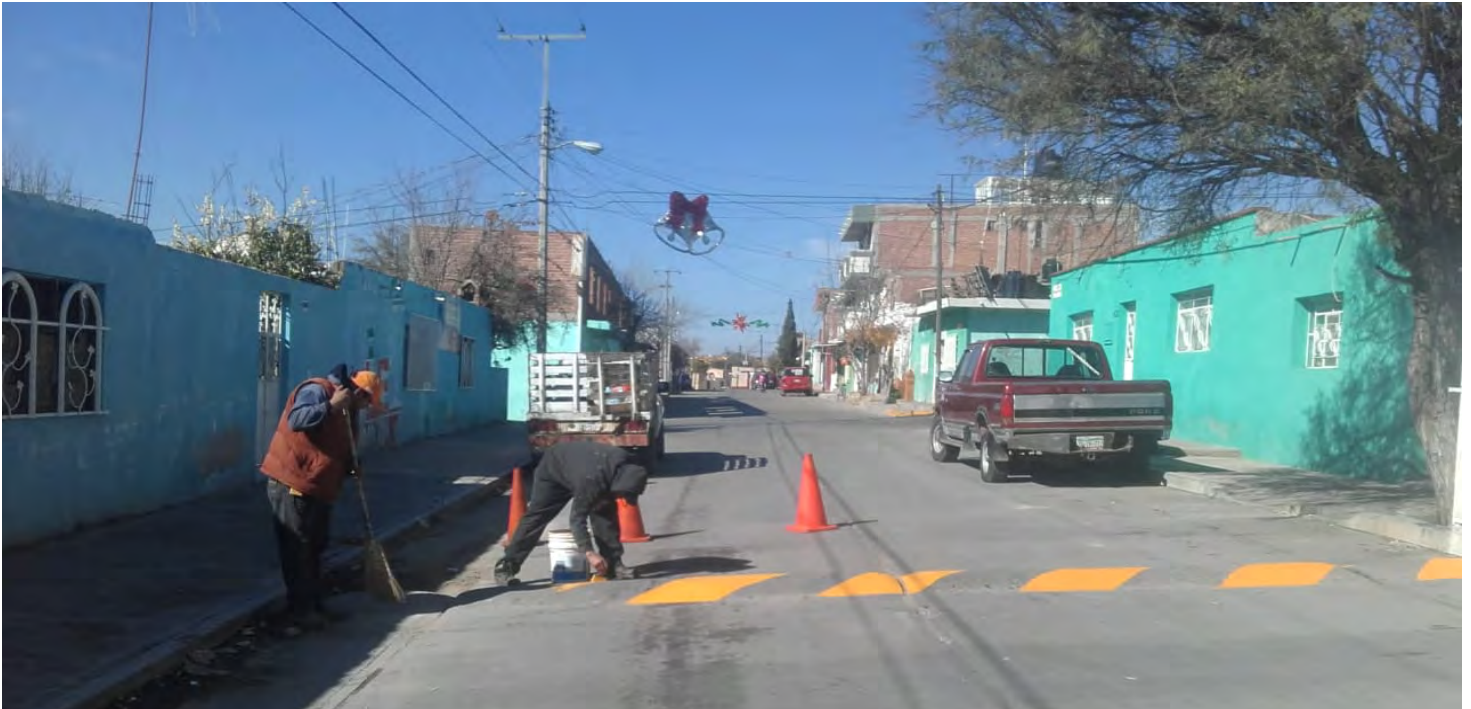



## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 10/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
10/01/2019	CALLE MARAVILLAS	REPOSICIÓN DE DRENAJE	MODULO DE TERRACERIAS	225	20
<b>NOTA:</b>	SE INICIA CON EL CORTE DE PAVIMENTO Y LA DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, PARA LA REPOSICIÓN DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE QUE ESTÁ COLAPSADO				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 10/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
10/01/2019	COM. DE HIDALGO CALLE SIN NOMBRE	APERTURA DE CAJÓN	MODULO DE TERRACERIAS	204, 209, 228 Y 231	
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CORTE, LEVANTAMIENTO Y TRASLADO DE 140 M3 DE TIERRA AL TIRADERO DE LA COMUNIDAD DE IGUAL FORMA SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE AFINACION HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 10/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
10/01/2019	CALLE WALDRA FRACC. VILLAS DE PLATEROS	DESAZOLVE DE DRENAJES	DRENAJEROS	264 Y 235	100
<b>NOTA:</b>	SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE LA LINEA GENERAL ESTO POR LA RAZÓN DE QUE ALGUNAS CASA SE INUNDARON DE AGUAS NEGRAS				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 10/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
10/01/2019	CALLE MARAVILLAS	REPOSICIÓN DE DRENAJE	MODULO DE TERRACERIAS	225	20
<b>NOTA:</b>	SE INICIA CON EL CORTE DE PAVIMENTO Y LA DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, PARA LA REPOSICIÓN DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE QUE ESTÁ COLAPSADO				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 10/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
10/01/2019	COM. DE HIDALGO CALLE SIN NOMBRE	APERTURA DE CAJÓN	MODULO DE TERRACERIAS	204, 209, 228 Y 231	
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CORTE, LEVANTAMIENTO Y TRASLADO DE 140 M3 DE TIERRA AL TIRADERO DE LA COMUNIDAD DE IGUAL FORMA SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE AFINACION HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 10/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
10/01/2019	CALLE WALDRA FRACC. VILLAS DE PLATEROS	DESAZOLVE DE DRENAJES	DRENAJEROS	264 Y 235	100
<b>NOTA:</b>	SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE LA LINEA GENERAL ESTO POR LA RAZÓN DE QUE ALGUNAS CASA SE INUNDARON DE AGUAS NEGRAS				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 8/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
8/01/2019	COM. DE HIDALGO CALLE SIN NOMBRE	CONSTRUCCION DE DRENAJE	MODULO DE TERRACERIAS	204, 228 Y 231	100
<b>NOTA:</b>	SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE EN 202 METROS LINEALES.				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 8/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
8/01/2019	COM. DE HIDALGO CALLE SIN NOMBRE	APERTURA DE CAJÓN	MODULO DE TERRACERIAS	204, 244, 228 Y 231	
<b>NOTA:</b>	SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE TIERRA VEGETAL ESTO PARA LA APERTURA DE CAJÓN EN UNA ÁREA DE 2970 M2. PARA RECIBIR LA BASE				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 11/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
11/01/2019	COM. DE HIDALGO CALLE SIN NOMBRE	EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN	MODULO DE TERRACERIAS	204, 209, 228 Y 231	
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES Y EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO DE VISITA Y LA PREPARACIÓN DE GUARNICIONES				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 11/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
11/01/2019	COM. DE HIDALGO CALLE SIN NOMBRE	APERTURA DE CAJÓN Y AFINE DE TRAMO	MODULO DE TERRACERIAS	204, 209, 239, 265 228, Y 231	
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CORTE, LEVANTAMIENTO Y TRASLADO DE 210 M3 DE TIERRA. DE IGUAL FORMA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE AFINACION HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 12/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
12/01/2019	PANTEÓN RESURRECCIÓN	EXCAVACION DE FOSAS	MODULO DE TERRACERIAS	225 Y 236	
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON EL APOYO AL ÁREA DE PANTEONES CON LA EXCAVACIÓN DE 3 FOSAS EN EL PANTEÓN RESURRECCIÓN AL IGUAL QUE EL RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 12/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
12/01/2019	COM. DE HIDALGO CALLE SIN NOMBRE	CORTE DE ASFALTO Y AFINE DE TRAMO	MODULO DE TERRACERIAS	204, 209, 239, 265 228, Y 231	
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CORTE ASFALTICO , LEVANTAMIENTO Y TRASLADO DE 112 M3 DE TIERRA. DE IGUAL FORMA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE AFINACION HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 14/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
14/01/2019	RANCHO GRANDE CALLE ALCATRAZ	PREPARACIÓN DE ÁREA	MODULO DE TERRACERIAS	227	50
<b>NOTA:</b>	SE INICIA CON LOS TRABAJOS PREVIOS PARA REENCARPETAR LA CALLE ALCATRAZ DE LA COM. DE RANCHO GRANDE				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 14/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
14/01/2019	COM. DE HIDALGO CALLE SIN NOMBRE	APERTURA DE CAJÓN Y AFINE DE TRAMO	MODULO DE TERRACERIAS	204, 209, 239, 265 228, Y 231	
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE APERTURA DE CAJÓN , LEVANTAMIENTO Y TRASLADO DE 210 M3 DE TIERRA. DE IGUAL FORMA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE AFINACION HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 14/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
14/01/2019	COM. DE HIDALGO CALLE SIN NOMBRE	NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA	MODULO DE TERRACERIAS	204, 209, 239, 265 228, Y 231	100
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE AFINACIÓN DE CALLE, POR TAL RAZÓN SE NIVELO LOS POZOS DE VISITA DE LA CALLE				






## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 14/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
14/01/2019	CALLE JOSE MARTI Y AV. REVOLUCIÓN	BACHEO PROFUNDO	BACHEO ASFALTICO	225, 226 Y 236	40
<b>NOTA:</b>	SE INICIO CON EL ARRANQUE DEL PROGRAMA DE BACHEO EN LA CALLE JOSE MARTI EN DICHA CALLE SE INICIO CON EL CORTE DE BACHE POR FALLA EN LA CORTADORA SE TRASLADO EL EQUIPO A LA AV. REVOLUCIÓN YA QUE EN DICHA AV. SE TENIA TRAMOS YA CORTADOS DONDE SE HIZO APERTURA DE CAJÓN Y REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BASE. POR LAS LLUVIAS ATÍPICAS NO SE LOGRO COLOCAR LA MEZCLA ASFÁLTICA POR DICHA RAZÓN SE CANCELA				

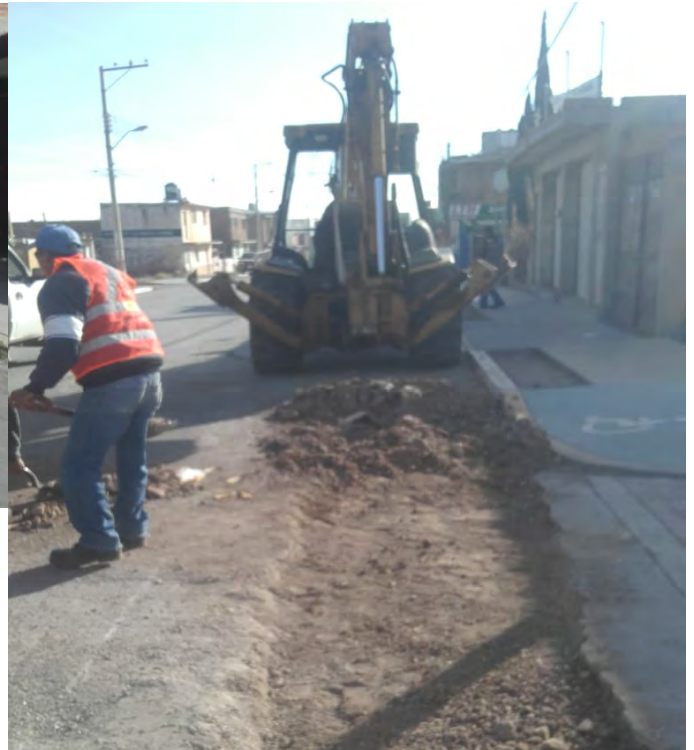



## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 15/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
15/01/2019	COM. DE RANCHO GRANDE	REENCARPETAMIENTO	MODULO DE TERRACERIAS Y SINPRA	227	
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE REENCARPETAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE SE TERMINO DE APLICAR 60 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE DE ¾ A FINOS. EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y SE INICIA CON LA APLICACIÓN DE 30 M3 DE ASFALTO CALIENTE EN LA CALLE ALCATRAZ				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 15/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
15/01/2019	COM. DE HIDALGO CALLE SIN NOMBRE	APERTURA DE CAJÓN Y AFINE DE TRAMO	MODULO DE TERRACERIAS	204, 209, 239, 265 228, Y 231	
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN LINEAL DE 200 METROS PARA LA COLOCACIÓN DE GUARNICIONES Y POR LAS LLUVIAS ATÍPICAS NO SE CONTINUA CON EL AFINE DE CALLE NI RETIRO DE MATERIAL POR DICHA RAZÓN SE RASTREA Y AFINA CAMINO DE ACCESO AL BANCO DE MATERIALES				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 15/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
15/01/2019	COL. EL VERGEL Y CALLE PALOMAR	APOYO A DESARROLLO URBANO	BACHEO HIDRÁULICO	258	100
<b>NOTA:</b>	SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE UNA BARDA, SE RECOGE Y TRASLADA ESCOMBROS. DE IGUAL FORMA SE APOYA CON EL LEVANTAMIENTO DE ESCOMBROS Y BASURA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 15/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
15/01/2019	CALLE JOSE MARTI Y AV. REVOLUCIÓN	BACHEO PROFUNDO	BACHEO ASFALTICO	225, 226 Y 236	70
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON EL PROGRAMA DE BACHEO EN LA CALLE JOSE MARTI Y AV. REVOLUCIÓN EN DICHAS CALLES SE INICIO CON EL CORTE DE BACHE, RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO, SUMINISTRO DE 68 M3 DE BASE, COMPACTACIÓN Y HUMECTACIÓN AL IGUAL SE APLICA 14 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN 272 m2				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 18/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
18/01/2019	CALLE MARAVILLAS	REPOSICIÓN DE DRENAJE	SERVICIOS GENERALES Y MODULO DE TERRACERIAS	236, 246 Y 138	50
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE DRENAJE EN CALLE MARAVILLAS, SE SUMINISTRAN 21 M3 DE MATERIAL DE BASE PARA TAPAR LA TUBERÍA COLOCADA SE CONTINUA CON LA COLOCACIÓN DE TUBERÍA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 18/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
18/01/2019	COM. DE HIDALGO CALLE SIN NOMBRE	EXTRACCIÓN DE MATERIAL	MODULO DE TERRACERIAS	204, 239, 265 Y 228	20
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE DEL BANCO DE MATERIALES A LA CALLE. DE IGUAL FORMA SE ABUNDA MATERIAL YA QUE PARTE DEL BANCO SE INUNDA POR LAS LLUVIAS ATÍPICAS				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 18/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
18/01/2019	AV. REVOLUCIÓN	BACHEO PROFUNDO	BACHEO ASFALTICO	236 Y 251	80
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJADOS PREVIOS PARA EL BACHEO, SE CUADRAN BACHES, CORTAN Y PREPARA LA SUPERFICIE CON MATERIAL DE BASE PARA DICHO TRABAJO SE SUMINISTRAN 7 M3 DE BASE NO SE ABRIÓ MAS ÁREA POR LAS LLUVIAS ATÍPICAS				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 18/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
18/01/2019	CALLE PALMA	DESAZOLVE DE CANAL	MÓDULO DE TERRACERIAS	209, 231, 225	20
<b>NOTA:</b>	SE INICIA CON LOS TRABAJOS PREVIOS PARA EL DESAZOLVE DEL CANAL DE LA CALLE PALMA SE RETIRO Y TRASLADO 140 M3 DE TIERRA Y BASURA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 18/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
18/01/2019	DEPORTIVA BENITO JUÁREZ	LIMPIEZA DE ÁREA	MÓDULO DE TERRACERIAS	138 Y 236	100
<b>NOTA:</b>	SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ÁREAS DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SE LEVANTA Y TRASLADAN 56 M3. DE BASURA Y ESCOMBROS				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 18/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
18/01/2019	CALLE PÁNFILO NATERA ESQUINA CON ZANJA	REPARACIÓN Y NIVEL DE ASIENTO	BACHEO HIDRÁULICO	258	100
<b>NOTA:</b>	SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA SE REPARA ASIENTO Y NIVELA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 19/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
19/01/2019	CALLE MARAVILLAS	REPOSICIÓN DE DRENAJE	SERVICIOS GENERALES Y MODULO DE TERRACERIAS	236, 246 Y 225	60
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE DRENAJE EN CALLE MARAVILLAS, SE SUMINISTRAN Y COLOCAN 24 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE PVC				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 3/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
3/02/2019	RANCHO GRANDE CALLE ALCATRAZ Y FRANCISCO I. MADERO	REENCARPETAMIENTO Y PINTURA	BACHEO ASFALTICO Y MODULO DE TERRACERIAS	251	100
<b>NOTA:</b>	SE CONCLUYE CON EL REENCARPETAMIENTO DE 10,200 M2 EN LAS CALLES ALCATRAZ Y FRANCISCO I. MADERO AL IGUAL QUE EL PINTADO DE 124.8 M2 DE TOPES A DOS MANOS Y 1,820 METROS LINEALES DE GUARNICIONES EN COLORES BLANCO Y AMARILLO TRÁFICO				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 5/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
5/02/2019	CALLE TIRO BUENOS AIRES	REPOSICIÓN DE DRENAJE	MODULO DE TERRACERIAS Y SERVICIOS GENERALES	138, 236, 231, 209, 244 Y 225	100
<b>NOTA:</b>	SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE EN LA COL. MINERA, CALLE TIRO BUENOS AIRES SE INSTALÓ 4 TRAMOS DE TUBO DE PVC DE 12 PULGADAS DANDO UN TOTAL DE 120 METROS SE RETIRÓ TODO EL ESCOMBRO SE DEJA LIMPIO PARA BACHEAR EL PRÓXIMO VIERNES				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 5/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
5/02/2019	COM. DE HIDALGO CALLE SIN NOMBRE	EXTRACCIÓN DE MATERIAL Y AFINE DE CALLE	MODULO DE TERRACERIAS	208, 132, 204, 231, 265 Y 228	90
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE BASE DEL BANCO DE MATERIALES A LA CALLE. SE EXTIENDE, HUMECTA, COMPACTA Y AFINA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 5/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
5/02/2019	TALLER DEL MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE TAPAS	BACHEO HIDRÁULICO	258	100
<b>NOTA:</b>	SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 2 TAPAS PARA POZO DE VISITA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 5/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
5/02/2019	AV. LOS FRESNOS COL. OBRERA	CORTE DE PAVIMENTO	BACHEO ASFALTICO	251	100
<b>NOTA:</b>	SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE PAVIMENTO DICHA ACTIVIDAD ES PREVIA PARA LOS TRABAJOS DE BACHEO				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 5/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
5/02/2019	CALLE ENRIQUE ESTRADA Y ARTEAGA	DESAZOLVE DE LINEA GENERAL	VACALL	264	100
<b>NOTA:</b>	<i>SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA</i>				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 5/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
5/02/2019	RANCHO GRANDE CALLE FRANCISCO VILLA	REENCARPETAMIENTO	MODULO DE PAVIMENTACION	227 Y SINFRA	10
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS PREVIOS PARA REENCARPETAMIENTO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA SE HACE LIMPIEZA, BARRIDO, REGADO, bacheo Y LEVANTAMIENTO DE MATERIAL DE ARRASTRE				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 5/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
5/02/2019	AV. PLATEROS ESQUINA CON CALLE LUZ	APOYO A PROTECION CIVIL	MODULO DE TERRACERIAS	244 Y 225	100
<b>NOTA:</b>	SE APOYA A PROTECION CIVIL A DERRUMBAR LA ESQUINA DE UNA PARED DICHA PARED ESTA EN PELIGRO DE DESPLOMARSE POR DICHA RAZÓN SE DERRUMBA PARTE DAÑADA SE LEVANTA ESCOMBRO Y SE QUEDA PERSONAL DE BOMBEROS A RESGUARDAR DICHA PROPIEDAD				





# BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 5/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
5/02/2019	CALLE CRUZ ROJA ESQUINA CON ARTEAGA	REPARACIÓN DE DRENAJE	DRENAJEROS	235 y 264	90
<b>NOTA:</b>	SE HACE REPARACIÓN DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE EN CALLE ARTEAGA Y DESAZOLVE DE LA LINEA GENERAL Y POZOS DE VISITA EN EL CUAL SE ENCUENTRA UN COSTAL LLENO DE PIEDRAS Y TIERRA Y UNA TAPA DE POZO DE VISITA DICHOS OBJETOS PROVOCABAN EL TAPONAMIENTO Y DERRAMAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 6/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
6/02/2019	FELIX GALVAN	REPOSICIÓN DE DRENAJE	MODULO DE TERRACERIAS	138 Y 236	80
<b>NOTA:</b>	SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE EN LA COL.VENUSTIANO CARRANZA CALLE FELIX GALVAN, SE TAPA ZANJA CON 14 M3 DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO NO SE CONCLUYE POR FUGAS DE AGUA POTABLE SEGÚN SIAPASF REPARA MAÑANA A MEDIO DÍA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 6/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
6/02/2019	COM. DE HIDALGO CALLE SIN NOMBRE	EXTRACCIÓN DE MATERIAL Y AFINE DE CALLE	MODULO DE TERRACERIAS	208, 132, 204, 231, 265 Y 228	90
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE BASE DEL BANCO DE MATERIALES A LA CALLE. SE EXTIENDE, HUMECTA, COMPACTA Y AFINA SE PONCHA LA MOTOCONFORMADORA EN ESPERA DE SU REPARACIÓN				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 6/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
6/02/2019	AV. LOS FRESNOS Y DEL SOL	CORTE DE PAVIMENTO	BACHEO ASFALTICO	251	
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE BARRIDO Y CORTE DE PAVIMENTO DICHA ACTIVIDAD ES PREVIA PARA LOS TRABAJOS DE BACHEO				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 6/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
6/02/2019	CALLES SULFATO, EMILIANO ZAPATA, HEROICO COLEGIO MILITAR Y EL ÁGORA	DESAZOLVE DE LINEA GENERAL	VACALL	264	100
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA EN LAS CALLES SULFATO, EMILIANO ZAPATA, HEROICO COLEGIO MILITAR Y EL ÁGORA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 6/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
6/02/2019	RANCHO GRANDE CALLE FRANCISCO VILLA	REENCARPETAMIENTO	MODULO DE PAVIMENTACION	227 Y SINFRA	30
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS PREVIOS PARA REENCARPETAMIENTO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA SE HACE LIMPIEZA, BARRIDO, REGADO, BACHEO Y LEVANTAMIENTO DE MATERIAL DE ARRASTRE AL IGUAL QUE SE APLICA EMULSIÓN				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 6/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
6/02/2019	AV. PLATEROS ESQUINA CON CALLE LUZ	APOYO A PROTECION CIVIL	BACHEO HIDRÁULICO	244 Y 225	100
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON EL APOYO A PROTECION CIVIL CON EL LEVANTAMIENTO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE UNA PROPIEDAD				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 7/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
7/02/2019	HEROICO COLEGIO MILITAR	REPOSICIÓN DE DRENAJE	MODULO DE TERRACERIAS Y DRENAJEROS	225, 236 Y 244	30
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE EN LA COL. CENTRO CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR SE SIGUE EXCAVANDO PARA ENCONTRAR LA PUNTA DEL DRENAJE GENERAL				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 7/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
7/02/2019	COM. DE HIDALGO CALLE SIN NOMBRE	EXTRACCIÓN DE MATERIAL Y AFINE DE CALLE	MODULO DE TERRACERIAS	208, 132, 204, 231, 265 Y 228	100
<b>NOTA:</b>	SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE PARA LA CALLE SE QUEDA AFINADA LA CALLE LISTA PARA RECIBIR CARPETAS ASFALTICO				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 7/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
7/02/2019	AV. REVOLUCIÓN	BACHEO ASFALTICO	BACHEO ASFALTICO	251 Y 236	
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE DE ¾ A FINOS EN AV. REVOLUCIÓN SE APLICA EN 80 M2 DE DICHA CALLE				






## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 7/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
7/02/2019	COMUNIDAD DE ALTAMIRA	DESAZOLVE DE LINEA GENERAL	VACALL	264	100
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA EN LA COMUNIDAD DE ALTAMIRA				

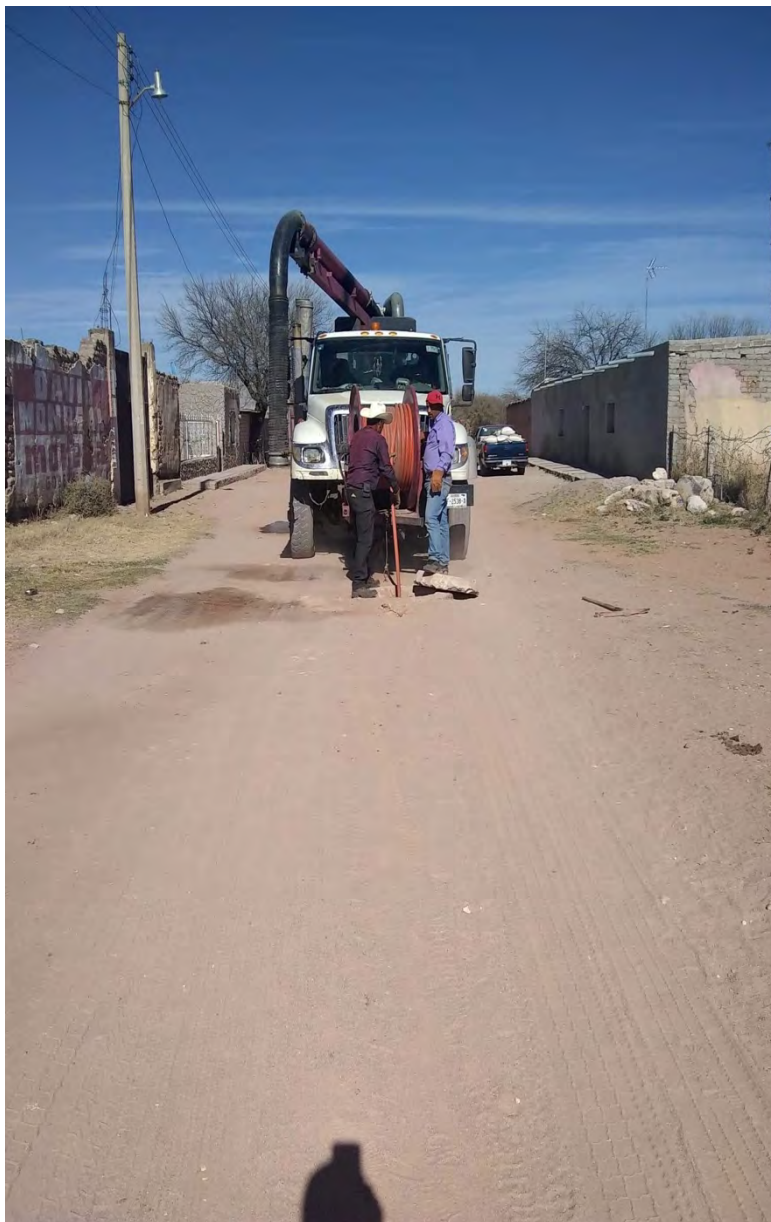



## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 7/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
7/02/2019	RANCHO GRANDE CALLE VENUSTIANO CARRANZA	REENCARPETAMIENTO	MODULO DE PAVIMENTACION	227 Y SINFRA	70
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE REENCARPETAMIENTO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE HACE LIMPIEZA, BARRIDO, REGADO, BACHEO Y SE REENCARPETA CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE DE ¾ A FINOS UN AREA DE 2,400 M2. DE LA CALLE SE APLICA CON UN GRUESO DE 5 CM				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 9/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
9/02/2019	HEROICO COLEGIO MILITAR	REPOSICIÓN DE DRENAJE	MODULO DE TERRACERIAS Y DRENAJEROS	225, 209 Y 244	90
<b>NOTA:</b>	SE Concluye CON LOS TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE EN LA COL. CENTRO CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, EN ESPERA DE QUE EL SIAPASF NOS AYUDE CON LAS FUGAS DE AGUA POTABLE				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 9/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
9/02/2019	RANCHO GRANDE CALLE VENUSTIANO CARRANZA	PINTURA EN GUARNICIONES	PINTORES	210	65
<b>NOTA:</b>	SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE PINTURA EN 588 ML. DE GUARNICIONES EN COLOR BLANCO Y AMARILLO TRÁFICO				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 11/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
11/02/2019	HEROICO COLEGIO MILITAR	REPOSICIÓN DE DRENAJE	MODULO DE TERRACERIAS Y DRENAJEROS	225, 209, 231 Y 244	100
<b>NOTA:</b>	SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE EN LA COL. CENTRO CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR SE SUMINISTRA 35 M3 DE MATERIAL DE BASE PARA TAPAR LA ZANJA SIGUEN LAS FUGAS DE AGUA POTABLE				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 11/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
11/02/2019	COM. DE HIDALGO	REFORZAR BORDO Y RASTREO DEL MISMO	MODULO DE TERRACERIAS	132, 204, 265 Y 228	80
<b>NOTA:</b>	SE Continua CON LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE PARA REFORZAR EL BORDO DEL CANAL POR LA RAZÓN DE QUE FUE COMPROMISO POR EL MATERIAL DE BASE PARA LA CALLE				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 11/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
11/02/2019	LATERAL PASEO DEL MINERAL Y BAJO PUENTE DE SORIANA	BACHEO ASFALTICO	BACHEO ASFALTICO	251 Y 236	
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA FRÍA SE APLICA EN 94 M2 EN AV. PLATEROS Y LATERAL PASEO DEL MINERAL				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 11/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
11/02/2019	COM. DE LOS ÁNGEL. JARDÍN DE NIÑO	DESAZOLVE DE FOSA	VACALL	264	
<b>NOTA:</b>	SE VISITA EL JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LOS ÁNGELES PARA EL DESAZOLVE DE LA FOSA LA CUAL NO SE LOGRA ACCESO A DICHA FOSA POR LA RAZÓN DE QUE SE CONSTRUYE OTRA FOSA LA CUAL DIFICULTA EL ACCESO				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 11/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
11/02/2019	PANTEÓN RESURRECCIÓN	EXCAVACIÓN DE FOSAS	MODULO DE TERRACERIAS	228	
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON EL APOYO AL ÁREA DE PANTEONES PARA REALIZAR 5 FOSAS EN EL PANTEÓN RESURRECCIÓN				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 11/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
11/02/2019	CALLE CECYT Y 5 DE MAYO	REPARACIÓN DE POZO DE VISITA	BACHEO HIDRÁULICO	258	100
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE ASIENTO Y CAMBIO DE TAPA Y BROCAL EN LAS CALLES CECYT Y 5 DE MAYO				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 11/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
11/02/2019	COM. ALTAMIRA	REENCARPETAMIENTO	MODULO DE TERRACERIAS Y SINPRA	227	
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE REENCARPETAMIENTO EN LA COM.DE ALTAMIRA SE INICIA CON LA LIMPIEZA DE LA AREA A REENCARPETAR				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 12/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
12/02/2019	DEP. BENITO JUÁREZ	LIMPIEZA DE ÁREA	MODULO DE TERRACERIAS	228, 231, 236 Y 244	100
<b>NOTA:</b>	SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA CARGA Y TRASLADO DE 28 M3 DE BASURA Y ESCOMBROS DE LA DEPORTIVA BENITO JUÁREZ				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 12/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
12/02/2019	COM. DE HIDALGO	REFORZAR BORDO Y RASTREO DEL CAMINO SALIDA A OJUELOS	MODULO DE TERRACERIAS	132, 204, 265 Y 228	100
<b>NOTA:</b>	SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE PARA REFORZAR EL BORDO DEL CANAL POR LA RAZÓN DE QUE FUE COMPROMISO POR EL MATERIAL DE BASE PARA LA CALLE AL IGUAL DEL RASTREO DEL CAMINO A OJUELOS				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 12/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
12/02/2019	SAN FELIPE	CORTES DE PAVIMENTO	BACHEO ASFALTICO	251 Y 236	
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE RAYADO, CUADRADO Y CORTE DEL PAVIMENTO EN LA COL SAN FELIPE				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 12/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
12/02/2019	COM. MORFIN CHAVES, ENCINOS Y MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	DESAZOLVE DE FOSA Y LINEA DE DRENAJE	VACALL	264	
<b>NOTA:</b>	SE VISITA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE MORFIN CHAVES PARA EL DESAZOLVE DE LA FOSA SÉPTICA AL IGUAL SE ATENDIÓ LA CALLE ENCINOS Y MARGARITA MAZA DE JUAREZ				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 12/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
12/02/2019	PANTEÓN SANTA TERESA	LIMPIEZA DE AREA	MODULO DE TERRACERIAS	228, 231, 236 Y 244	100
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON EL APOYO AL ÁREA DE PANTEONES PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE BASURA Y ESCOMBROS SE LEVANTA Y TRASLADAN 28 M3				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 12/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
12/02/2019	CALLE ZANJA, ARTEAGA, 5 DE MAYO, SULFATO	REPARACIÓN DE POZO DE VISITA Y LEVANTAR ESCOMBROS	BACHEO HIDRÁULICO	258	100
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE ASIENTO Y CAMBIO DE TAPA Y BROCAL EN LA CALLE ZANJA AL IGUAL SE LIMPIA Y RECOGE ESCOMBROS EN ARTEGA, 5 DEMAYO Y SULFATO				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 12/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
12/02/2019	COM. ALTAMIRA	REENCARPETAMIENTO	MODULO DE TERRACERIAS Y SINFRA	227	
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE REENCARPETAMIENTO EN LA COM.DE ALTAMIRA SE CONTINUA CON LA LIMPIEZA DE LA AREA A REENCARPETAR Y RETIRO DE ESCOMBROS EN LOS HOMBROS DE LA CARRETERA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 13/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
13/02/2019	SEP	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO	MODULO DE TERRACERIAS	228, 231, 236 Y 244	40
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS PREVIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTACIONAMIENTO. SE LIMPIA, Y SE HACE EXTRACCIÓN DE MATERIAL Y RAÍCES, CARGA, TRASLADO DE 28 M3				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 13/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
13/02/2019	CALLE INDUSTRIA PESQUERA	BACHEO ASFALTICO CALIENTE	MODULO DE TERRACERIAS Y BACHEO	132, 204, 265 244, 231 Y 228	100
<b>NOTA:</b>	SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE Y 10 M3 DE CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE EN CALLE INDUSTRIA PESQUERA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 13/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
13/02/2019	INDUSTRIA PESQUERA Y AV. SONORA	BACHEO ASFALTICO CALIENTE	BACHEO ASFALTICO	251 Y 236	100
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE DE ¾ A FINOS EN CALLE INDUSTRIA PESQUERA Y AV. SONORA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 13/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
13/02/2019	CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	REPOSICIÓN DE DRENAJE	MODULO DE TERRACERIAS Y DRENAJEROS	225, 244 Y 235	
<b>NOTA:</b>	SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE EN CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 13/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
13/02/2019	TALLER DEL MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE 3 TAPAS	BACHEO HIDRÁULICO		100
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE 3 TAPAS DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LOS POZO DE VISITA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 13/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
13/02/2019	CALLE DE LOS GRANADOS Y CALLE YUNQUE	DESAZOLVE DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE	DRENAJEROS	235	
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE POZO DE VISITA Y DES TAPONAMIENTOS DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE EN LAS CALLE GRANADOS ESTÁN 6 METROS LINEALES DE TUBO COLAPSADO Y EN CALLE YUNQUE EL TUBO ES DE 6 PULGADAS DE DIÁMETRO ES INSUFICIENTE SE NECESITA HACER CAMBIO POR UN DIÁMETRO MAS GRANDE				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 13/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
13/02/2019	CALLE RÍO SAN JUAN	LEVANTAMIENTO DE ESCOMBROS	MODULO DE TERRACERIAS	228, 244, 236 Y 231	100
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CALLE RIO SAN JUAN SE LEVANTA Y TRASLADA DE 28 M3 DE ESCOMBROS				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 13/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
13/02/2019	COM. ALTAMIRA	REENCARPETAMIENTO	MODULO DE TERRACERIAS Y SINFRA	227	50
<b>NOTA:</b>	SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE REENCARPETAMIENTO EN LA COM.DE ALTAMIRA SE SUMINISTRA MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE DE ¾ A FINOS EN UNA ÁREA DE 3,600 M2 CON UN ESPESOR DE 5 CM. SUELTOS				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 14/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
14/02/2019	CALLE CUAUHTÉMOC	BACHEO ASFALTICO CALIENTE	BACHEO ASFALTICO	251 Y 236	100
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE DE ¾ A FINOS EN CALLE CUAUHTÉMOC SE APLICA EN UNA ÁREA DE 100 M2.				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 14/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
14/02/2019	CALLE ZARAGOZA/ ESTRELLA Y LUNA/ SAUCES Y LIMAS / RIO AGUANAVAL Y YUNQUE	DESTAPONAR LINEA GENERAL	DRENAJEROS	225, 244 Y 235	
<b>NOTA:</b>	SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE DESTAPONAR LA LINEA GENERAL DE DRENAJES /EL CORTE DE 100 ML. DE LA CALLE AGUANAVAL / EXCAVACIÓN EN CALLE SAUCES Y LIMAS				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 14/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
14/02/2019	CALLE 2 DE ABRIL	REPARACIÓN DE BROCAL	BACHEO HIDRÁULICO	258	100
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LA RECONSTRUCCIÓN DE ASIENTO Y CAMBIO DE TAPA EN UN POZO DE VISITA UBICADO EN CALLE 2 DE ABRIL				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 14/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
14/02/2019	COM. DE ATENAS A PAJARITOS	RASTREO Y AFINE DE CAMINO	MODULO DE TERRACERIAS	230	100
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE RASTREO Y AFINE DEL CAMINO DE ATENAS A PAJARITOS				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 14/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
14/02/2019	COM. ALTAMIRA	REENCARPETAMIENTO	MODULO DE TERRACERIAS Y SINFRA	227	50
<b>NOTA:</b>	SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE REENCARPETAMIENTO EN LA COM.DE ALTAMIRA SE SUMINISTRA MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE DE ¾ A FINOS EN UNA ÁREA DE 3,864 M2 CON UN ESPESOR DE 5 CM. DANDO UN TOTAL DE 1.104 KM. LINEALES DE CARRETERA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 14/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
14/02/2019	SEP	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO	MODULO DE TERRACERIAS	204	50
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS PREVIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTACIONAMIENTO. SE ESCARIFICAR, RASTREA Y NIVELA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 19/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
19/02/2019	AV. DEL CHARRO, CUARTO CENTENARIO Y CALLE CUAUHTÉMOC	TRABAJOS PREVIOS PARA BACHEO	BACHEO ASFALTICO	251 Y 230	
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS PREVIOS AL BACHEO. RETIRAR MATERIAL DE ARRASTRE, BARRER, RALLAR, CUADRAR, RETIRAR EL AREA DAÑADA Y APERTURA DE CAJÓN EN AV. DEL CHARRO, CUARTO CENTENARIO Y CALLE CUAUHTÉMOC				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 19/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
19/02/2019	CALLE AGUANAVAL COL LOMAS DE PLATEROS	REPOSICIÓN DE LINEA GENERAL DE DRENAJE	DRENAJEROS	225,236, 244, 231 Y 235	80
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE 51 METROS LINEALES DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJES SE TAPA LA ZANJA QUEDA INCOMPLETA DE TAPAR POR LA RAZÓN QUE DE SE DAÑA LINEA GENERAL DE AGUA POTABLE				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 19/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
19/02/2019	CALLE JUAN PABLO II	RASTREO Y AFINE DE CALLE	MODULO DE TERRACERIAS	240	100
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE RASTREO Y AFINE DE LA CALLE JUAN PABLO II				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 19/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
19/02/2019	COM. DE RIO FLORIDO	LIMPIEZA DEL ÁREA REENCARPETAR	MODULO DE TERRACERIAS Y SINPRA	227	40
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS PREVIOS A REENCARPETAR SE LIMPIA, CUADRA Y SE HACE BACHEO CON MEZCLA EN FRIO				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 19/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
19/02/2019	DEP SOLIDARIDAD	LIMPIEZA DE AREA	MODULO DE TERRACERIAS	228, 231, 209	70
<b>NOTA:</b>	SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE LEVANTA 35 M3. DE ESCOMBROS PARA HACER EL ACCESO Y SALIDA PARA LOS AUTOS QUE ASISTIRÁN AL EVENTO DE BOX				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 19/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
19/02/2019	DEP SOLIDARIDAD	LIMPIEZA DE AREA	MODULO DE TERRACERIAS	228, 231, 209	100
<b>NOTA:</b>	SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE LEVANTAR 42 M3. DE ESCOMBROS Y BASURA EL CUAL SE TRASLADA Y SE TIRA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 19/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
19/02/2019	CALLE COSTA RICA COL. PATRIA Y LIBERTAD	RECONSTRUCCIÓN DE BROCAL	BACHEO HIDRÁULICO	258	80
<b>NOTA:</b>	SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE ASIENTO BROCAL Y CAMBIO DE TAPA NUEVA DE POSO DE VISITA EN CALLE COSTA RICA				






## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 20/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
20/02/2019	AV. DEL CHARRO, CUARTO CENTENARIO Y CALLE CUAUHTÉMOC	BACHEO ASFALTICO CALIENTE	BACHEO ASFALTICO	244, 251 Y 265	
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE BACHEO. SE RETIRAR EL AREA DAÑADA Y SE APLICA 10 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE				

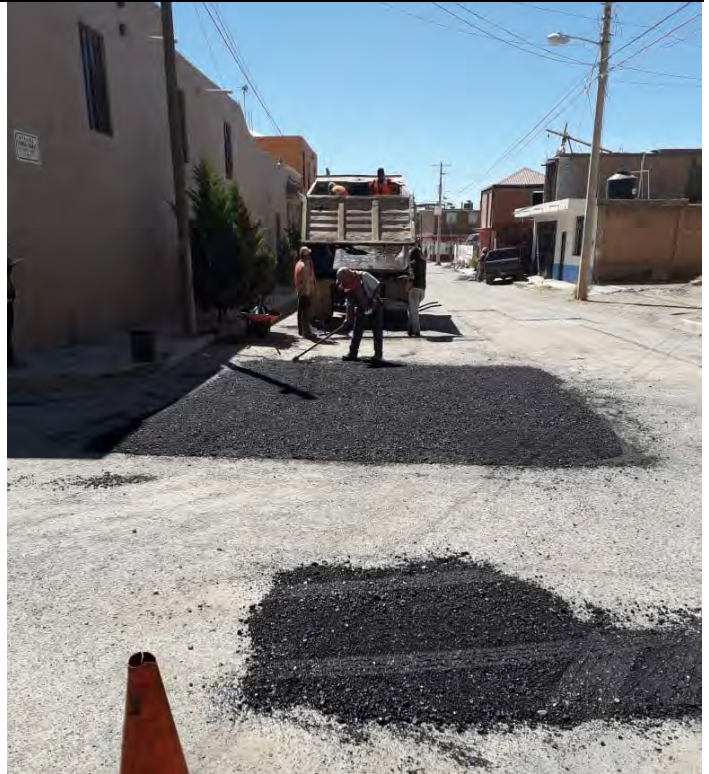



# BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 20/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
20/02/2019	COM. DE MONTEMARIANA	RASTREO Y AFINE DE CALLES	MODULO DE TERRACERIAS	230	100
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE RASTREO Y AFINE DE LA CALLES DE MONTEMARIANA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 20/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
20/02/2019	COM. DE RIO FLORIDO	LIMPIEZA DEL ÁREA REENCARPETAR	MODULO DE TERRACERIAS Y SINFRA	227	70
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS PREVIOS A REENCARPETAR SE LIMPIA, CUADRA Y SE HACE BACHEO CON MEZCLA EN FRIO EN LAS CALLES DE CUAUHTÉMOC, GÓMEZ FARIAS Y PÁNFILO NATERA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 20/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
20/02/2019	ZONA PEATONAL	RECONSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA	BACHEO HIDRÁULICO	258	30
<b>NOTA:</b>	SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE 5 M3. DE ESCOMBROS PARA HACER RECONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 20/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
20/02/2019	COM DE PIEDRAS	CARGA Y TRASLADO DE PIEDRA	MODULO DE TERRACERIAS	231	100
<b>NOTA:</b>	SE APOYA A LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON CARGA Y TRASLADO DE MATERIAL DE CANTERA DE LA COM DE PIEDRAS A LA AV DEL SOL				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 22/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
22/02/2019	AV. CUARTO CENTENARIO Y COL. SAN FELIPE	BACHEO ASFALTICO CALIENTE	BACHEO ASFALTICO	244, 251 Y 265	
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE BACHEO. SE RETIRAR EL AREA DAÑADA Y SE APLICA 12 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE AV. CUARTO CENTENARIO Y COL. SAN FELIPE				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 22/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
22/02/2019	COM. DE MONTEMARIANA	RASTREO Y AFINE DE CAMINO	MODULO DE TERRACERIAS	230	100
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE RASTREO Y AFINE DE LA COMUNIDAD DE MONTEMARIANA A PLENITUD CON UN TOTAL DE 8 KM SE LEVANTA HOMBROS, CUNETAS Y SE AFINA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 22/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
22/02/2019	COM. DE RIO FLORIDO	LIMPIEZA DEL ÁREA A REENCARPETAR	MODULO DE TERRACERIAS Y SINPRA	227	100
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS PREVIOS A REENCARPETAR SE LIMPIA, CUADRA Y SE HACE BACHEO CON MEZCLA EN FRIO EN LAS CALLES DE CUAUHTÉMOC, GÓMEZ FARIAS Y PÁNFILO NATERA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 22/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
22/02/2019	ZONA PEATONAL	RECONSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA	BACHEO HIDRÁULICO	258	35
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE LA SEGUNDA JARDINERAS ESTO POR LA RAZÓN DE REPARAR ALGUNAS ZONAS DESTRUIDAS SE RETIRA LA CANTERA PARA DARLE UNA LIMPIADA AL PISO DE LA JARDINERA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 22/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
22/02/2019	DEP. SOLIDARIDAD	MANTENIMIENTO	MODULO DE TERRACERIAS	231, 236 Y 228	50
<b>NOTA:</b>	SE APOYA A LA DEPORTIVA CON CARGA Y TRASLADO DE LA BASURA Y ESCOMBROS DE LA MISMA MANERA SE RALLAN CAMPOS PARA ESTACIONAMIENTO, SE AMPLÍA ACCESOS Y SE APOYA PINTAR				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 22/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
22/02/2019	LATERAL CARRETERA A LA ESTACION	CARGA Y TRASLADO DE ESCOMBROS	MODULO DE TERRACERIAS	231, 236 Y 225	70
<b>NOTA:</b>	SE RETIRA 91 M3 DE MATERIAL DE ESCOMBROS EN LATERAL CARRETERA A LA ESTACION				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 22/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
22/02/2019	DEP. SOLIDARIDAD	MANTENIMIENTO	BACHEO HIDRÁULICO	258	50
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA DEP. SOLIDARIDAD SE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SE RECONSTRUYE TAPA DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN				






## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 23/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
23/02/2019	COM. DE TAPITAS DE SANTA CRUZ, CALLEJÓN PÁNFILO NATERA Y GIMNASIO MUNICIPAL	DESTAPAR LINEA GENERAL	DRENAJEROS	235	100
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE POZO DE VISITA Y DES TAPONAMIENTOS DE LINEAS GENERALES Y DESCARGAS EN COM. DE TAPITAS DE SANTA CRUZ, CALLEJÓN PÁNFILO NATERA Y GIMNASIO MUNICIPAL				

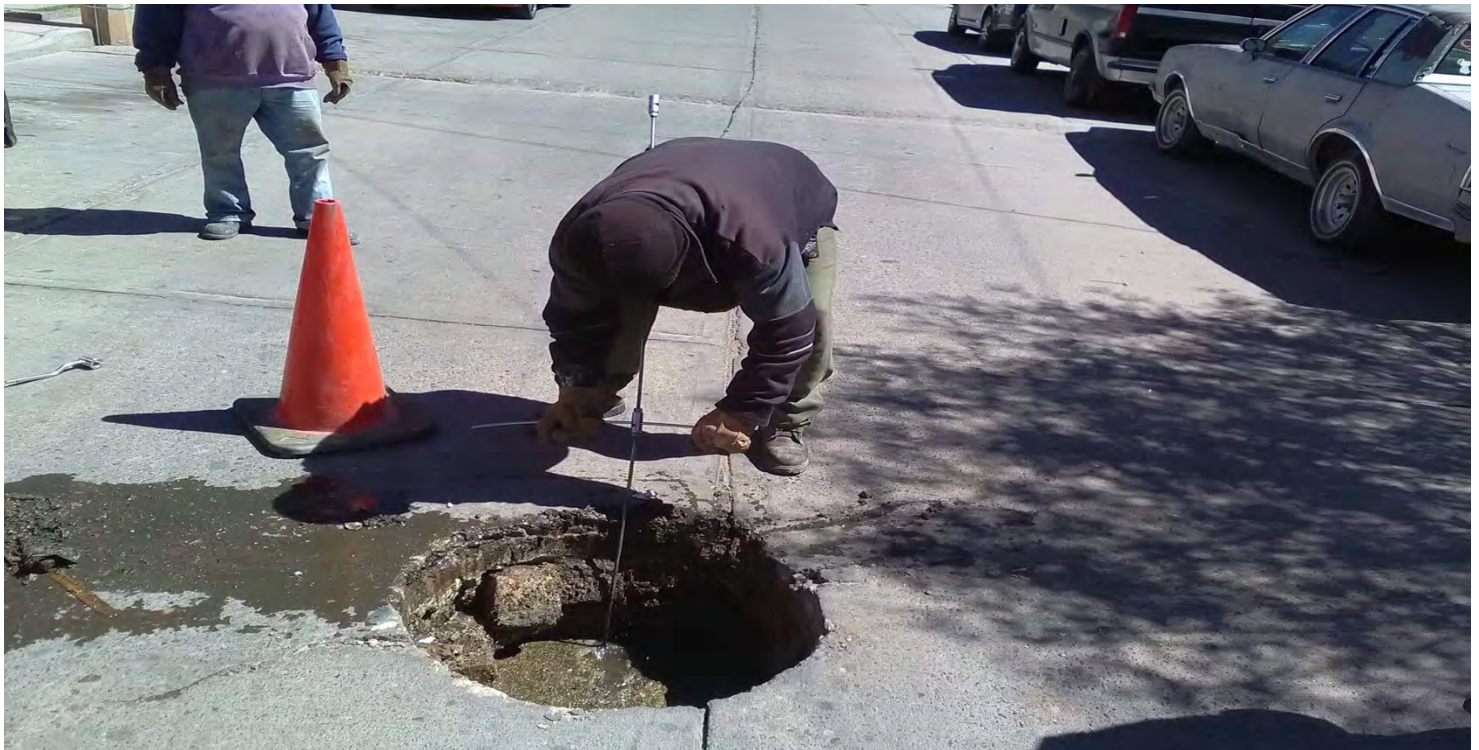



## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 23/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
23/02/2019	CALLE MANUEL ACUÑA	APOYO A SERVICIOS	MODULO DE TERRACERIAS	138 Y 244	
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CARGA Y TRASLADO DE BASURA Y ESCOMBROS SE APOYA AL DIRECCIÓN DE SERVICIO. EN CALLE MANUEL ACUÑA NO SE APOYA YA QUE ES TERRENO PARTICULAR Y LA BARDA ESTA POR COLAPSAR SE OCUPA DICTAMEN DE PROTECCIÓN CIVIL				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 25/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
25/02/2019	EL ÁGORA, CALZADA PROAÑO Y LATERAL AV. PLATEROS	BACHEO ASFALTICO EN FRÍO	BACHEO ASFALTICO	244, 251 Y 265	50
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE BACHEO. SE RETIRAR EL AREA DAÑADA Y SE APLICA 3 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA FRÍA Y EL LIMPIADO Y CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO DAÑADO				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 25/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
25/02/2019	COM. DEL BAJÍO DE SAN GABRIEL	RASTREO Y AFINE DE CAMINO	MODULO DE TERRACERIAS	230	50
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE RASTREO Y AFINE DE 2. 2 KM DE LA CARRETERA DE SAN JOSE DE LOURDES A EL BAJÍO DE SAN GABRIEL Y DEL BAJIO A LA COM. DE SAN GABRIEL DE UN TOTAL DE 4 KM SE LEVANTA HOMBROS, CUNETAS Y SE AFINA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 25/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
25/02/2019	COM. DE LAS ZARQUILLAS	RASTREO Y AFINE DE CAMINO	MODULO DE TERRACERIAS	230	50
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE RASTREO Y AFINE DE 3 KM LA CARRETERA A JEREZ A LA COM DE LAS ZARQUILLAS DE UN TOTAL DE 5 KM SE LEVANTA HOMBROS, CUNETAS Y SE AFINA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 25/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
25/02/2019	ZONA PEATONAL	RECONSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA	BACHEO HIDRÁULICO	258	36
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE LA 3ER. JARDINERA ESTO POR LA RAZÓN DE REPARAR ALGUNAS ZONAS DESTRUIDAS				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 25/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
25/02/2019	COM. DEL MEZQUITE	RECONSTRUCCIÓN DE LA LINEA	DRENAJEROS	235	10
<b>NOTA:</b>	SE INICIA CON LA VERIFICACIÓN DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE EN LA COM DEL MEZQUITE, EL DICTAMEN ARROJA POR 3 CALAS REALIZADAS DE QUE 87 METROS LINEALES ESTÁN COLAPSADO TUBERÍA DE 12 PULGADAS LA CUAL SE TIENE QUE REMPLAZAR				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 25/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
25/02/2019	LATERAL CARRETERA A LA ESTACION	CARGA Y TRASLADO DE ESCOMBROS	MODULO DE TERRACERIAS	231, 236 Y 225	80
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE 70 M3 DE MATERIAL DE ESCOMBROS EN LATERAL CARRETERA A LA ESTACION				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 25/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
25/02/2019	DEP. SOLIDARIDAD	MANTENIMIENTO	BACHEO HIDRÁULICO	258	60
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA DEP. SOLIDARIDAD SE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SE RECONSTRUYE ALGUNAS ÁREAS				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 25/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
25/02/2019	RASTRO TIF	MANTENIMIENTO	MÓDULO DE TERRACERIAS	228	60
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SE REALIZA ZANJA PARA DESAZOLVE Y LIMPIA ÁREA CON RASTREO Y NIVEL				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 25/02/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
25/02/2019	JUAN DE TOLOSA , REFORMA Y ROSAS MORENO	APOYO A POLICÍA VIAL	BACHEO ASFALTICO	251	20
<b>NOTA:</b>	SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE PINTURA DE LOS CRUCES PEATONALES EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD SE APLICA UN TOTAL DE 110.4 M2. EN 9 CRUCES PEATONALES				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 28/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
28/01/2019	CALLE MARAVILLAS	REPOSICIÓN DE DRENAJE	MODULO DE TERRACERIAS	236, 246 Y 225	70
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE DRENAJE EN CALLE MARAVILLAS, SE SUMINISTRA 14 M3 DE MATERIAL DE BASE				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 28/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
28/01/2019	COM. DE HIDALGO CALLE SIN NOMBRE	EXTRACCIÓN DE MATERIAL Y AFINE DE CALLE	MODULO DE TERRACERIAS	204, 239, 265, 244 Y 228	50
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE DEL BANCO DE MATERIALES A LA CALLE. DE IGUAL FORMA SE EXTIENDE, HUMECTA COMPACTA Y AFINA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 28/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
28/01/2019	BULEVAR ENRIQUE ESTRADA	BACHEO	BACHEO ASFALTICO	236 Y 251	
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJADOS DE BACHEO, SE UTILIZA 5 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO EN BULEVAR ENRIQUE ESTRADA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 28/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
28/01/2019	CALLE TIRO BUENOS AIRES	REPOSICIÓN DE DRENAJE	MODULO DE TERRACERIAS	225	20
<b>NOTA:</b>	SE INICIA CON EL CORTE DE 120 METROS LINEALES Y LA FRACTURA DEL CONCRETO HIDRÁULICO ESTO CON EL FIN DE REPLAZAR LOS TRAMOS DE TUVO COLAPSADOS				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 28/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
28/01/2019	CALLE REFORMA	BACHEO HIDRÁULICO	MODULO DE TERRACERIAS Y BACHEO ASFALTICO	236, 244, 231, 225, 245, 251 Y 258	100
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON EL PROGRAMA DE BACHEO SE INICIA CON LOS TRABAJOS NOCTURNOS PREVIOS PARA EL BACHEO, SE CUADRAN BACHES, CORTAN Y PREPARA LA SUPERFICIE CON MATERIAL DE BASE PARA DICHO TRABAJO SE SUMINISTRAN 5 M3 DE CEMENTO FRAGUAMAX SE APLICA EN 54 M2 DE LA CALLE REFORMA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 29/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
29/01/2019	CALLE MARAVILLAS	REPOSICIÓN DE DRENAJE	MODULO DE TERRACERIAS	236, 246 Y 225	90
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE DRENAJE EN CALLE MARAVILLAS, SE SUMINISTRA 21 M3 DE MATERIAL DE BASE SE TAPA ZANJA Y COMPACTA CON DICHO MATERIAL				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 29/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
29/01/2019	COM. DE HIDALGO CALLE SIN NOMBRE	EXTRACCIÓN DE MATERIAL Y AFINE DE CALLE	MODULO DE TERRACERIAS	204, 239, 265, 244 Y 228	60
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE DEL BANCO DE MATERIALES A LA CALLE. SE EXTIENDE, HUMECTA, COMPACTA Y AFINA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 29/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
29/01/2019	BULEVAR DR. VARELA RICO	BACHEO	BACHEO ASFALTICO	236 Y 251	
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJADOS DE BACHEO, SE UTILIZA 7 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO EN BULEVAR DR. VARELA RICO. ESTOS TRABAJOS SON MIENTRAS SE SUMINISTRA O REGULARIZA LA MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 29/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
29/01/2019	PARQUE DE BÉISBOL YAQUI BENITEZ	LIMPIEZA DE ÁREA	MODULO DE TERRACERIAS	244, 231, 236 Y 227	100
<b>NOTA:</b>	SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA, LEVANTAMIENTO DE 21 M3 DE BASURA Y TRASLADO DE LA MISMA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 29/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
29/01/2019	CALLE MOMAX	LIMPIEZA DE CALLE	MODULO DE TERRACERIAS	227	100
<b>NOTA:</b>	SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE RASTREO, LIMPIEZA Y DESYERBE DE LA CELLE MOMAX				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 29/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
29/01/2019	MONUMENTO A LA BANDERA	LIMPIEZA DE AREA	MODULO DE TERRACERIAS	227, 244, 208, 236 Y 231	100
<b>NOTA:</b>	SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO Y TRASLADO DE 84 M3 DE ARENA DEL MONUMENTO DE LA BANDERA A EL TALLER DEL MUNICIPIO. DICHA ARENA FUNCIONO COMO CAMA DE ARENA PARA LA PISTA DE HIELO				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 30/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
30/01/2019	CALLE MARAVILLAS	REPOSICIÓN DE DRENAJE	MODULO DE TERRACERIAS	236, 246 Y 138	100
<b>NOTA:</b>	SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE, SE SUMINISTRA 14 M3 DE BASE Y SE LEVANTA Y TRASLADO 42 M3. DE ESCOMBROS				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 30/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
30/01/2019	COM. DE HIDALGO CALLE SIN NOMBRE	EXTRACCIÓN DE MATERIAL Y AFINE DE CALLE	MODULO DE TERRACERIAS	208, 132, 204, 231, 265 Y 228	70
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE DEL BANCO DE MATERIALES A LA CALLE. SE EXTIENDE, HUMECTA, COMPACTA Y AFINA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 30/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
30/01/2019	CALLE DE LOS FRESNOS	TRABAJOS PREVIOS PARA BACHEO	BACHEO ASFALTICO	251	
<b>NOTA:</b>	SE HACEN TRABAJOS PREVIOS PARA EL BACHEO EN CALLE LOS FRESNOS SE MARCA, CUADRA Y CORTA EL PAVIMENTO ESTO POR LA RAZÓN DEL CAMION 236 SUFRIÓ DAÑOS POR LO TANTO SE DIFICULTA EL TRASLADO DEL RODILLO Y DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 30/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
30/01/2019	COM. DE PLAN DE VALLECITOS	LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS	DRENAJEROS	264	55
<b>NOTA:</b>	SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE 9 FOSAS SÉPTICAS EN LA COMUNIDAD DE PLAN DE VALLECITOS. SE CONCLUYE CON 5 FOSAS DE LA COMUNIDAD				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 30/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
30/01/2019	CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ	DESTAPAR LINEA GENERAL DE DRENAJE	VACALL	264	100
<b>NOTA:</b>	SE DESTAPÓ LA LINEA GENERAL DE DRENAJE SE LIMPIA LA LINEA GENERAL DE DRENAJE Y SE HACE DESAZOLVE DE POZOS DE VISITA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 30/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
30/01/2019	MONUMENTO A LA BANDERA	LIMPIEZA DE AREA	BACHEO HIDRÁULICO	258	100
<b>NOTA:</b>	SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL ARENA DEL MONUMENTO DE LA BANDERA SE HACE BARRIDO Y SE LEVANTO COSTALES CON ARENA Y BASURA QUEDANDO LA SUPERFICIE LIMPIA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 31/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
31/01/2019	CALLE TIRO BUENOS AIRES	REPOSICIÓN DE DRENAJE	MODULO DE TERRACERIAS Y SERVICIOS GENERALES	244 y 225	40
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE EN LA COL. MINERA, CALLE TIRO BUENOS AIRES				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 31/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
31/01/2019	COM. DE HIDALGO CALLE SIN NOMBRE	EXTRACCIÓN DE MATERIAL Y AFINE DE CALLE	MODULO DE TERRACERIAS	208, 132, 204, 231, 265 Y 228	80
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE DEL BANCO DE MATERIALES A LA CALLE. SE EXTIENDE, HUMECTA, COMPACTA Y AFINA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 31/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
31/01/2019	CALLE DE LOS FRESNOS Y FRISCO	TRABAJOS PREVIOS PARA BACHEO	BACHEO ASFALTICO	251	
<b>NOTA:</b>	SE HACEN TRABAJOS PREVIOS PARA EL BACHEO EN CALLE LOS FRESNOS SE MARCA, CUADRA Y CORTA EL PAVIMENTO. EN CALLE FRISCO SE HACE BACHEO PROFUNDO SE RETIRA MATERIAL CONTAMINADO SE SUMINISTRA BASE, SE COMPACTA, HUMECTA Y SE APLICA MEZCLA ASFÁLTICA FRÍA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 31/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
31/01/2019	COM. DE PLAN DE VALLECITOS	LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS	DRENAJEROS	264	100
<b>NOTA:</b>	SE Concluye CON LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE 9 FOSAS SÉPTICAS EN LA COMUNIDAD DE PLAN DE VALLECITOS.				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 31/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
31/01/2019	TALLER DEL MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE BROCAL	BACHEO ASFALTICO		100
<b>NOTA:</b>	SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 2 TAPAS Y 2 BROCALES PARA POZOS DE VISITA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 31/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
31/01/2019	PANTEÓN RESURRECCIÓN	EXCAVACIÓN DE FOSAS	MODULO DE TERRACERIAS	245 y 227	100
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN DE FOSAS EN EL PANTEÓN RESURRECCIÓN DE IGUAL FORMA SE RETIRA LA TIERRA PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 31/01/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
31/01/2019	CANCHA DE BÁSQUETBOL COL MINERA	MANTENIMIENTO DE CANCHA	BACHEO ASFALTICO	251	50
<b>NOTA:</b>	SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COL MINERA SE PINTA RAYAS Y PARTE DE LA CANCHA EN COLOR ROJO ÓXIDO				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 16/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
16/03/2019	DEP. BENITO JUÁREZ	APOYO AL EVENTO DE BÉISBOL	MODULO DE TERRACERIAS	228	50
<b>NOTA:</b>	SE EXTIENDE MATERIAL DE BASE EN EL DIAMANTE DE BÉISBOL SE RASTREA Y RETIRA MATERIAL GRUESO				






## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 18/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
18/03/2019	LIENZO CHARRO	APOYO AL EVENTO NACIONAL CHARRO	MODULO DE TERRACERIAS	228, 204 Y 132	100
<b>NOTA:</b>	SE AFINA LIENZO CHARRO, SE RIEGA Y SE SUMINISTRA DE AGUA LOS DEPÓSITOS Y LLENAN CABALLERÍAS EXTERNAS AL IGUAL QUE AL INTERIOR				

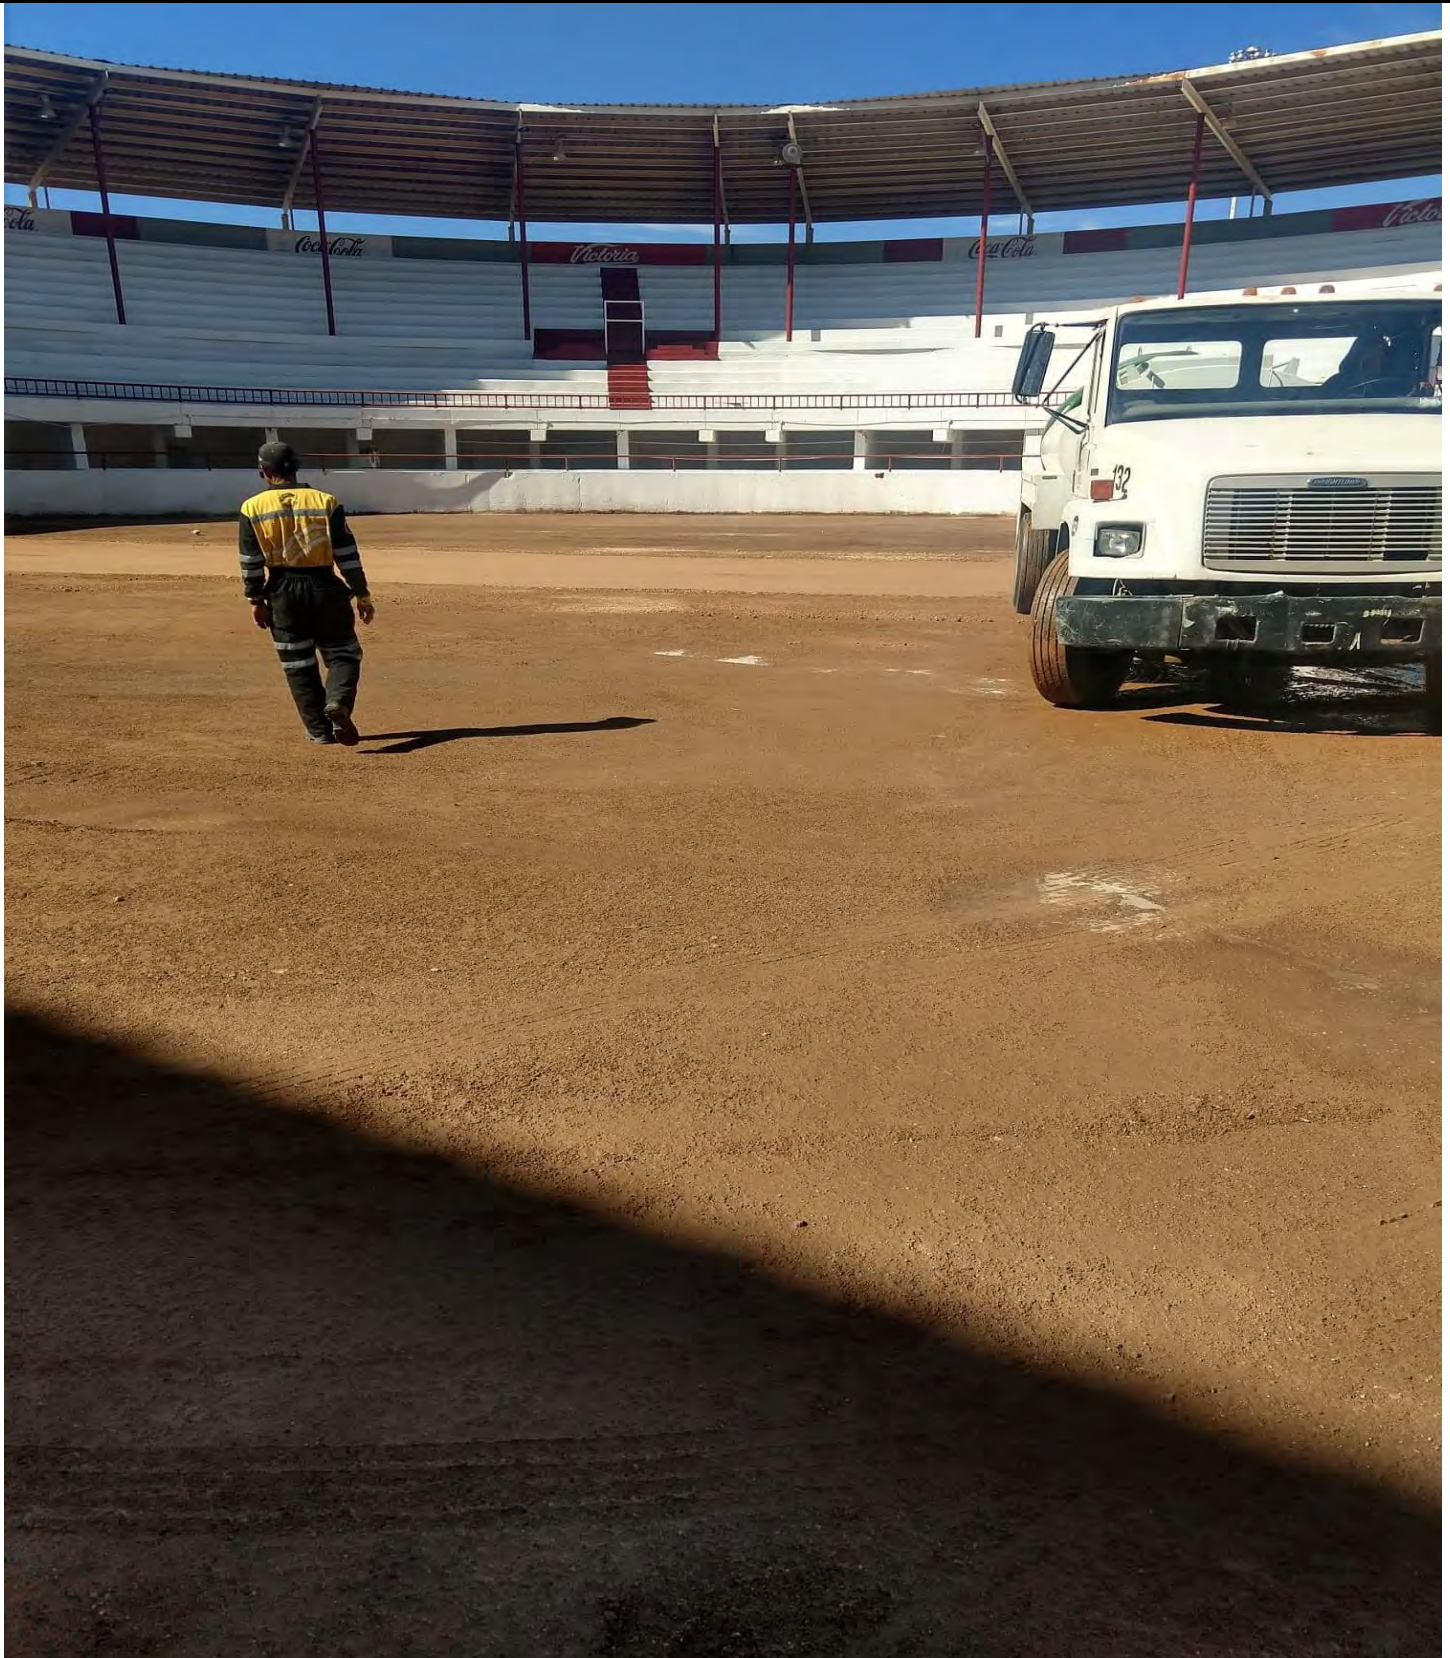



## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 19/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
19/03/2019	CALLE EMILIANO ZAPATA	RETIRO DE ESCOMBROS	BACHEO HIDRÁULICO	258	100
<b>NOTA:</b>	SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO DEL BACHEO EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE IGUAL FORMA SE CONCLUYE CON LA CONSTRUCCIÓN DE 2 TAPAS EN EL TALLER DEL MUNICIPIO				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 19/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
19/03/2019	ESTADIO DE BÉISBOL	MANTENIMIENTO DE ESTADIO DE BÉISBOL	MODULO DE TERRACERIAS	204, 228, 236, 265, 138 Y 209	50
<b>NOTA:</b>	SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL ESTADIO DE BÉISBOL SE SUMINISTRA 90 M3 DE ARCILLA CALCINADA – GRANULADA LA CUAL SE EXTIENDE EN TODO EL DIAMANTE SE NIVELA, HUMECTA Y COMPACTA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 19/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
19/03/2019	COM. DE LA LUZ	RASTREO Y AFINE DE CAMINO	MODULO DE TERRACERIAS	204, 232	100
<b>NOTA:</b>	SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE CUNETAS, LEVANTAMIENTO DE HOMBRO, RASTREO, AFINE Y COMPACTACION DE LA LUZ A LA COM DE LAS ZARQUILLAS				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 19/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
19/03/2019	CALLE AQUILES SERDÁN COL. CENTRO	REPLAZO DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE	DRENAJEROS Y MODULO DE TERRACERIAS	225, 244 Y 235	80
<b>NOTA:</b>	POR FALTA DE REPARAR FUGAS DE AGUA POTABLE EN ESPERA PARA RELLENAR ZANJA Y DEJAR TRÁNSITO LIBRE				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 19/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
19/03/2019	CALLE JEREZ Y MANUEL M. POSE	BACHEO MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE	BACHEO ASFALTICO	210, 225, 239, 265 Y 244	70
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE DE $\frac{3}{4}$ A FINOS EN CALLE JEREZ Y MANUEL M. POSE SE APLICA UN TOTAL DE 9 M3. DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 19/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
19/03/2019	CALLE ROSAS MORENO	APOYO A POLICÍA VIAL	BACHEO ASFALTICO Y MODULO DE TERRACERIAS	261	100
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON EL APOYO A POLICÍA VIAL CON EL TRAZADO Y RALLADO DE LOS CRUCES PEATONALES, SE PINTAN 56 M2 DE PINTURA BLANCA TRÁFICO				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 20/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
20/03/2019	TALLER DEL MUNICIPIO	CONSTRUCCIÓN DE BROCAL Y TAPAS	BACHEO HIDRÁULICO	258	100
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN BROCAL Y 2 TAPAS PARA POZOS DE VISITA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 20/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
20/03/2019	ESTADIO DE BÉISBOL	MANTENIMIENTO DE ESTADIO DE BÉISBOL	MODULO DE TERRACERIAS	204, 228, 236, 265, 138 Y 209	90
<b>NOTA:</b>	SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL ESTADIO DE BÉISBOL SE SUMINISTRA UN TOTAL DE 120 M3 DE ARCILLA CALCINADA – GRANULADA LA CUAL SE EXTIENDE EN TODO EL DIAMANTE SE NIVELA, HUMECTA, COMPACTA Y AFINA FALTO MATERIAL PARA LAS BANDAS 14 M3 DE ARCILLA PARA CONCLUIR CON DICHO MANTENIMIENTO				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 20/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
20/03/2019	CALLE AQUILES SERDÁN COL. CENTRO	REPLAZO DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE	DRENAJEROS Y MODULO DE TERRACERIAS	225, 244 Y 235	80
<b>NOTA:</b>	EN ESPERA DE REPARAR FUGAS DE AGUA POTABLE EN ESPERA PARA RELLENAR ZANJA Y DEJAR TRÁNSITO LIBRE				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 20/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
20/03/2019	CALLE CALZADA PLATEROS	RALLADO Y CORTE DE CAJON	BACHEO ASFALTICO	210, 225, 239, 265 Y 244	
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE RALLADO, CORTE DE CAJÓN, RETIRO DE PAVIMENTO DAÑADO Y APERTURA DE CAJÓN ESTO CON EL FIN DE RECIBIR LA MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 20/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
20/03/2019	CALLE MORELOS Y AGUILES SERDÁN	APOYO A POLICÍA VIAL	BACHEO ASFALTICO Y MODULO DE TERRACERIAS	261	100
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON EL APOYO A POLICÍA VIAL CON EL TRAZADO Y RALLADO DE LOS CRUCES PEATONALES, SE PINTAN 46 M2 DE PINTURA BLANCA TRÁFICO				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 21/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
21/03/2019	CALLE 3 DE MAYO Y CALLE MANZANOS	BACHEO DE ZANJA	BACHEO HIDRÁULICO	258	100
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA FRÍA SE RELLENA ZANJA ECHA POR AGUA POTABLE EN CALLE 3 DE MAYO Y EN CALLE MANZANOS SE BACHEA CON MEZCLA HIDRÁULICA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 21/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
21/03/2019	ESTADIO DE BÉISBOL	MANTENIMIENTO DE ESTADIO DE BÉISBOL	MODULO DE TERRACERIAS	204, 228, 236, 265, 138 Y 209	100
<b>NOTA:</b>	SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL ESTADIO DE BÉISBOL SE SUMINISTRA UN TOTAL DE 120 M3 DE ARCILLA CALCINADA – GRANULADA LA CUAL SE EXTIENDE EN TODO EL DIAMANTE SE NIVELA, HUMECTA, COMPACTA Y AFINA SE SUMINISTRA 14 M3 DE ARCILLA PARA LOS CORREDORES				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 21/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
21/03/2019	CALLE AQUILES SERDÁN COL. CENTRO	REEMPLAZO DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE	DRENAJEROS Y MODULO DE TERRACERIAS	225, 244 Y 235	80
<b>NOTA:</b>	INICIA SIAPASF CON LAS REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN CALLE AQUILES SERDÁN EN ESPERA DE QUE CONCLUYAN PARA TAPAR ZANJA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 21/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
21/03/2019	CALLE CALZADA PLATEROS	RALLADO Y CORTE DE CAJON	BACHEO ASFALTICO	210, 225, 239, 265 Y 244	100
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE RALLADO, CORTE DE CAJÓN, RETIRO DE PAVIMENTO DAÑADO Y APERTURA DE CAJÓN ESTO CON EL FIN DE RECIBIR LA MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 21/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
21/03/2019	AQUILES SERDÁN	APOYO A POLICÍA VIAL	BACHEO ASFALTICO Y MODULO DE TERRACERIAS	261	100
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON EL APOYO A POLICÍA VIAL CON EL TRAZADO Y RALLADO DE LOS CRUCES PEATONALES, SE PINTAN 78.8 M2 DE PINTURA BLANCA TRÁFICO				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 22/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
22/03/2019	CALLE VALPARAISO	BACHEO DE ZANJA	BACHEO HIDRÁULICO	258, 225 Y 138	40
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE BACHEO ASFALTICO CON CONCRETO HIDRÁULICO SE RELLENA ZANJA ECHA POR REMPLAZO DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE SE SUMINISTRA Y APLICA 2.73 M3 DE CONCRETO HIDRÁULICO				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 22/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
22/03/2019	CALLES HABANA, ALBERT EINSTEIN Y ABRAHAM LINCOLN	RASTREO Y AFINE DE CALLES	MODULO DE TERRACERIAS	204	100
<b>NOTA:</b>	SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE RASTREO Y AFINE DE LAS CALLES HABANA, ALBERT EINSTEIN Y ABRAHAM LINCOLN				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 22/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
22/03/2019	CALLE AQUILES SERDÁN COL. CENTRO	REPLAZO DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE	DRENAJEROS Y MODULO DE TERRACERIAS	225, 208, 236, 138 Y 235	90
<b>NOTA:</b>	SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE SE TAPA ZANJA CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y SE RETIRA EL ESCOMBO				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 22/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
22/03/2019	CALLE CALZADA PLATEROS	BACHEO ASFALTICO CALIENTE	BACHEO ASFALTICO	210, 239, 265 Y 244	100
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE BACHEO ASFALTICO CALIENTE DE ¾ A FINOS SE APLICAN 8 M3 DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE CALZADA PLATEROS, AV. DE LOS BALCONES Y AV. DEL SOL				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 22/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
22/03/2019	CALLE SIERRA MADRE	LIMPIEZA DE BOCA DE TORMENTA	DRENAJEROS	235	100
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LA LIMPIEZA DE BOCAS DE TORMENTA ESTO PARA EVITAR INUNDACIONES EN CALLE SIERRA MADRE				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 22/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
22/03/2019	COM DEL ATERRADERO	LIMPIEZA DE ÁREA	MODULO DE TERRACERIAS	228	20
<b>NOTA:</b>	SE INICIA CON LA LIMPIEZA DE 2 HECTÁREAS ESTO POR LA RAZÓN DE QUE EL PANTEÓN NECESITA LUGAR POR DICHA RAZÓN SE EXTENDERÁ				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 23/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
23/03/2019	LIENZO CHARRO	APOYO AL EVENTO NACIONAL CHARRO	MODULO DE TERRACERIAS	242	100
<b>NOTA:</b>	SE SUMINISTRA DE AGUA LOS DEPÓSITOS Y LLENAN CABALLERÍAS EXTERNAS AL IGUAL QUE AL INTERIOR DEL LIENZO CHARRO SE RIEGA AL TÉRMINO DE CADA COMPETENCIA DE IGUAL FORMA SE SUMINISTRARÁ EL DOMINGO				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 23/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
23/03/2019	AV. TECNOLÓGICA	DESTAPONAR DRENAJE GENERAL	DRENAJEROS	235	100
<b>NOTA:</b>	SE DESTAPONA LINEA GENERAL DE DRENAJE Y SE HACE DESAZOLVE DEL POZO DE VISITA EN LA AV. TECNOLOGÍA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 25/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
25/03/2019	CALLE VALPARAISO	BACHEO DE ZANJA	BACHEO HIDRÁULICO	258 Y 138	100
<b>NOTA:</b>	SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO SE RELLENA ZANJA ECHA POR REMPLAZO DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE SE SUMINISTRA Y APLICA UN TOTAL 4.2 M3 DE CONCRETO HIDRÁULICO				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 25/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
25/03/2019	PARQUE LAGUNILLA	LEVANTAMIENTO DE ESCOMBROS	MODULO DE TERRACERIAS	225, 244 Y 236	100
<b>NOTA:</b>	SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO Y TRASLADO DE 28 M3 DE ESCOMBRO Y BASURA DE EL PARQUE LA LAGUNILLA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 25/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
25/03/2019	PANTEÓN SANTA TERESA	LIMPIEZA DE ÁREA	MODULO DE TERRACERIAS	225, 244 Y 236	100
<b>NOTA:</b>	SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA, LEVANTAMIENTO DE 35 M3 DE BASURA Y ESCOMBROS				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 25/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
25/03/2019	CALLE EMILIANA ZAPATA COL. CENTRO	APOYO A DESARROLLO URBANO	BACHEO ASFALTICO	251	100
<b>NOTA:</b>	SE APOYA A EL AREA DE DESARROLLO URBANO, CON LA DEMOLICIÓN DE RAMPAS SE RETIRA ESCOMBROS PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE RAMPAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 25/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
25/03/2019	PANTEÓN SANTA CRUZ	LIMPIEZA DE CALLES	MODULO DE TERRACERIAS	225, 244 Y 236	100
<b>NOTA:</b>	SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA, LEVANTAMIENTO DE 35 M3 DE BASURA Y ESCOMBROS				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 25/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
25/03/2019	COM. DEL ATERRADERO	LIMPIEZA DE ÁREA	MODULO DE TERRACERIAS	228	50
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LA LIMPIEZA DE 2 HECTÁREAS ESTO POR LA RAZÓN DE QUE EL PANTEÓN NECESITA LUGAR POR DICHA RAZÓN SE EXTENDERÁ YA QUE ES INSUFICIENTE EL ESPACIO				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 25/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
25/03/2019	DEP. SOLIDARIDAD	LIMPIEZA DE ÁREA	MODULO DE TERRACERIAS	227, 208 Y 231	100
<b>NOTA:</b>	SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA, LEVANTAMIENTO DE 42 M3 DE BASURA Y ESCOMBROS				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 25/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
25/03/2019	CALLE REFORMA	PINTA DE CRUCES PEATONALES	MODULO DE TERRACERIAS Y BACHEO ASFALTICO	251	100
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON EL APOYO A POLICÍA VIAL PARA PINTAR LOS CRUCES PEATONALES SE PINTA EN CALLE REFORMA UN TOTAL DE 56.2 M2 DE PINTURA BLANCA TRÁFICO				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 26/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
26/03/2019	AV. FRANCISCO VILLA ESQUINA CON 1858	RECONSTRUCCIÓN DE ASIENTO	BACHEO HIDRÁULICO	258	100
<b>NOTA:</b>	SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE ASIENTO DE UN POZO DE VISITA Y EL REMPLAZO DE LA TAPA EN AV. FRANCISCO VILLA ESQUINA CON 1858				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 26/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
26/03/2019	PANTEÓN RESURRECCIÓN	APOYO AL RELLENO SANITARIO	MODULO DE TERRACERIAS	227, 244, 208, 231 Y 236	
<b>NOTA:</b>	SE APOYA AL RELLENO SANITARIO CON LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO Y TRASLADO DE 175 M3 DE ESCOMBRO Y MATERIALES PETROS DEL PANTEÓN AL RELLENO, ESTO POR LA RAZÓN DE EL APOYO SOLICITADO POR EL DEP. DE LIMPIA PARA EVITAR INCENDIOS POR LA TEMPORADA DE CALOR				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 26/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
26/03/2019	CALLES VALPARAÍSO, SINALOA, MANUEL ACUÑA, REFORMA, PUENTE Y JEREZ	BACHEO ASFALTICO CALIENTE	BACHEO ASFALTICO	251 Y 244	100
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON EL BACHEO DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE DE ¾ A FINOS, SE APLICA EN UN ÁREA 280 M2 EN LAS CALLES VALPARAÍSO, SINALOA, PUENTE, MANUEL ACUÑA, REFORMA Y JEREZ SE UTILIZA 14 M3 DE MATERIAL ASFALTICO				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 26/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
26/03/2019	COM. DEL ATERRADERO	LIMPIEZA DE ÁREA	MODULO DE TERRACERIAS	228	80
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LA LIMPIEZA DE 2 HECTÁREAS ESTO POR LA RAZÓN DE QUE EL PANTEÓN NECESITA LUGAR POR DICHA RAZÓN SE EXTENDERÁ YA QUE ES INSUFICIENTE EL ESPACIO				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 26/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
26/03/2019	CENTRO DE CONVENCIONES	APOYO A PRENSA	BACHEO ASFALTICO	244 Y 251	100
<b>NOTA:</b>	SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE CARGA Y TRASLADO DE 10 MAMPARAS DEL CENTRO DE CONVENCIONES A EL PATIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL APOYO SOLICITADO POR EL DEP. DE PRENSA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 26/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
26/03/2019	CALLE PARRA COL. CENTRO	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	DRENAJEROS	235	
<b>NOTA:</b>	SE ATENDIÓ REPORTE DE FUGA DE AGUAS NEGRAS EN CALLE PARRA COL. CENTRO SE TRATA DE DESTAPAR LA LINEA GENERAL DE DRENAJE Y NO SE CONCLUYE YA QUE HAY UN TRAMO DE TUBERÍA COLAPSADO, SE CAMBIARÁN 8 MTS LINEALES DE LA TUBERÍA GENERAL DE DRENAJE ESTO PARA PODER ENCAUZAR LAS AGUAS NEGRAS				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 27/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
27/03/2019	CALLE PINO SUÁREZ	BACHEO DE ZANJA	BACHEO HIDRÁULICO	258	40
<b>NOTA:</b>	SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE TAPAR ZANJA EN CALLE PINO SUÁREZ SE HACE APERTURA DE CAJÓN, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ESTO PARA LA APLICACIÓN DE 1.2 M3 DE CONCRETO HIDRÁULICO				





# BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 27/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
27/03/2019	PANTEÓN RESURRECCIÓN	APOYO AL RELLENO SANITARIO	MODULO DE TERRACERIAS	227, 244, 208, 231 Y 236	
<b>NOTA:</b>	Se Continúa con El APOYA AL RELLENO SANITARIO CON LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO Y TRASLADO DE 147 M3 DE ESCOMBRO Y MATERIALES PETROS, DEL PANTEÓN AL RELLENO, ESTO POR LA RAZÓN DE EL APOYO SOLICITADO POR EL DEP. DE LIMPIA PARA EVITAR INCENDIOS POR LA TEMPORADA DE CALOR				






## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 27/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
27/03/2019	CALLES PARRA, LAUREL, MAGNOLIAS, OLIVOS Y SECCIÓN 34	TRABAJO PRELIMINAR AL BACHEO	BACHEO ASFALTICO	251 Y 244	100
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON EL TRABAJO PRELIMINAR PARA BACHEO SE RALLA Y CORTA EL PAVIMENTO ASFÁLTICA ALREDEDOR DEL ÁREA QUE SE BACHEARÍA				

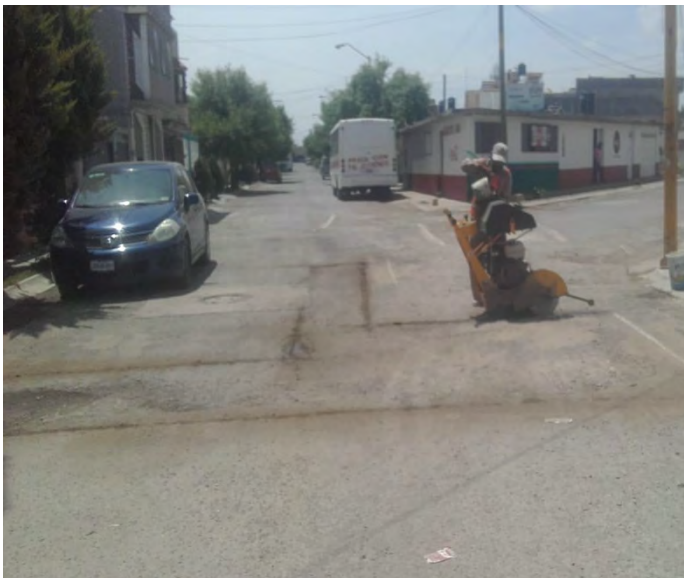



## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 27/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
27/03/2019	COM. DEL ATERRADERO	LIMPIEZA DE ÁREA	MODULO DE TERRACERIAS	228	100
<b>NOTA:</b>	SE CONCLUYE CON LA LIMPIEZA DEL PANTEÓN ESTO POR LA RAZÓN DE QUE EL PANTEÓN NECESITA LUGAR DE IGUAL FORMA SE LIMPIA EL ACCESO DE ENTRADA AL PANTEÓN				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 27/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
27/03/2019	CALLE PARRA COL. CENTRO	REPOSICIÓN DE DRENAJE	DRENAJEROS	235, 225, 208	80
<b>NOTA:</b>	SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE 9 MTS LINEALES DE LA TUBERÍA GENERAL DE DRENAJE DE 12" EN CALLE PARRA SE EXCAVÓ Y REPLAZA EL TUBO COLAPSADO POR TUVO DE PVC				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 28/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
28/03/2019	CALLE PINO SUÁREZ	BACHEO DE ZANJA	BACHEO HIDRÁULICO	258	60
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE TAPAR ZANJA EN CALLE PINO SUÁREZ SE HACE APERTURA DE CAJÓN, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ESTO PARA LA APLICACIÓN DE 1.35 M3 DE CONCRETO HIDRÁULICO				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 28/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
28/03/2019	PANTEÓN RESURRECCIÓN	APOYO AL RELLENO SANITARIO	MODULO DE TERRACERIAS	227, 208, 231 Y 236	
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON EL APOYA AL RELLENO SANITARIO CON LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO Y TRASLADO DE 105 M3 DE ESCOMBRO Y MATERIALES PETROS, DEL PANTEÓN AL RELLENO, ESTO POR LA RAZÓN DE EL APOYO SOLICITADO POR EL DEP. DE LIMPIA PARA EVITAR INCENDIOS POR LA TEMPORADA DE CALOR				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 28/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
28/03/2019	CALLE AQUILES SERDÁN	TRABAJO PRELIMINAR AL BACHEO	BACHEO ASFALTICO	225, 251 Y 244	100
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON EL TRABAJO PRELIMINAR PARA BACHEO SE HACE CAJÓN, SE LIMPIA LEVANTA Y TRASLADA MATERIAL SOBRANTE				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 28/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
28/03/2019	COM. DE PORFÍAS	REPARACIÓN DE PUENTE	MODULO DE TERRACERIAS	228, 239, 208, 236 y 243	80
<b>NOTA:</b>	SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE PASO EN CARRETERA, FALTA LA COLOCACIÓN DE CARPE ASFÁLTICA CALIENTE				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 28/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
28/03/2019	CALLE TLAXCALA	DESTAPE DE LINEA GENERAL DE DRENAJE	DRENAJEROS	235	100
<b>NOTA:</b>	SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE DESTAPE DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE Y DESAZOLVE DEL POZO DE VISITA EN CALLE TLAXCALA				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 29/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
29/03/2019	CALLE VALPARAISO	BACHEO DE ZANJA	BACHEO HIDRÁULICO	258	100
<b>NOTA:</b>	SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CALLE VALPARAÍSO SE RECOGE ESCOMBROS Y LIMPIA CALLE				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 29/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
29/03/2019	PANTEÓN RESURRECCIÓN	APOYO AL RELLENO SANITARIO	MODULO DE TERRACERIAS	227, 208, 231 Y 236	
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON EL APOYA AL RELLENO SANITARIO CON LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO Y TRASLADO DE 84 M3 DE ESCOMBRO Y MATERIALES PETROS, DEL PANTEÓN AL RELLENO, ESTO POR LA RAZÓN DE EL APOYO SOLICITADO POR EL DEP. DE LIMPIA PARA EVITAR INCENDIOS POR LA TEMPORADA DE CALOR				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 29/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
29/03/2019	CALLES MATEO GALLEGOS, VALLE, GLICINA, FUENTES, DIEGO RIVERA, AV. MAESTROS Y GORDON	TRABAJO PRELIMINAR AL BACHEO	BACHEO ASFALTICO	251	100
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON EL TRABAJO PRELIMINAR PARA BACHEO SE RALLA Y CORTA ES CONCRETO ASFALTICO ALREDEDOR DEL BACHE EN LAS CALLES MATEO GALLEGOS, VALLE, GLICINA, FUENTES, DIEGO RIVERA, AV. MAESTROS Y GORDON				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 29/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
29/03/2019	PANTEÓN RESURRECCIÓN	EXCAVACIÓN DE FOSAS	MODULO DE TERRACERIAS	228	
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON EL APOYO A EL AREA DE PANTEONES CON LA EXCAVACIÓN DE FOSAS EN EL PANTEÓN RESURRECCIÓN				





## BITACORA ACTIVIDADES

FECHA 29/03/2019

DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA	CUADRILLA	NO. DE EQUIPO	%
29/03/2019	CALLE HIDALGO Y COM DE RÍO FLORIDO	DESAZOLVE DE POZOS DE VISITA	DRENAJEROS Y VACALL	235 Y 264	100
<b>NOTA:</b>	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE DESTAPE DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE Y DESAZOLVE DEL POZO DE VISITA EN CALLE HIDALGO Y COM DE RÍO FLORIDO				





# LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

ENERO 2019									
FECHA	NOMBRE	TIPO DE CONSTRUCCION	METROS M².	D.R.O	FICHA	TIEMPO	OFICIO	FOLIO	COSTO
09-ene-19	MA. DEL CARMEN SANCHEZ MARTINEZ	CASA HABITACION	114 M²	PRORROGA	PRO	UN MES	1	617984	\$ 187,00
09-ene-19	MA. ESTHER GUARDADO MENDEZ	EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS PLANTA BAJA Y PRIMER NIVEL	285.50 M²	ARQ. MOISES ARAON ROMAN TRUJILLO ZAC32/026	17080	TRES MESES	2	617857	\$ 10836,00
09-ene-19	JOSE EDUARDO VAZQUEZ LOYA	TIENDA DE SERVICIO Y ESTACIONAMIENTO	1954 M²	PRORROGA	PRO	SIETE MESES	3	618077	\$ 1309,00
09-ene-19	JUANA GALVAN CABRAL	4 BODEGAS 250 M² C/U	1000 M²	ARQ. ABEL HERNANDEZ TOVAR ZAC32/247		TRES MESES	4	618852	\$ 48078,00
09-ene-19	HULE METAL MEXICANO S.A.P.I. DE C.V.	NAVE INDUSTRIAL	2400 M²	ARQ. HOMERO ULISES DE LA TORRE ZAC32/106		TRES MESES	5	618882	\$ 86958,00
09-ene-19	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	REMODELACION TIENDA AUTOSERVICIO OXXO		REMODELACION	REM	UN MES	6	618236	\$ 748,00
10-ene-19	GRUPO INMOBILIARIO ZACATECAS S.A. DE C.V.	204 CASAS HABITACION	44.76 M² C/U	ARQ. JOSE ANGEL FLORES GUTIERREZ ZAC32/107	17073	TRES MESES	7	618857-618858	\$ 366049,00
10-ene-19	EDUARDO GUTIERREZ STEPHANO	CASA HABITACION	229 M²	ARQ. EDUARDO GUTIERREZ STEPHANO ZAC32/189	17154	TRES MESES	8	620297	\$ 10634,00
10-ene-19	PBRO. SALVADOR SANCHEZ ESCOBEDO	RESTAURACION CASA PARROQUIAL		ING. JACOB JONAS MORENO NIETO	17151	TRES MESES	9	620068	\$ 3266,00
10-ene-19	ARMANDO LEDESMA CAMPOS	SALON DE FIESTAS	670 M²	PRORROGA	PRO	TRES MESES	10	619972	\$ 748,00
10-ene-19	GINA MARGARITA VELASCO ROSAS	VIVIENDA UNIFAMILIAR	136.69 M²	PRORROGA	PRO	UN MES	11	619975	\$ 187,00
10-ene-19	ERICA LIBERTAD MARQUEZ ADABACHE	CASA HABITACION	156.30 M²	PRORROGA	PRO	TRES MESES	12	620050	\$ 748,00
10-ene-19	GUSTAVO JAVIER RAMIREZ MENDIOLA	CASA HABITACION	78.81 M²	REGULARIZACION	REG	TRES MESES	13	600212	\$ 2282,00
11-ene-19	ALMA CISNEROS MERCADO	AMPLIACION CASA HABITACION	99 M²	PRORROGA	PRO	TRES MESES	14	620555	\$ 561,00
11-ene-19	ING JORGE PEDROZA OCHOA	CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES					15		
11-ene-19	ING JORGE PEDROZA OCHOA	DOMO ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL M PONCE					16		
11-ene-19	ING JORGE PEDROZA OCHOA	CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO DE JUSTICIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE FRESNILLO					17		
11-ene-19	ING JORGE PEDROZA OCHOA	CASETA Y BARDAS PERIMETRAL DE LA CASA DE JUSTICIA					18		
11-ene-19	ING JORGE PEDROZA OCHOA	CENTRO DE JUSTICIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE FRESNILLO					19		



11-ene-19	ING JORGE PEDROZA OCHOA	REMODELACION DE LA CASA DE JUSTICIA ANTIGUO SISTEMA PENAL					20			
11-ene-19	ING JORGE PEDROZA OCHOA	REMODELACION EDIFICIO DE LA POLICIA MINISTERIAL					21			
11-ene-19	ING JORGE PEDROZA OCHOA	DORMITORIOS DE LA POLICIA MINISTERIAL					22			
11-ene-19	RAUL EDMUNDO DIAS ROMERO			REGULARIZACION	REG	TRES MESES	23	621061	\$ 14174,00	
14-ene-19	HERIBERTO MARTINEZ DOMINGUEZ	DEPARTAMENTOS	250.94 M²	PRORROGA	PRO	TRES MESES	24	621545	\$ 561,00	
14-ene-19	IGNACIO FLORES COLON	RESTAURANTE	190.39 M²	ARQ. JEIMAR REVELES ACOSTA ZAC32/196	16670	TRES MESES	25	621167	\$ 8935,00	
15-ene-19	ELVIA ALICIA AGUAYO SIMENTAL	CASA HABITACION	233 M²	PRORROGA	PRO	TRES MESES	26	621775	\$ 561,00	
16-ene-19	MA. ALICIA RAMIREZ ARMENTA	CASA HABITACION	100 M²	REGULARIZACION	REG	TRES MESES	27	619103	\$ 8316,00	
16-ene-19	ADOLFO LOPEZ MONTES	CASA HABITACION	90 M²	PRORROGA	PRO	TRES MESES	28	617972	\$ 561,00	
16-ene-19	CARLOS IVAN ZAVALA BASURTO	SALON DE EVENTOS	644.9 M²	ING. SANDRA GARCIA TOVAR ZAC32/332	17095	TRES MESES	29	619035	\$ 36450,00	
16-ene-19	ROSA MARIA SOTO REYES	CASA HABITACION	155 M²	ARQ. JUAN LUIS GRACIA URIBE ZAC32/105	17158	TRES MESES	30	621234	\$ 5768,00	
16-ene-19	JUNIOR ALAIN LUNA FRAUSTO	CASA HABITACION	250 M²	ARQ. JUAN LUIS GRACIA URIBE ZAC32/105	17153	TRES MESES	31	621233	\$ 6936,00	
16-ene-19	MARIA GUADALUPE SANCHEZ VIDALES	CASA HABITACION	154.50 M²	PRORROGA	PRO	UN MES	32	621948	\$ 187,00	
16-ene-19	JOSE EDUARDO VALDEZ PEREZ	CASA HABITACION	140 M²	REGULARIZACION	REG	TRES MESES	33	622001	\$ 3966,00	
16-ene-19	RAFAEL SESCOSE SOTO	CASA HABITACION	113.73 M²	ING. RICARDO CARRANZA GALVEZ ZAC32/177	17097	TRES MESES	34	622151	\$ 5562,00	
16-ene-19	HELADIO MARTINEZ HERNANDEZ	CASA HABITACION	61.22 ²	PRORROGA	PRO	TRES MESES	35	622238	\$ 561,00	
17-ene-19	MARIA EUGENIA PERALES MEDELLIN	CASA HABITACION	117 M²	PRORROGA	PRO	SEIS MESES	36	618881	\$ 1122,00	
17-ene-19	GREGORIA ARELLANO VELAZQUEZ	CASA HABITACION	190 M²	PRORROGA	PRO	UN MES	37	620235	\$ 187,00	
17-ene-19	EUSTOLIO PEREZ MORENO	AMPLIACION CASA HABITACION	52.20 M²	PRORROGA	PRO	TRES MESES	38	621255	\$ 561,00	
17-ene-19	JORGE ANTONIO GUARDADO MENDEZ	CASA HABITACION	218 M²	PRORROGA	PRO	DOS MESES	39	622370	\$ 374,00	
17-ene-19	MA GUADALUPE REYES CONTRERAS	LOCALES COMERCIALES	121.17 M²	PRORROGA	PRO	DOS MESES	40	622294	\$ 374,00	
17-ene-19	JAIME BURCIAGA CAMPOS	CASA HABITACION	240 M²	REGULARIZACION	REG	TRES MESES	41	621097	\$ 4266,00	
18-ene-19	CALUIDIA GARCIA CABRAL	RESTAURANTE	107.57 M²	ARQ. LUIS CARLOS CASTAÑEDA BARRON ZAC32/149		TRES MESES	42	617910	\$ 6474,00	
21-ene-19	JOSE GUADALUPE MURILLO SALAS	CASA HABITACION	169 M²	PRORROGA	PRO	DOS MESES	43	623115	\$ 374,00	
21-ene-19	MANUEL DE JESUS DE LIRA NUÑEZ	AMPLIACION DE REFACCIONARIA	374.3 M²	ING. RAFAEL JUAREZ MACIAS ZAC32/074	17074	TRES MESES	44	623090	\$ 17027,00	



21-ene-19	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	LOCAL COMERCIAL	340 M²	ARQ. EDUARDO GUTIERREZ STEPHANO ZAC32/189	17229	TRES MESES	45	621364	\$ 12984,00	
25-ene-19	COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	ESTACION DE CARBURACION DE GAS LP	127 M²	ARQ. GABRIEL EV-DEN GALLEGOS GONZALEZ ZAC32/279	17070	TRES MESES	46	618885	\$ 7546,00	
25-ene-19	SERGIO ALBERTO VELOZ CORTES	CASA HABITACION	127.72 M²	ARQ. ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES ZAC32/245	17236	TRES MESES	47	621403	\$ 5155,00	
25-ene-19	JESUS ORTIZ CALDERA	CASA HABITACION	108.84 M²	PRORROGA	PRO	UN MES	48	621692	\$ 187,00	
25-ene-19	SERGIO RUIZ TORRES	AMPLIACION CASA HABITACION	106.94 M²	ARQ. JUAN LUIS GRACIA URIBE ZAC32/105	17206	TRES MESES	49	623950	\$ 4407,00	
28-ene-19	OPERADORA MBA S.A. DE C.V.	HOTEL	4205.46 M²				50			
29-ene-19	MONICA SILVINA CARLOS LUNA	BODEGA	344.77 M²	ARQ. GABRIEL EV-DEN GALLEGOS GONZALEZ ZAC32/279	17228	TRES MESES	51	625548	\$ 12969,00	
29-ene-19	EDUARDO JAUREGUI NUÑEZ	LOCAL COMERCIAL	100 M²	ARQ. MARIA ELENA MARQUEZ MAYORGA ZAC32/213	17259	TRES MESES	52	618025	\$ 3528,00	
29-ene-19	MARIA BERENICE DE LA ROSA RAMIREZ	CASA HABITACION	89 M²	PRORROGA	PRO	SEIS MESES	53	625615	\$ 1122,00	
30-ene-19	GUILLERMO DELGADO SAUCEDO	CASA HABITACION	171.04 M²	REGULARIZACION	REG	TRES MESES	54	625645	\$ 16440,00	
31-ene-19	MARTHA ALICIA RODRIGUEZ FEMAT	CASA HABITACION	163.67 M²	ARQ. JUAN LUIS GRACIA URIBE ZAC32/105	17233	TRES MESES	55	626069	\$ 6036,00	
31-ene-19	EDWIN RICARDO MENDEZ MARTINEZ	CASA HABITACION	84.37 M²	PRORROGA	PRO	UN MES	56	626014	\$ 187,00	
31-ene-19	ESPERANZA GALLEOS ESCOBEDO	GIMNASIO	113 M²	ARQ. NEFTALI ORENDAIN DEL MURO ZAC32/299	17108	TRES MESES	57	624394	\$ 6773,00	CLAUSURADA



FEBRERO 2019									
FECHA	NOMBRE	TIPO DE CONSTRUCCION	METROS M².	D.R.O	FICHA	TIEMPO	OFICIO	FOLIO	COSTO
01-feb-19	EFRAIN VILLA MUÑOZ	CASA HABITACION	106.80 M²	ARQ. SERGIO ALEJANDRO CARRILLO SARMIENTO ZAC32/312	16933	TRES MESES	58	624450	\$ 4402,00
01-feb-19	EFRAIN VILLA MUÑOZ	CASA HABITACION	59.01 M²	ARQ. SERGIO ALEJANDRO CARRILLO SARMIENTO ZAC32/312	16932	TRES MESES	59	624451	\$ 2151,00
01-feb-19	GEMA ALEJANDRA MUÑOZ CLADERA	AMPLIACION CASA HABITACION	52.50 M²	ARQ. ANAIRAM ESPARZA GALEANA ZAC32/277	17213	TRES MESES	60	624762	\$ 1975,00
07-feb-19	MARIA DEL SOCORRO MIER ZAVALA	CASA HABITACION		REGULARIZACION		TRES MESES	61	626382	\$ 5887,00
07-feb-19	MARTHA ELIODINA ESCALENTE GUZMAN	AMPLIACION CASA HABITACION	103 M²	ARQ. JUAN LUIS GRACIA URIBE ZAC32/105	17309	TRES MESES	62	626399	\$ 5238,00
08-feb-19	KARLA SARAHI RODRIGUEZ ALCALA	CASA HABITACION	158 M²	ING. LUIS ALFONSO VEYNA NAVA ZAC32/334	17306	TRES MESES	63	626049	\$ 6246,00
08-feb-19	CARLOS RUVALCABA LUNA	DEPARTAMENTOS 2DO Y 3ER NIVEL	506 M²	ARQ. MARIA ELENA MARQUEZ MAYORGA ZAC32/213	15938	TRES MESES	64	621350	\$ 18774,00
08-feb-19	DOMITILA FRAUSTO GARCIA	CASA HABITACION	280.50 M²	ARQ. MARIA ELENA MARQUEZ MAYORGA ZAC32/213	16576	TRES MESES	65	602092	\$ 7787,00
08-feb-19	ERNESTO ESCOTO PERALTA	CASA HABITACION	198.15 M²	PRORROGA	PRO	TRES MESES	66	626458	561
08-feb-19	JUAN CARLOS VEINA NAVA	CASA HABITACION	85 M²	ARQ. JUAN CARLOS VEYNA NAVA ZAC32/334	17319	TRES MESES	67	627253	\$ 2965,00
08-feb-19	PEDRO DELFIN CORTES	LOCAL COMERCIAL Y DEPARTAMENTO	146.3 M²	ARQ. JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	17332	TRES MESES	68	626651	\$ 6144,00
11-feb-19	MA. ISABEL RODRIGUEZ GOMEZ	CASA HABITACION	65.85 M²	PRORROGA	PRO	UN MES	69	628477	\$ 195,00
11-feb-19	ROSA GALLEGOS MATA	CASA HABITACION	75 M²	ING. SANDRA GARCIA TOVAR ZAC32/332	17265	TRES MESES	70	628576	\$ 2085,00
11-feb-19	GRUPO ENERGETICO GUDE S.A. DE C.V.	GASOLINERA	2061 M²	ARQ. HOMERO ULISES DE LA TORRE DUEÑAS ZAC32/106	17011		71	620914	\$ 76428,00
12-feb-19	HECTOR GERARDO ROSALES MARQUEZ	CASA HABITACION	105.66 M²	PRORROGA	PRO	TRES MESES	72	628861	\$ 585,00
12-feb-19	LIBRA Y ASOCIADOS	2 CASAS HABITACION	92.43 M² C/U	PRORROGA	PRO	DOS MESES	73	626774	\$ 390,00
12-feb-19	ANGELICA MARIA MIER MIER	CASA HABITACION	244.38 M²	PRORROGA	PRO	TRES MESES	74	628791	\$ 585,00
14-feb-19	CONSUELO TORRES ORTEGA	CASA HABITACION	66.40 M²	ARQ. SERGIO ALEJANDRO CARRILLO SARMIENTO ZAC32/312	17109	TRES MESES	75	619112	\$ 2948,00
14-feb-19	CLAUDIA VERONICA MIRAMONTES MONTAÑEZ	LOCAL COMERCIAL	171 M²	ARQ. EDUARDO GUTIERREZ STEPHANO ZAC32/189	17377	TRES MESES	76	626794	\$ 10698,00
14-feb-19	CRISTIAN FERNANDEZ VAZQUEZ	CASA HABITACION	162.29 M²	ARQ. OMAR GUADALUPE CERVANTES ZAC32/311	16942	TRES MESES	77	626851	\$ 6752,00
14-feb-19	LUIS DANIEL CHAIREZ FLORES	CASA HABITACION	270.25 M²	ARQ. JEIMAR REVELES ACOSTA ZAC32/196	17395	TRES MESES	78	626882	\$ 11243,00
15-feb-19	FRACCIONAMIENTNO ARTE MEXICANO	31 VIVIENDAS					79		
15-feb-19	JESUS ORTIZ CALDERA	CASA HABITACION	108.84 M²	PRORROGA	PRO	UN MES	80	629638	\$ 195,00



15-feb-19	MA. GUADALUPE REYES CONTRERAS	LOCAL COMERCIAL		PRORROGA	PRO	UN MES	81	629671	\$ 195,00
19-feb-19	EUSTAQUIO FLORES MARTINEZ	LOCAL COMERCIAL Y CASA HABITACION	360 M²	PRORROGA	PRO	TRES MESES	82	629697	\$ 585,00
21-feb-19	LUIS MANUEL DOMINGUEZ SEGURA	DEPARTAMENTOS PLANTA ALTA	292 M²	PRORROGA	PRO	TRES MESES	83	630765	\$ 585,00
21-feb-19	GRUPO INMOBILIARIO ZACATECAS S.A. DE C.V .	21 CASAS HABITACION	40.92 M² C/U	PRORROGA	PRO	UN MES	84	631015	\$ 4095,00
21-feb-19	FRACCIONAMIENTNO ARTE MEXICANO	31 VIVIENDAS	44 M² C/U				85		
22-feb-19	IMAIN DE JESUS GARCIA GUARDADO	LOCAL COMERCIAL Y DEPARTAMENTOS	400 M²	ARQ. ANAIRAM ESPARZA GALEANA ZAC32/277	17312	TRES MESES	86	631048	\$ 15785,00
22-feb-19	JOSUE GARAY ZAMORA	DEPARTAMENTO	94 M²	ARQ. ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES ZAC32/245	17326	TRES MESES	87	626749	\$ 3767,00
22-feb-19	MARIA ROSENDA MONTES RODRIGUEZ	AMPLIACION CASA HABITACION	150 M² 3ER NIVEL	ARQ. JUAN LUIS GRACIA URIBE	17430	TRES MESES	88	617707	\$ 7323,00
22-feb-19	AMADO CORTES MEDINA	LOCAL COMERCIAL	190 M²	ARQ. SERGIO ALEJANDRO CARRILLO SARMIENTO ZAC32/312	17310	TRES MESES	89	627346	\$ 11008,00
22-feb-19	AMELIA ORTIZ FERNANDEZ	CASA HABITACION	199.95 M²	ARQ. ANAIRAM ESPARZA GALEANA ZAC32/277	17373	TRES MESES	90	630650	\$ 8694,00
26-feb-19	MARTHA ANGELICA RAMIREZ SALAZAR	CASA HABITACION	184.38 M²	ARQ. MARIA ELENA MARQUEZ MAYORGA ZAC32/213	17358	TRES MESES	91	631124	\$ 9066,00
26-feb-19	MARIA GUADALUPE SANCHEZ VIDALES	CASA HABITACION	154.50 M²	PRORROGA	PRO	UN MES	92	632324	\$ 195,00
28-feb-19	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ	CASA HABITACION	40.92M²			UN MES	93	632788	\$ 686,00
28-feb-19	MA DEL CARMEN SANCHEZ MARTINEZ	CASA HABITACION	114 M²	PRORROGA	PRO	TRES MESES	94	632766	\$ 585,00
28-feb-19	ALDO BUCHANAN BERUMEN	DEPARTAMENTO PLANTA ALTA	96.60 M²	ARQ. EDUARDO GUTIERREZ STEPHANO ZAC32/189	17475	TRES MESES	95	632942	\$ 3966,00
28-feb-19	BANESSA MENDIOLA RUEDAS	CASA HABITACION	95 M²	ARQ. MOISES ARAON ROMAN TRUJILLO ZAC32/026	17480	TRES MESES	96	632950	\$ 2390,00



MARZO 2019									
FECHA	NOMBRE	TIPO DE CONSTRUCCION	METROS M².	D.R.O	FICHA	TIEMPO	OFICIO	FOLIO	COSTO
01-mar-19	ROSA CAMPOS HERNANDEZ	CASA HABITACION	60.42 M²	PRORROGA	PRO	DOS MESES	97	631313	\$ 390,00
01-mar-19	CARLOS ALBERTO HERRERA MACIAS	CASA HABITACION	206.14 M²	PRORROGA	PRO	UN MES	98	631315	\$ 195,00
04-mar-19	ANA LIDIA SANTA CRUZ	CASA HABITACION	178.93 M²	PRORROGA	PRO	TRES MESES	99	633221	\$ 585,00
04-mar-19	GENARO MARTINEZ ESCOBEDO	CASA HABITACION	95.84 M²	REGULARIZACION	REG	TRES MESES	100	633285	\$ 2550,00
05-mar-19	EVA AGUAYO ALMAGUER	CONSULTORIOS	157 M²	ARQ. OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES ZAC32/311	15996	TRES MESES	101	632449	\$ 4674,00
05-mar-19	RAUL CONTRERAS HENRADEZ	CASA HABITACION	100 M²	REGULARIZACION	REG	TRES MESES	102	626174	\$ 5887,00
05-mar-19	MATEO ACOSTA HERNANDEZ	AMPLIACION CASA HBAITACION	85.65 M²	ARQ. OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES ZAC32/311	17281	TRES MESES	103	632824	\$ 2212,00
05-mar-19	ROCK BOLT DE MEXICO S.A. DE C.V.	NAVE INDUSTRIAL	1741.81 M²	PRORROGA	PRO	TRES MESES	104	633362	\$ 585,00
06-mar-19	JUNIOR ALAIN LUNA FRAUSTO	CASA HABITACION	91.70 M²	ARQ. JUAN LUIS GRACIA URIBE ZAC32/105	17385	TRES MESES	105	63113	\$ 1937,00
06-mar-19	J. JESUS TRETO LUNA	CASA HABITACION	67.90 M²	ARQ. SERGIO ALEJANDRO CARRILLO SSARMIENTO ZAC32/312	17410	TRES MESES	106	631171	\$ 1875,00
06-mar-19	J. JESUS TRETO LUNA	CASA HABITACION	67.90 M²	ARQ. SERGIO ALEJANDRO CARRILLO SSARMIENTO ZAC32/312	17411	TRES MESES	107	631172	\$ 5625,00
07-mar-19	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ	CASA HABITACION	99 M²	REGULARIZACION	REG	TRES MESES	108	634012	\$ 4347,00
07-mar-19	SANATORIO SAN VICENTE A.C.	UNIDAD DE HEMODIALISIS Y CONSULTORIOS	184.65 M²	PRORROGA	PRO	UN MES	109	634215	\$ 195,00
07-mar-19	J. ASCENCION CHONG ZEPEDA	DEPARTAMENTOS	600 M²	ARQ. SERGIO ALEJANDRO CARRILLO SSARMIENTO ZAC32/312	17305	TRES MESES	110	629876	\$ 23385,00
07-mar-19	MA. ESTHELA AVILA COVARRUBIAS	CASA HABITACION	117 M²	ING. JOSE ANGEL AVILA COVARRUBIAS ZAC32/224	17520	TRES MESES	111	631422	\$ 5031,00
08-mar-19	ARTEMIO FELIX BERUMEN	CASA HABITACION	111.30 M²	PRORROGA	PRO	DOS MESES	112	631486	\$ 390,00
08-mar-19	ARTEMIO FELIX BERUMEN	DEPARTAMENTOS	598.54 M²	PRORROGA	PRO	CUATRO MESES	113	631487	\$ 780,00



08-mar-19	SIHOMARA NPTHALI TEJADA ORTEGA	CASA HABITACION	119.65 M²	PRORROGA	PRO	UN MES	114	634558	\$ 195,00
08-mar-19	ANGELICA MARIA MIER MIER	CASA HABITACION	244.38 M²	PRORROGA	PRO	DOS MESES	115	634513	\$ 390,00
08-mar-19	DAVID NAJERA DOMINGUEZ	CASA HABITACION	118.82 M²	PRORROGA	PRO	UN MES	116	631498	\$ 195,00
08-mar-19	DAVID NAJERA DOMINGUEZ	CASA HABITACION	118.82 M²	PRORROGA	PRO	UN MES	117	631497	\$ 195,00
11-mar-19	ALFREDO HERNANDEZ VAZQUEZ	TALLER DE MATENIMIENTO	112 M²	ARQ. MOISES ARAON ROMAN TRUJILLO ZAC32/026	17528	TRES MESES	118	634311	\$ 4841,00
12-mar-19	ROSA LANDY MARTINEZ SOLIS	DEPARTAMENTOS Y RESTAURANTE	564.18 M²	PRORROGA	PRO	TRES MESES	119	631536	\$ 585,00
12-mar-19	SERGIO SANCHEZ LOPEZ	CASA HABITACION	214.92 M²	PRORROGA	PRO	CUATRO MESES	120	631567	\$ 780,00
13-mar-19	JORGE LUIS JAUREGUI OCAMPO	LOCAL COMERCIAL PLANRA BAJA	174.44 M²	ARQ. EDUARDO GUTIERREZ STEPHANO ZAC32/189	17583	TRES MESES	121	635078	\$ 8609,00
13-mar-19	MA EUGENIA MARTINEZ SUSTAITA	AMPLIACION GUARDERIA INFANTIL	58.94 M²	ARQ. NEFTALI ORENDAIN DEL MURO ZAC32/299	17487	TRES MESES	122	631557	\$ 4003,00
13-mar-19	BENITO ESCOBEDO TREJO	CASA HABITACION	84.05 M²	ARQ. JESUS CORREA ESPARZA ZAC32/130	17504	TRES MESES	123	635090	\$ 6546,00
14-mar-19	MA GUADALUPE REYES CONTRERAS	LOCALES COMERCIAL	121.17 M²	PRORROGA	PRO	UN MES	124	635409	\$ 195,00
19-mar-19	BRENDA ESPARZA FRAUSTO	AMPLIACION BODEGA	261.06 M²	PRORROGA	PRO	ONCE MESES	125	633393	\$ 2145,00
19-mar-19	SERGIO ENRIQUE PIÑA JAIME	CASA HABITACION	374 M²	PRORROGA	PRO	UN MES	126	635445	\$ 195,00
19-mar-19	JORGE ANTONIO GUARDADO MENDEZ	CASA HABITACION	218 M²	PRORROGA	PRO	TRES MESES	127	635659	\$ 585,00
19-mar-19	VICTOR HUGO CARRILLO ROBLES	CASA HABITACION	228.45 M²	PRORROGA	PRO	UN MES	128	635649	\$ 195,00
19-mar-19	ROSA MARTHA CORTES SANCHEZ	CASA HABITACION	110 M²	ARQ. ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES ZAC32/245	17603	TRES MESES	129	631655	\$ 4765,00
19-mar-19	IVETH YAZMIN RIVERA DE LA ROSA	CASA HABITACION	185.60 M²	ARQ. ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES ZAC32/245	17606	TRES MESES	130	631736	\$ 9122,00
21-mar-19	AMADO CORTES MEDINA	CASA HABITACION	140 M²	REGULARIZACION	REG	TRES MESES	131	631744	\$ 26115,00
21-mar-19	FRANCISCO DE LIRA SAUCEDO	CASA HABITACION	88 M²	REGULARIZACION	REG	TRES MESES	132	635879	\$ 3734,00
21-mar-19	RODOLFO ZUÑIGA HERRERA	CASA HABITACION	85 M²	REGULARIZACION	REG	TRES MESES	133	631777	\$ 3420,00
22-mar-19	JOSE GUADALUPE MURILLO SALAS	CASA HABITACION	169 M²	PRORROGA	PRO	DOS MESES	134	636070	\$ 390,00
22-mar-19	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	CASA HABITACION	132.15 M²	PRORROGA	PRO	UN MES	135	631865	\$ 195,00



[illegible]
