



DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLIAS

DIRECTOR

ING. NOEL DE LEÓN HERNÁNDEZ

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
01/04/20	4 DE OCTUBRE	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	PARA LA COMODIDAD DE LOS CIUDADANOS , LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE LIMPIEZA DE ESCOMBRO DONDE SE CAMBIO REGISTRO DE DRENAJE EL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
01/04/20	VASO DE LA LAGUNILA, COL. SECTOR LAGUNILLA	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	DANDO SEGUIMIENTO A LAS MEJORAS DEL MUNICIPIO, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, CAMBIA TAPA Y BROCAL DE REGISTRO DEL SECTOR LAGUNILLA,				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
01/04/20	C. DURANGUITO, COL. CENTRO	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	PARA COMODIDAD DE LOS CIUDADANOS AL TRANSITAR POR LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, PREPARA 40 M ² DE ZANJA PARA BACHEO HIDRAULICO .				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
01/04/20	C. DURANGUITO, CENTRO	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, REALIZA ACTIVIDADES DE BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO, DE 40 M ² A 250 DE RESISTENCIA CON FRAGUADO DE 3 DIAS, EN LA C. DURANGUITO, CENTRO.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
02/04/20	DANIEL PERALTA	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	CONTINUANDO CON LOS TRABAJOS Y EN ATENCION AL REPORTE CIUDADANO, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE REPARACION DE POZO DE VISITA Y CAMBIA TAPA DE REGISTRO.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
02/04/20	C. DIVISION DEL NORTE COL FCO VILLA	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, REALIZA ACTIVIDADES DE BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO, DE 50 M ² A 250 DE RESISTENCIA CON FRAGUADO DE 3 DIAS, EN LA C. DIVISION DEL NORTE, FCO VILLA.				





BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
DEL 3 AL 16 DE ABRIL	VARIOS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE BACHEO, SE ENCUENTRA INTEGRADA EN APOYO A LA CUADRILLA DE DRENAJEROS, DEVIDO A LA CONTINGENCIA Y FALTA DE MATERIAL ASFALTICO E HIDRAULICO, POR TANTO NO HAY ACTIVIDAD DE BACHEO. Y ASU VEZ EL CAMION DE DESASOLVE (BACALL) SE ENCUENTRA EN MATENIMIENTO EN EL TALLER DEL MUNICIPIO.				

BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17/04/20	C. BELISARIO DOMINGUEZ, COL. CENTRO	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, REALIZA ACTIVIDADES DE CORTE DE ZANJA EN LA C. BELIZARIO DOMINGUEZ PARA CAMBIO DE TUBERIA.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17/04/20	MODULO 17, COL INDECO	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, REALIZA ACTIVIDADES DE SONDEO DE LA LINEA GENERAL, CON EL FIN DE SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE TAPONAMIENTO.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17/04/20	C.KGM Y FCO.VILLA, COL EMILIANO ZAPATA	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	DANDO SEGUIMIENO A LA DENUNCIA CIUDADANA LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, REALIZA ACTIVIDADES DE SONDEO DE LA LINEA GENERAL.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17/04/20	PUENTE SALIDA A DURANGO, A UN COSTADO DE LIVERPOOL	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	EN ATENCION A LA DENUNCIA CIUDADANA, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, REALIZA ACTIVIDADES DE SONDEO DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE, LLEGANDO A LA CONCLUSION QUE EL PROBLEMA EXISTENTE ES DEBIDO A QUE EL TUBO SE ENCUENTRA SATURADO DE BASURA.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20/04/20	C. DE LA LOZA, COL OBRERA	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	CONTINUANDO CON LOS TRABAJOS DE LA C. LOZA, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, INICIA CON LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERIA, HABIENDO ZANJA Y ASI DARLE PRONTA RESPUESTA, A LOS VECINO DE ESTA CALLE, YA QUE DESDE HACE VARIOS AÑOS TIENEN EL PROBLEMA DE INUNDACION EN SUS DOMICILIOS.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20/04/20	C, TECNOLOGICA, COL SOLIDARIDAD	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	SE ACUDE A LA CALLE TECNOLOGICA, PARA HACER CORTE DE CALLE DONDE SE HARA REPOSICION DE TUBERIA, DEBIDO AL MAL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL TUBO DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE, PROVOCANDO EL DERRAME DE AGUAS NEGRAS POR LA CALLE				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
21/04/20	C. DE LA LOZA, COL OBRERA	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	CUMPLIENDO CON EL COMPROMISO CON LOS VECINOS DE LA C. LOZA LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE CAMBIO DE 50 M DE TUBERIA DE PVC DE 12" DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE DAÑADA.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
21/04/20	C. DE LA LOZA, COL OBRERA	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	CUMPLIENDO CON EL COMPROMISO CON LOS VECINOS DE LA C. LOZA LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE CAMBIO DE 50 M DE TUBERIA DE PVC DE 12" DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE DAÑADA.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22/04/20	C.KGM Y SAMUEL QUIÑONES, COL. EMILIANO ZAPATA	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	DANDO SEGUIMIENTO A LA DENUNCIA DE LA CALLE SAMUEL QUIÑONES Y KGM, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE ZANJA PARA LA REPOSICION DE 24 M DE TUBERIA DE PVC DE 12" DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22/04/20	C.KGM Y SAMUEL QUIÑONES, COL. EMILIANO ZAPATA	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	DANDO SEGUIMIENTO A LA DENUNCIA DE LA CALLE SAMUEL QUIÑONES Y KGM, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE ZANJA PARA LA REPOSICION DE 24 M DE TUBERIA DE PVC DE 12" DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22/04/20	C. FCO VILLA, COL, EMILIANO ZAPATA	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA LINEA GENERAL DEL DRENAJE, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, CONSTRUYE REGISTRO EN LA C. FCO. VILLA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, UNA ACCION MAS QUE BENEFICIA A LOS FRESNILLENSSES.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22/04/20	C. FCO VILLA, COL, EMILIANO ZAPATA	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA LINEA GENERAL DEL DRENAJE, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, CONSTRUYE REGISTRO EN LA C. FCO. VILLA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, UNA ACCION MAS QUE BENEFICIA A LOS FRESNILLENSSES.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23/04/20	C.JOAQUIN ARRIETA, COL. FCO VILLA,	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	SE HACE CORTE DE ZANJA EN LA C, JOAQUIN ARRIETA , PARA EN LOS PROXIMOS DIAS HACER REPOSICION DE TUBERIA, YA QUE LOS VECIONOS DE ESTA CALLE CUENTAN CON PROBLEMAS DE DRENAJE DESDE HACE MAS DE 10 AÑOS.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24/04/20	C. INSURGENTES,	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	SE HACE CORTE DE ZANJA EN LA C,INSURGENTES , PARA EN LOS PROXIMOS DIAS HACER REPOSICION DE TUBERIA.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24/04/20	C.HOMBRES ILUSTRES, ZONA CENTRO	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	PARA MEJORAR EL SERVICIO DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, CAMBIA TAPA DE REGISTRO EN LA C, HOMBRES ILUSTRES, CON LA FINALIDAD DE DAR ATENCION A LAS DENUNCIAS DE LOS CIUDADANOS.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
27/04/20	C.CEDROS, COL ARBOLEDAS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	PARA MEJORAR EL SERVICIO DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, CAMBIA TAPA DE REGISTRO EN LA C, CEDROS, CON LA FINALIDAD DE DAR ATENCION A LAS DENUNCIAS DE LOS CIUDADANOS.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
27/04/20	C. INSURGENTES	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	PARA MEJORAR EL SERVICIO DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE DE LA C. INSURGENTES, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE REPOSICION DE 16 METROS LINEALES DE TUBERIA DE PVC DE 12".				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28/04/20	C.MAGNESIO	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, CAMBIA TAPADERA DE REGISTRO EN LA C. MAGNESIO, CON LA FINALIDAD DE DAR ATENCION A LAS DENUNCIAS DE LOS CIUDADANOS.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28/04/20	C.MAGNESIO	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE CALA A BASE DE PICO Y PALA PARA LA RESTAURACION DE REGISTRO DE DRENAJE EN LA C. SECTOR POPULAR, CON ESTA ACCION QUEDA ATENDIDA UNA MAS DE LAS DENUNCIAS QUE A DIARIO RECIBIMOS.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
29/04/20	C, FRESNOS, COL. ARBOLEDAS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	EN ATENCION A LA DENUNCIA CIUDADANA, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, REALIZA ACTIVIDADES DE CAMBIO DE TAPADERA DE REGISTRO .				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
29/04/20	CALLE VIGA, COL OBRERA	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	ANALIZANDO EL DETERIORO DE LOS REGISTROS DE DRENAJE, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE RECONSTRUCCION DE BROCAL Y TAPADERA DE REGISTRO, PARA BRINDARLE UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA EN GENERAL.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
29/04/20	CALLE VIGA, COL OBRERA	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	ANALIZANDO EL DETERIORO DE LOS REGISTROS DE DRENAJE, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE RECONSTRUCCION DE BROCAL Y TAPADERA DE REGISTRO, PARA BRINDARLE UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA EN GENERAL.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
30/04/20	CALLE VIGA, COL OBRERA	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	PARA COMODIDAD DE LOS VECINOS DE LA C. VIGA, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE LIMPIEZA DE ESCOMBRO DESPUES DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EL DIA 29 DE ABRIL, DEJANDO LOS TRABAJOS CONCLUIDOS EN UN 100%.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
30/04/20	C. PROLONGACION ZARAGOZA	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	CONTINUANDO CON LOS REPORTES DE LA CIUDADANIA, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, ACUDE A LA PROLONGACION ZARAGOZA PARA DESTAPAR EL DRENAJE, QUE CAUSA PROBLEMAS A LOS VECINOS DE ESTA AREA POR LO CUAL SE HACE SONDEO CON BARILLAS DE 34 M LINEALES, LOGRANDO SOLUCIONAR EL PROBLEMA.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
30/04/20	SECTOR POPULAR	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	DANDOLE RESPUESTA A LA DENUNCIA DE LOS CIUDADANOS , LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE RECONSTRUCCION DE BROCAL Y TAPADERA DE REGISTRO.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
04/05/20	I.ZARAGOZA, COL. ESPARZA	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	DANDO CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS DE LA C. I. ZARAGOZA, COL. ESPARZA, EL PERSONAL DE MATENIMIENTO FISICO, REALIZA CORTE DE ZANJA, PARA CAMBIO DE LINEA GENERAL DE DRENAJE,				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
04/02/20	C. JUSTO SIERRA, CENTRO	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	ATENDIENDO UNA PETICION MAS DE LA CIUDADANIA, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, LLEVA ACABO ACTIVIDADES DE BACHEO DE CONCRETO HIDRAHULICO, DE 63.5 M ² A 250 DE RESISTENCIA CON FRAGUADO DE 3 DIAS.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
04/02/20	C. JUSTO SIERRA	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	ATENDIENDO UNA PETICION MAS DE LA CIUDADANIA, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, LLEVA ACABO ACTIVIDADES DE BACHEO DE CONCRETO HIDRAHULICO, DE 63.5 M ² A 250 DE RESISTENCIA CON FRAGUADO DE 3 DIAS..				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05/02/20	C. CHABACANOS, COL. ARBOLEDAS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	ATENDIENDO A LA SOLICITUD DE VECINOS DE LA C. CHABACANOS EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, INICIA CON LA ELABORACION DE UNA CALA, PARA LA MODIFICACION DEL REGISTRO DE DRENAJE				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
06/02/20	C. CHABACANOS, COL. ARBOLEDAS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	DANDO SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE LA C. CHABACANOS, SE HACEN VARIAS MANIOBRAS TALES COMO; TRITURACION DE CONCRETO, RELLENO DE ZANJA Y MODIFICACION DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE, YA QUE LA EXISTENTE PRESENTABA DAÑOS Y ESTOS PROVOCABAN INUNDACIONES A VARIOS DOMICILIOS.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
06/02/20	C. CHABACANOS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	DANDO SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE LA C. CHABACANOS, SE HACEN VARIAS MANIOBRAS TALES COMO; TRITURACION DE CONCRETO, RELLENO DE ZANJA Y MODIFICACION DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE, YA QUE LA EXISTENTE PRESENTABA DAÑOS Y ESTOS PROVOCABAN INUNDACIONES A VARIOS DOMICILIOS.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
06/02/20	C. CHABACANOS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	DANDO SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE LA C. CHABACANOS, SE HACEN VARIAS MANIOBRAS TALES COMO; TRITURACION DE CONCRETO, RELLENO DE ZANJA Y MODIFICACION DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE, YA QUE LA EXISTENTE PRESENTABA DAÑOS Y ESTOS PROVOCABAN INUNDACIONES A VARIOS DOMICILIOS.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
07/02/20	C. CHABACANOS, COL. ARBOLEDAS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	PARA FINALIZAR LOS TRABAJOS DE C. CHABACANOS, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, CONSTRUYE POZO DE VISITA, PARA DAR MANTENIMIENTO A LA LINEA GENERAL DE DRENAJE, CUANDO ESTA LO REQUIERA.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
08/02/20	C. CHABACANOS, COL. ARBOLEDAS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS VECINOS DE LA CALLE CHABACANOS, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, INSTALA TAPADERA DE REGISTRO, QUEDANDO ATENDIDA EN SU TOTALIDAD DICHO REPORTE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11/05/20	EDIFICIO 1, EL OLIVAR	DRENAJES	DRENAJES BACHEO	216 251	100
NOTA	DANDO SOLUCION AL REPORTE CIUDADANO, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, LIMPIA REGISTRO Y HACE SONDEO A BASE DE BARILLAS, SOLUCIONADO EL PROBLEMA EN SU TOTALIDAD.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11/05/20	C. 2 DE ABRIL Y MOCTEZUMA	DRENAJES	DRENAJES BACHEO	216 251	100
NOTA	EN ATENCION A LA SOLICITUD DE LOS VECINOS DE LA C. 2 ABRIL SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE REPOSICION DE DRENAJE, ABRIENDO CALA PARA DAR PASO AL CAMBIO DE TUBERIA.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12/05/20	TALLER DEL MUNICIPIO		BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO ELABORA TAPADERAS DE REGISTRO, PARA DAR SEGUIMIENTO EN LOS PROXIMOS DIAS A LAS DENUNCIAS DE LOS CIUDADANOS.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12/05/20	TALLER DEL MUNICIPIO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO HACE LIMPIEZA EN EL TALLER DEL MUNICIPIO				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13/05/20	C. GONZALEZ ECHEVERRIA, EL OLIVAR	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	ATENDIENDO A LOS REPORTES DE LA CIUDADANIA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO DESTAPA LINEA GENERAL DE DRENAJE, DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE BASUR Y ROPA VIEJA QUE OCACIONABA EL TAPONAMIENTO, UNA ACCION MAS QUE BENEFICIA A LA POBALCION				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14/05/20	PUENTE A UN COSTADO DE LIVERPOOL	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO HACE LIMPIEZA DE LINEA GENERAL EN EL PUENTE FRENTE A LA UAF, DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA SATURADA DE BASURA Y PARA EVITAR QUE SEA UN TIRADERO PUBLICO HACEN BROCAL Y SELLAN TAPA DE REGISTRO				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14/05/20	C. SIERRA DE VALDECAÑAS	DRENAJES	DRENAJES BACHEO	216 251	100
NOTA	DANDO SEGUIMIENTO AL PROBLEMA DE DRENAJES, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE CORTE DE ZANJA, PARA DAR PASO AL CAMBIO DE TUBERIA DE 78 M LINEALES DE TUBO DE PVC DE 12".				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15/05/20	TALLER DEL MUNICIPIO	PROCESOS	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, ELABORA TAPADERAS DE REGISTRO, PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS REGISTROS DE CALLES QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15/05/20	C. 2 DE ABRIL Y MOCTEZUMA	DRENAJES	BACHEO DENAJEROS	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, INICIA CON LOS TRABAJOS PARA CAMBIO DE TUBERIA EN LA C. 2 DE ABRIL, ABRIENDO 78 METROS LINEALES PARA ZANJA DE DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15/05/20	C. 2 DE ABRIL Y MOCTEZUMA	DRENAJES	BACHEO DENAJEROS	251 216	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, INICIA CON LOS TRABAJOS PARA CAMBIO DE TUBERIA EN LA C. 2 DE ABRIL, ABRIENDO 78 METROS LINEALES PARA ZANJA DE DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18/05/20	C. MARILLAS, COL CENTRO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	EN ATENCION A LOS REPORTES CIUDADANOS, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE CORTE ZANJA EN LA C. MARAVILLAS, PARA HACER CAMBIO DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18/05/20	SIERRA DE VADECAÑAS, LOMAS DE PLATEROS	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, INICIA CON LOS TRABAJOS PARA CAMBIO DE TUBERIA , ABRIENDO ZANJA EN LA C. SIERRA DE VALDECAÑAS. Y ASI DAR PASO A LA REPOSICION DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE, LA CUAL SE ENCUENTRA DAÑADA.				



NOTA

LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, INICIA CON LOS TRABAJOS PARA CAMBIO DE TUBERIA EN LA C. BARBIQUEJO, ABRIENDO 70 METROS LINEALES PARA ZANJA DE DRENAJE.



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19, 20 /05/20	C.BARBIQUEJO, COL. LIENZO CHARRO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, INICIA CON LOS TRABAJOS PARA CAMBIO DE TUBERIA EN LA C. BARBIQUEJO, ABRIENDO 70 METROS LINEALES PARA ZANJA DE DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
21/05/20	C.MOCTEZUMA Y 2 DE ABRIL	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	ATENDIENDO A LA SOLICITUD DE LOS VECINOS DE LA C. 2 DE ABRIL, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE REPOSICION DE 78 M DE TUBERIA DE PVC DE 12", ASI MISMO SE RELLENA ZANJA PARA MAYOR SEGURIDAD DE LOS QUE TRANSITAN POR ESTA CALLE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
21/05/20	C.MOCTEZUMA Y 2 DE ABRIL	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	ATENDIENDO A LA SOLICITUD DE LOS VECINOS DE LA C. 2 DE ABRIL, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE REPOSICION DE 78 M DE TUBERIA DE PVC DE 12", ASI MISMO SE RELLENA ZANJA PARA MAYOR SEGURIDAD DE LOS QUE TRANSITAN POR ESTA CALLE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
21/05/20	C. SIERRA DE VALDECAÑAS	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	ATENDIENDO AL REPORTE CIUDADANO, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, REALIZA REPOSICION DE 53 M DE TUBERIA DE PVC DE 12", ASI MISMO SE RELLENA ZANJA PARA MAYOR SEGURIDAD DE LOS QUE TRANSITAN POR ESTA CALLE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22/05/20	C. SIERRA DE VALDECAÑAS	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	ATENDIENDO AL REPORTE CIUDADANO, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, REALIZA REPOSICION DE 53 M DE TUBERIA DE PVC DE 12", ASI MISMO SE RELLENA ZANJA PARA MAYOR SEGURIDAD DE LOS QUE TRANSITAN POR ESTA CALLE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25/05/20	C. SIERRA DE VALDECAÑAS	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	DESPUES DE LOS TRABAJOS DE REPOSICION DE TUBERIA, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, REALIZA LIMPIEZA DE ESCOMBRO PARA COMODIDAD DE LOS QUE TRANSITAN LA C. SIERRA DE VALDECAÑAS,				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25/05/20	PRIVADA NIÑO ARTILLERO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, REALIZA ZAJA PARA REPOSICION DE TUBERA EN LA PRIVADA NIÑO ARTELLERO.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26/05/20	PRIVADA NIÑO ARTILLERO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE REPOSICION DE 60 M LINEALES DE TUBERIA DE PVC DE 12", EN LA C. NIÑO ARTELLERO.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26/05/20	PRIVADA NIÑO ARTILLERO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE REPOSICION DE 60 M LINEALES DE TUBERIA DE PVC DE 12", EN LA C. NIÑO ARTELLERO.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
27/05/20	PRIVADA NIÑO ARTILEERO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	DESPUES DE LOS TRABAJOS DE REPOSICION DE TUBERIA, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, REALIZA LIMPIEZA DE ESCOMBRO PARA COMODIDAD DE LOS QUE TRANSITAN LA PRIVADA NIÑO ARTILLERO.				




BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
2888/05/20	JOAQUIN ARRIETA	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE REPOSICION DE 6 M LINEALES DE TUBERIA DE PVC DE 12", EN LA C. JOQUIN ARRIETA				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28/05/20	AV ENRIQUE ESTRADA	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, LIMPIAN REJILLAS DE AGUAS PLUVIALES PREVIENDO INUNDACIONES EN TEMPORADA DE LLUVIAS.				

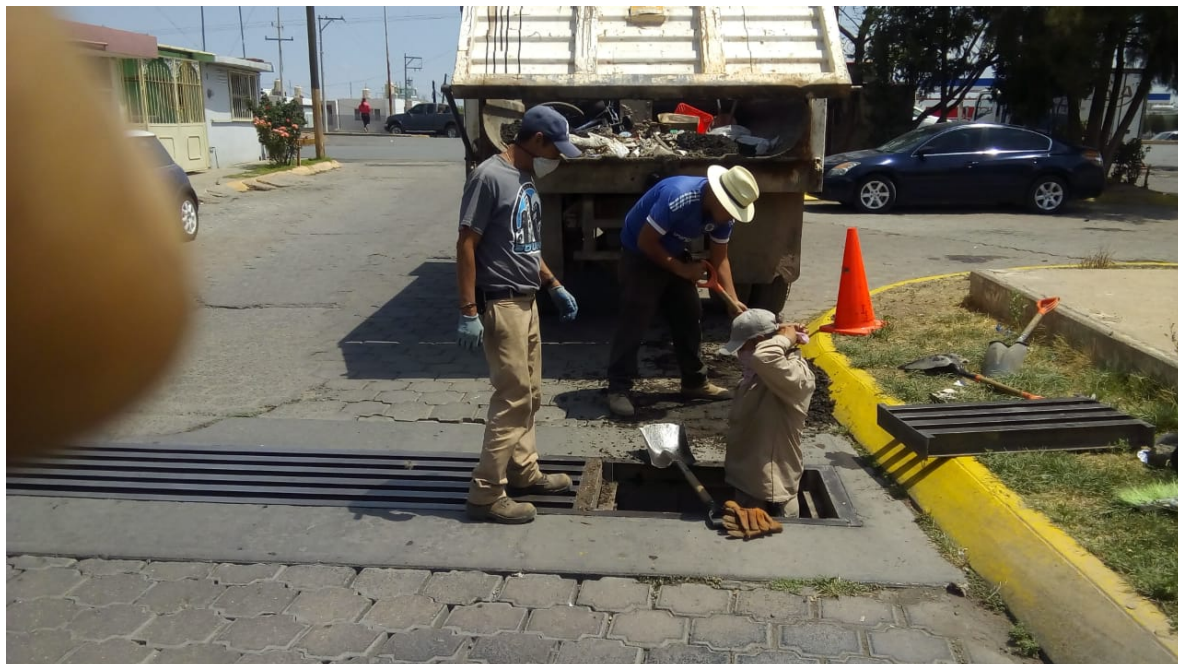

BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28/05/20	AV ENRIQUE ESTRADA	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, LIMPIAN REJILLAS DE AGUAS PLUVIALES PREVIENDO INUNDACIONES EN TEMPORADA DE LLUVIAS.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
29/05/20	C.BARBIQUEJO, COL LIENZO CHARRO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE REPOSICION DE 12 TRAMOS DE TUBERIA DE PVC DE 10", DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE EN LA COL LIENZO CHARRO.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
29/05/20	C.BARBIQUEJO, COL LIENZO CHARRO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE REPOSICION DE 12 TRAMOS DE TUBERIA DE PVC DE 10", DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE EN LA COL LIENZO CHARRO.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
01/06/20	C. CRUZ ROJA	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE REPOSICION DE UN TRAMO TUBERIA DE PVC DE 12". YA QUE LA LINEA GENERAL SE ENCONTRABA TOTALMENTE ENSOLVADA, EL CUAL PROVOCABA EL PROBLEMA DE INUNDACION CON ALGUNOS VECINOS DE LA CALLE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
02/06/20	C. FCO. I MADERO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE CALA PARA LA CONSTRUCCION DE REGISTRO EN LA C. FCO I MADERO.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
03/06/20	C. FCO. I MADERO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE LA CONSTRUCCION DE REGISTRO EN LA C. FCO I MADERO.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
03/06/20	C. DURANGUITO, COL CENTRO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE TRITURACION CONCRETO, PARA HACER ZANJA DE DRENAJE				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
04/06/20	C. DURANGUITO, COL CENTRO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	DANDO CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS EN LA C. DURANGUITO, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE ZANJA PARA LA REPOSICION DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05/06/20	C. DURANGUITO, COL CENTRO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	PARA FINALIZAR LOS TRABAJOS EN LA C. DURANGUITO, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE REPOSICION DE 66 METROS LINEALES DE TUBERIA DE PVC DE 12", Y ASU VEZ RELLENAN ZANJA PARA SEGURIDAD DE LOS QUE TRANSITAN POR ESTA CALLE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05/06/20	C. DURANGUITO, COL CENTRO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	PARA FINALIZAR LOS TRABAJOS EN LA C. DURANGUITO, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE REPOSICION DE 66 METROS LINEALES DE TUBERIA DE PVC DE 12", Y ASU VEZ RELLENAN ZANJA PARA SEGURIDAD DE LOS QUE TRANSITAN POR ESTA CALLE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
08/06/20	GALS	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENOMIENTO FISICO CARGA Y ACARREA 5 BULTOS DE CEMENTO Y 10 TRAMOS DE TUBERIA DE 10" PARA DAR CONTINUIDAD A LA OBRA DE CAMBIO DE TUBERIA EN LA COL. LIENZO DEL CHARRO.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
08/06/20	C. BARBIQUEJO, COL. LIENZO CHARRO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE COLOCACION DE 10 TRAMOS DE TUBERIA DE PVC DE 10", EN LA CALLE BARBIQUEJO, DE LA COL. LIENZO CHARRO.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
09/06/20	PRIVADA.SSA, COL FOVISSTE	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DE AGUAS PLUVIALES, ESTO CON LA FINALIDAD DE EVITAR POSIBLES INUNDACIONES EN TEMPORADAS DE LLUVIAS.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
09/06/20	C.FCO JAVIER MINA, COL CENTRO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	DANDO RESPUESTA Y UN MEJOR SERVICIO A LOS QUE TRANSITAN LAS PRINCIPALES VIALIDADES, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE CAMBIO DE TAPADERA DE REGISTRO EN LA C. J. MINA ZONA CENTRO.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
09/06/20	PROLONGACION ZARAGOZA	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	ATENDIENDO LA QUEJA DE VARIOS CIUDADANOS, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, EMPAREJA ZANJA DE DRENAJE CON REVESTIMIENTO, ESTO CON EL OBJETIVO DE EVITAR ACCIDENTES.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10 Y 11/06/20	HUERTAS DE ABAJO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	VELANDO POR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO HACE ACTIVIDADES DE NIVELACION Y LIMPIEZA DEL CANAL DE AGUAS RESIDUALES, PARA LA PREVENIR INUNDACIONES EN LAS PROXIMAS TEMPORADA DE LLUVIAS.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10 Y 11/06/20	HUERTAS DE ABAJO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	VELANDO POR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO HACE ACTIVIDADES DE NIVELACION Y LIMPIEZA DEL CANAL DE AGUAS RESIDUALES, PARA LA PREVENIR INUNDACIONES EN LAS PROXIMAS TEMPORADA DE LLUVIAS.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
01/06/20	C. CRUZ ROJA	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE REPOSICION DE UN TRAMO TUBERIA DE PVC DE 12". YA QUE LA LINEA GENERAL SE ENCONTRABA TOTALMENTE ENSOLVADA, EL CUAL PROVOCABA EL PROBLEMA DE INUNDACION CON ALGUNOS VECINOS DE LA CALLE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
02/06/20	C. FCO. I MADERO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE CALA PARA LA CONSTRUCCION DE REGISTRO EN LA C. FCO I MADERO.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
03/06/20	C. FCO. I MADERO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE LA CONSTRUCCION DE REGISTRO EN LA C. FCO I MADERO.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
03/06/20	C. DURANGUITO, COL CENTRO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE TRITURACION CONCRETO, PARA HACER ZANJA DE DRENAJE				




BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
04/06/20	C. DURANGUITO, COL CENTRO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	DANDO CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS EN LA C. DURANGUITO, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE ZANJA PARA LA REPOSICION DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05/06/20	C. DURANGUITO, COL CENTRO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	PARA FINALIZAR LOS TRABAJOS EN LA C. DURANGUITO, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE REPOSICION DE 12 TRAMOS LINEALES DE TUBERIA DE PVC DE 12", Y 3 TRAMOS DE 6" ASU VEZ RELLENAN ZANJA PARA SEGURIDAD DE LOS QUE TRANSITAN POR ESTA CALLE.				

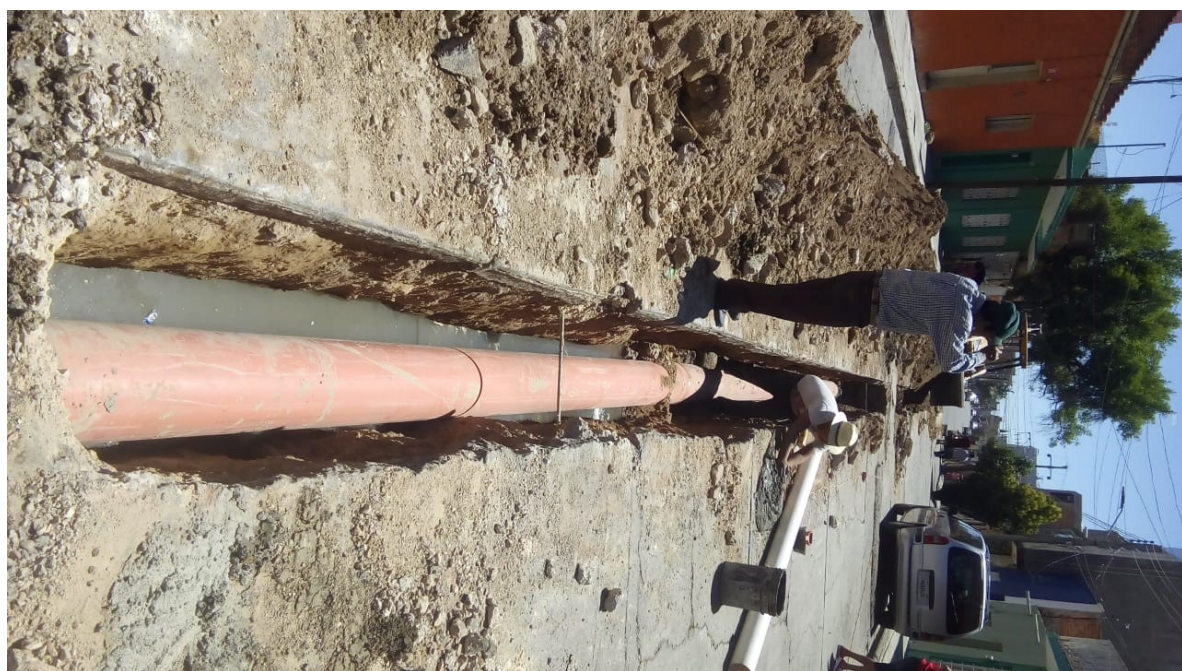

BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05/06/20	C. DURANGUITO, COL CENTRO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	PARA FINALIZAR LOS TRABAJOS EN LA C. DURANGUITO, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE REPOSICION DE 66 METROS LINEALES DE TUBERIA DE PVC DE 12", Y ASU VEZ RELLENAN ZANJA PARA SEGURIDAD DE LOS QUE TRANSITAN POR ESTA CALLE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
08/06/20	GALS	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO CARGA Y ACARREA 5 BULTOS DE CEMENTO Y 10 TRAMOS DE TUBERIA DE 10" PARA DAR CONTINUIDAD A LA OBRA DE CAMBIO DE TUBERIA EN LA COL. LIENZO DEL CHARRO.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
08/06/20	C. BARBIQUEJO, COL. LIENZO CHARRO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE COLOCACION DE 10 TRAMOS DE TUBERIA DE PVC DE 10", EN LA CALLE BARBIQUEJO, DE LA COL. LIENZO CHARRO.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
09/06/20	PRIVADA.SSA, COL FOVISSTE	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DE AGUAS PLUVIALES, ESTO CON LA FINALIDAD DE EVITAR POSIBLES INUNDACIONES EN TEMPORADAS DE LLUVIAS.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
09/06/20	C.FCO JAVIER MINA, COL CENTRO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	DANDO RESPUESTA Y UN MEJOR SERVICIO A LOS QUE TRANSITAN LAS PRINCIPALES VIALIDADES, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE CAMBIO DE TAPADERA DE REGISTRO EN LA C. J. MINA ZONA CENTRO.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
09/06/20	PROLONGACION ZARAGOZA	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	ATENDIENDO LA QUEJA DE VARIOS CIUDADANOS, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, EMPAREJA ZANJA DE DRENAJE CON REVESTIMIENTO, ESTO CON EL OBJETIVO DE EVITAR ACCIDENTES.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10 Y 11/06/20	HUERTAS DE ABAJO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	VELANDO POR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO HACE ACTIVIDADES DE NIVELACION Y LIMPIEZA DEL CANAL DE AGUAS RESIDUALES, PARA LA PREVENIR INUNDACIONES EN LAS PROXIMAS TEMPORADA DE LLUVIAS.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10 Y 11/06/20	HUERTAS DE ABAJO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	VELANDO POR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO HACE ACTIVIDADES DE NIVELACION Y LIMPIEZA DEL CANAL DE AGUAS RESIDUALES, PARA LA PREVENIR INUNDACIONES EN LAS PROXIMAS TEMPORADA DE LLUVIAS.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12/06/20	DEPORTIVA BENITO JUAREZ	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS , EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO HACE REPARACION DE CIMIENTOS DE LA DEPORTIVA BENITO JUAREZ.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12/06/20	GALS Y MAT SAN JOSE	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, CARGA Y ACARREA 2 BULTOS DE CEMENTO, 1KG DE LUBRICANTES Y 9 TRAMOS DE TUBERIA DE PVC DE 12" Y 1 TUBO DE PVC DE 6", PARA DAR CONTINUIDAD A LAS OBRAS DE REPOSICION DE LINEAS GENERALES DE DRENAJE, EN CALLE RECREO.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15/06/20	C. RECREO, COL ESPARZA	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE REPOSICION DE 50 METROS LINEALES DE TUBERIA DE PVC DE 12" DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE DE LA CALLE RECREO EN LA COL OBRERA,				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15/06/20	C. RECREO, COL ESPARZA	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE REPOSCION DE 50 METROS LINEALES DE TUBERIA DE PVC DE 12" DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE DE LA CALLE RECREO EN LA COL OBRERA, Y PARA SEGURIDAD DE LOS VECINOS DE DICHA VIALIDAD SE HACE RELLENO DE ZANJA.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16/06/20	C. PRIVADA GABRIEL LUGO Y C.2DA GABRIEL LUGO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	PARA DAR OTRA IMAGEN A LAS PRINCIPALES VIALIDADES DE LA CIUDAD, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE LIMPIEZA Y PINTA GUARNICIONES DE LA PRIVADA GABRIEL LUGO Y PRIVADA 2DA GABRIEL LUGO, MISMAS QUE SE REHABILITARON CON MATERIAL HIDRAULICO HACE UNOS MESES ATRÁS, CON EL FIN DE BENEFICIAR Y CUMPLIR CON LAS PETICIONES QUE LOS VECINOS DE ESTAS CALLES, HABIAN VENIDO HACIENDO DESDE HACE MAS DE 6 AÑOS.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16/06/20	C. PRIVADA GABRIEL LUGO Y C.2DA GABRIEL LUGO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	PARA CAMBIAR LA IMAGEN A LAS PRINCIPALES VIALIDADES DE LA CIUDAD, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE LIMPIEZA Y PINTA GUARNICIONES DE LA PRIVADA GABRIEL LUGO Y 2DA GABRIEL LUGO, MISMAS QUE SE REHABILITARON CON MATERIAL HIDRAULICO HACE UNOS MESES ATRÁS, CON EL FIN DE BENEFICIAR Y CUMPLIR CON LAS PETICIONES QUE LOS VECINOS DE ESTAS CALLES, HABIAN VENIDO HACIENDO DESDE HACE MAS DE 6 AÑOS.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16/06/20	C, MANGANA, COL. LIENZO CHARRO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	DANDO RESPUESTA A LA PETICION DE LOS VECINOS DE LA CALLE MANGA COL LIENZO CAHARRO, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE ZANJA PARA REPOSICION DE TUBERIA DE DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16/06/20	C.SALTILLO, COL SAN JAVIER	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	SIGUIENDO CON LOS REPORTES CIUDADANOS, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, LIMPIA REGISTRO SATURADO DE PIEDRAS Y BASURA, Y ASU VEZ CABIA TAPADERA, PARA EVITAR TAPONAMIENTOS EN LA LINEA GENERAL DE DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17/06/20	C.CHABACANOS, COL ARBOLEDAS	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	PARA FINALIZAR LOS TRABAJOS DE LA CALLE CHABACANOS, EL 'PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, LIMPIA ESCOMBRO EN DICHA CALLE PARA SEGURIDAD DE LOS QUE TRANSITAN POR ESTE LUGAR.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17/06/20	C. PRIVADA GABRIEL LUGO Y C.2DA GABRIEL LUGO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	DANDO SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE LA PRIVADA GABRIEL LUGO Y 2DA GABRIEL LUGO, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO FINALIZA CON LA REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES.				




BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18/06/20	C, MAMUEL M PONCE, COL EL OLIVAR	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	DANDOLE SEGUIMIENTO AL REPORTE CIUDADNO, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DE AGUAS PLUVIALES, PREVIENDO POSIBLES INUNDACIONES EN LAS PROXIMAS LLUVIAS.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19/06/20	C, MAMUEL M PONCE, COL EL OLIVAR	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	DANDOLE SEGUIMIENTO AL REPORTE CIUDADNO, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO CONTINUA , HACIENDO LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DE AGUAS PLUVIALES, PREVIENDO POSIBLES INUNDACIONES EN LAS PROXIMAS LLUVIAS.				

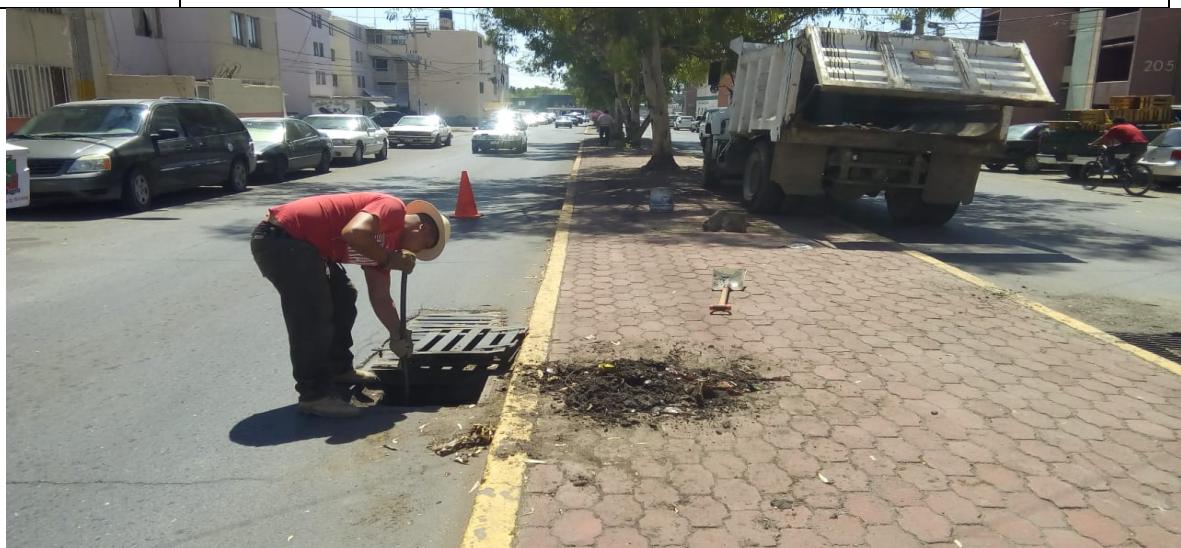

BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19/06/20	FRACC. LAS HACIENDAS	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	DANDO POR TERMINADOS LOS TRABAJOS EN EL CANAL DEL FRACC LAS HACIENDAS EL PERSONA DE MANTENIMIENTO FISICO, LIMPIA ESCOMBRO				




BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19/06/20	CALLE RECREO, COL OBRERA	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, ACUDE A LA CALLE RECREO PARA INICIAR CON EL ACOMODO DEL ADOQUIN DESPUES DE HACER REPOSICION DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22/06/20	C. CHAPULTEPEC	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, ACUDE A LA CALLE CHAPULTEPEC, PARA HACER REPOSICION DE APADERA DE REGISTRO.				

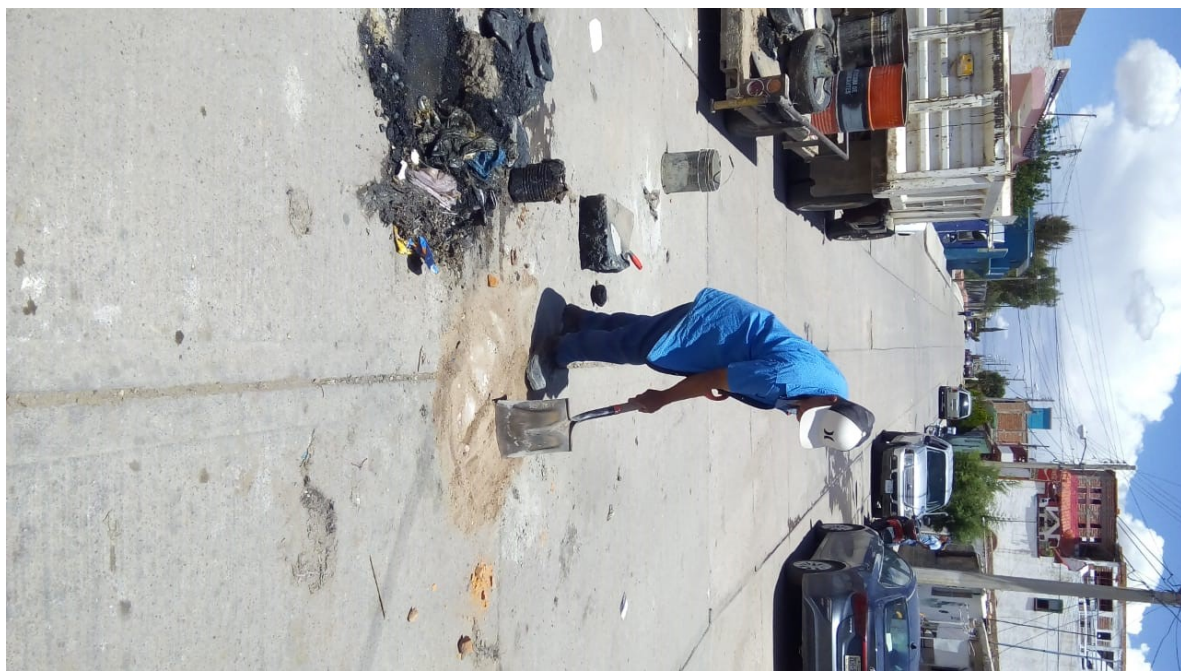

BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22/06/20	CALLE RECREO, COL. OBRERA	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, CONTINUA EN LA CALLE RECREO , CON EL ACOMODO DE ADOQUINES DESPUES DE HACER REPOSICION DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23/06/20	AV ENRIQUE ESTRADA	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, CONTINUA CON LA LIMPIEZA DE REJILLAS DE AGUAS PLUVIALES, CON EL OBJETIVO DE EVITAR POSIBLES INUNDACIONES.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24/06/20	LOMAS DE VALENCIANA	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE REGISTRO EL LA CALLE LOMAS DE VALENCIANA, PARA DAR MANTENIMIENTO A LA LINEA GENERAL DE DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24/06/20	LOMAS DE VALENCIANA	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE REGISTRO EL LA CALLE LOMAS DE VALENCIANA, PARA DAR MANTENIMIENTO A LA LINEA GENERAL DE DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25/06/20	CALLE RECREO, COL. OBRERA	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, CONTINUA EN LA CALLE RECREO , CON EL ACOMODO DE ADOQUINES DESPUES DE HACER REPOSICION DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25/06/20	AV ENRIQUE ESTRADA	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, CONTINUA CON LA LIMPIEZA DE REJILLAS DE AGUAS PLUVIALES, CON EL OBJETIVO DE EVITAR POSIBLES INUNDACIONES.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
03/05/20	I.ZARAGOZA, COL. ESPARZA	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	EL PERSONAL DE MATENIMIENTO FISICO, ACUDE EN DOMINGO A LA C. I. ZARAGOZA PARA HACER TRABAJOS DE SONDEO A BASE DE BARRILLAS DE 57 METROS, PERCATANDOSE QUE LA TUBERIA SE ENCUENTRA DAÑADA, PROGRAMANDOLA EN LOS PROXIMOS DIAS HACER REPOSICION DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE EN DICHA CALLE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
04/05/20	I.ZARAGOZA, COL. ESPARZA	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	DANDO CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS DE LA C. I. ZARAGOZA, COL. ESPARZA, EL PERSONAL DE MATENIMIENTO FISICO, CORTA ZANJA, TRITURA CONCRETO, HACE ZANJA Y CAMBIA 10 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 12", CON ESTO SE CONCLUYE LOS TRABAJOS, DANDO RESPUESTA INMEDIATA A LOS CIUDADANOS QUE SE QUEJABAN CONSTANTEMENTE DEL PROBLEMA INUNDACIONES EN SUS HOGARES				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
04/05/20	I.ZARAGOZA, COL. ESPARZA	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	DANDO CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS DE LA C. I. ZARAGOZA, COL. ESPARZA, EL PERSONAL DE MATENIMIENTO FISICO, CORTA ZANJA, TRITURA CONCRETO, HACE ZANJA Y CAMBIA 10 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 12", CON ESTO SE CONCLUYE LOS TRABAJOS, DANDO RESPUESTA INMEDIATA A LOS CIUDADANOS QUE SE QUEJABAN CONSTANTEMENTE DEL PROBLEMA INUNDACIONES EN SUS HOGARES				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
04/05/20	I.ZARAGOZA, COL. ESPARZA	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	DANDO CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS DE LA C. I. ZARAGOZA, COL. ESPARZA, EL PERSONAL DE MATENIMIENTO FISICO, CORTA ZANJA, TRITURA CONCRETO, HACE ZANJA Y CAMBIA 10 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 12", CON ESTO SE CONCLUYE LOS TRABAJOS, DANDO RESPUESTA INMEDIATA A LOS CIUDADANOS QUE SE QUEJABAN CONSTANTEMENTE DEL PROBLEMA INUNDACIONES EN SUS HOGARES				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05/05/20	I.ZARAGOZA, COL. ESPARZA	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	DANDO CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS DE LA C. I. ZARAGOZA, COL. ESPARZA, EL PERSONAL DE MATENIMIENTO FISICO, CORTA ZANJA, TRITURA CONCRETO, HACE ZANJA Y CAMBIA 10 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 12", CON ESTO SE CONCLUYE LOS TRABAJOS, DANDO RESPUESTA INMEDIATA A LOS CIUDADANOS QUE SE QUEJABAN CONSTANTEMENTE DEL PROBLEMA INUNDACIONES EN SUS HOGARES				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
06/05/20	NEZAHUALCOYOTL, COL. ESPARZA	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	DADA LA GRAVEDAD EN LA C. NEZAHUALCOYOTL DE LA COL. ESPARZA, EL PERSONAL DE MATENIMIENTO FISICO, ACUDE DE MANERA INMEDIATA PARA HACER SONDEO A BASE DE BARILLAS DE 25 METROS SOLUCIONANDO EL PROBLEMA QUE AFECTABA A LOS VECINOS DE ESTA CALLE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
06/05/20	ARTICULO 123, COL CENTRO	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	ATENDIENDO A LA SOLICITUD DE LA MADRE GABRIELA, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO ACUDE A LA C. ARTICULO 123 DE LA ZONA CENTRO PARA REVISAR LA LINEA GENERAL.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
07/05/20	LOCALIDAD: ESTACION SAN JOSE	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	LUEGO DE RECIBIR VARIOS REPORTES TELEFONICOS, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, ATIENDE A LA SOLICITUD DE LA CALLE GARCIAS SALINAS DE LA COMUNIDAD ESTACION SAN JOSE, PARA DESTAPAR LA LINEA GENERAL, YA QUE SE ENCONTRABA SATURADA DE BASURA, DEBIDO A ESTO SE HIZO LIMPIEZA DE REGISTROS Y SONDEO DE 32 M A BASE DE BARILLAS.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
07/05/20	LOCALIDAD: ESTACION SAN JOSE	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	LUEGO DE RECIBIR VARIOS REPORTES TELEFONICOS, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, ATIENDE A LA SOLICITUD DE LA CALLE GARCIAS SALINAS DE LA COMUNIDAD ESTACION SAN JOSE, PARA DESTAPAR LA LINEA GENERAL, YA QUE SE ENCONTRABA SATURADA DE BASURA, DEBIDO A ESTO SE HIZO LIMPIEZA DE REGISTROS Y SONDEO DE 32 M A BASE DE BARILLAS.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
08/05/20	C.REFORMA, COL , CENTRO	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, ACUDE DE MANERA INMEDIATA A LA SOLICITUD DEL TIRADERO DE AGUAS RESIDUALES REPORTADO EN LA CALLE REFORMA # 207 DE LA ZONA CENTRO , YA QUE SE ENCONTRABA SATURADA DE BASURA, DEBIDO A ESTO SE SONDEA A BASE DE BARILLAS PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA, QUE AFECTABA A BARIOS COMERCIOS DE ESTA ZONA.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
08/05/20	RASTRO TIF	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, UNA VEZ MAS ACUDE A LAS INSTALACIONES DEL RASTRO TIF, A DAR MANTENIMIENTO A LA LINEA GENERAL DEL INTERIOR Y EXTERIOR DE ESTE SITIO , REALIZANDO SONDEO DE 60 M A BASE DE BARILLAS.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
09/05/20	MANUEL AVILA CAMACHO, FCO VILLA	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, ACUDE EN DIA SABADO A LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, A DAR SOLUCION AL DERRAME DE AGUAS NEGRAS, HACIENDO SONDEO A BASE DE BARILLAS, YA QUE LA LINEA GENERAL SE ENCONTRABA LLENA DE NIJALLOTE DE LA TORTILLERIA DE DICHA CALLE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
09/05/20	C, MECANICOS, COL. SAN JOAQUIN	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	CUMPLIENDO A LA CIUDADANIA, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, ACUDE EL DIA SABADIO A LA COL, SAN JOAQUIN, PARA DAR MANTENIMIENTO A LA LINEA GENERAL DE DRENAJE, YA QUE SE ENCOTRABA LLENA DE BASURA FRENTE AL DOMICILIO # 15 EL CUAL AFECTABA A VARIOS VECINOS DE LA C. MECANICOS.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
09/05/20	C. FUNDA Y BARBIQUEJO, COL LIENZO CHARROI	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	PARA FINALIZAR LA JORNADA DEL SABADO 9 DE MAYO. EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO HACE SONDEO A BASE DE BARILLAS Y CON LA MAQUINA DESASOLVADORA (BACALL), PARA SOLUCIONAR EL TAPONAMIENTO DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE, QUE AFECTABA A VARIOS DOMICILIOS DE LA C. FUNDA Y BARBIQUEJO.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
09/05/20	C. FUNDA Y BARBIQUEJO, COL LIENZO CHARROI	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	PARA FINALIZAR LA JORNADA DEL SABADO 9 DE MAYO. EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO HACE SONDEO A BASE DE BARILLAS Y CON LA MAQUINA DESASOLVADORA (BACALL), PARA SOLUCIONAR EL TAPONAMIENTO DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE, QUE AFECTABA A VARIOS DOMICILIOS DE LA C. FUNDA Y BARBIQUEJO.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11/05/20	EDIFICIO 1, EL OLIVAR	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	DANDO SOLUCION AL REPORTE CIUDADANO, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, LIMPIA REGISTRO Y HACE SONDEO A BASE DE BARILLAS, SOLUCIONADO EL PROBLEMA EN SU TOTALIDAD.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12/05/20	C. 2 DE ABRIL Y MOCTEZUMA , COL.BARRIO ALTO	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	DESPUES DE SONDEAR LA LINEA GENERAL DE DRENAJE DE LA C. 2 DE ABRIL, DE TOMA LA DETERMINACION DE: HACER REPOSICION DE 4 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 12", ESTO CON LA FINALIDAD DE DAR RESPUESTA A LA DENUNCIA DE LOS VECINOS DE ESTAS CALLES.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12/05/20	C. 2 DE ABRIL Y MOCTEZUMA , COL.BARRIO ALTO	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	DESPUES DE SONDEAR LA LINEA GENERAL DE DRENAJE DE LA C. 2 DE ABRIL, DE TOMA LA DETERMINACION DE: HACER REPOSICION DE 4 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 12", ESTO CON LA FINALIDAD DE DAR RESPUESTA A LA DENUNCIA DE LOS VECINOS DE ESTAS CALLES.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13/05/20	C. IGNACIO COMOFORT, BARRIO ALTO	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	ATENDIENDO A LAS INDICACIONES DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE MATENIMIENTO FISICO, LA CUADRILLA DE ESTA AREA, ACUDE DE MANERA INMEDIATA A REALIZAR LIMPIEZA DE REGISTROS ENSOLVADOS Y A SU VEZ SONDEO A BASE DE BARILLAS PARA LIMPIAR LA LINEA DE DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13/05/20	PUENTE A UN COSTADO DE LIVERPOOL	DRENAJES	DRENAJES BACHEO	216 251	100
NOTA	ATENDIENDO POR TERCERA VEZ, ESTE REPORTE DE LA CIUDADANIA, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE SONDEO DE 50 METROS A BASE DE BARILLAS, PARA DESTAPAR LA LINEA GENERAL DE DRENAJE LA CUAL SE ENCONTRABA LLENA DE BASURA.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14/05/20	C. MOCTEZUMA Y 2 DE ABRIL	DRENAJES	DRENAJES BACHEO	216 251	100
NOTA	DANDO SEGUIMIENTO AL PROBLEMA DE C. 2 DE ABRIL EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE CORTE DE ZANJA Y TRITURA CONCRETO PARA DAR PASO AL CAMBIO DE TUBERIA DE 78 M LINEALES DE TUBO DE PVC DE 12"				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14/05/20	C. MOCTEZUMA Y 2 DE ABRIL	DRENAJES	DRENAJES BACHEO	216 251	100
NOTA	DANDO SEGUIMIENTO AL PROBLEMA DE C. 2 DE ABRIL EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE CORTE DE ZANJA Y TRITURA CONCRETO PARA DAR PASO AL CAMBIO DE TUBERIA DE 78 M LINEALES DE TUBO DE PVC DE 12"				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15/05/20	C. 2 DE ABRIL Y MOCTEZUMA	DRENAJES	BACHEO DENAJEROS	251 216	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, INICIA CON LOS TRABAJOS PARA CAMBIO DE TUBERIA EN LA C. 2 DE ABRIL, ABRIENDO 78 METROS LINEALES PARA ZANJA DE DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18/05/20	CALZADA DEL DEPORTE, COL EMILIANO ZAPATA	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	PARA UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE SONDEO CON BARILLAS Y MAQUINA DESASOLVADORA (BACALL), YA QUE LA LINEA DE DRENAJE SE ENCONTRABA SATURADA DE BASURA.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18/05/20	DOROTEO ARANGO, FCO. VILLA	DRENAJES	BACHEO DENAJEROS	251	100
NOTA	ATENDIENDO EL LLAMADO CIUDADANO DE INUNDACION EN ALGUNOS DOMICILIOS , LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE SONDEO A BASE DE BARILLAS PARA DESTAPAR LA LINEA GENERAL DE DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18/05/20	DOROTEO ARANGO, FCO. VILLA	DRENAJES	BACHEO DENAJEROS	251	100
NOTA	ATENDIENDO EL LLAMADO CIUDADANO DE INUNDACION EN ALGUNOS DOMICILIOS , LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE SONDEO A BASE DE BARILLAS PARA DESTAPAR LA LINEA GENERAL DE DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19/05/20	C. MECANICOS, COL SAN JOAQUIN	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	ATENDIENDO AL LLAMADO CIUDADANO, DEL TIRADERO DE AGUAS RESIDUALES EN LA C. MECANICOS, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, LLEVA A CABO REVISION DE LA LINEA DE DRENAJE, SONDEANDO 42 M A BASE DE BARILLAS, PERCATANDOSE QUE EL PROBLEMA VIENE DE UNA TOMA PARTICULAR, QUE IMPIDE EL PASO DE LAS AGUAS NEGRAS A LA LINEA GENERAL.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19/05/20	C. MECANICOS, COL SAN JOAQUIN	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	ATENDIENDO AL LLAMADO CIUDADANO, DEL TIRADERO DE AGUAS RESIDUALES EN LA C. MECANICOS, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, LLEVA A CABO REVISION DE LA LINEA DE DRENAJE, SONDEANDO 42 M A BASE DE BARILLAS, PERCATANDOSE QUE EL PROBLEMA VIENE DE UNA TOMA PARTICULAR, QUE IMPIDE EL PASO DE LAS AGUAS NEGRAS A LA LINEA GENERAL.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20/05/20	C.PASAJE CALEZA, COL. MINERA	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	ATENDIENDO AL LLAMADO CIUDADANO, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, SONDEA 28 M A BASE DE BARILLAS, PARA DESTAPAR LA LINEA GENERAL DE DRENAJE YA QUE SE ENCOTRO SATURADO DE S FECALES DE ANIMALES (PERROS), Y ESTO PROVOCABA EL PROBLEMA DEL CUAL LOS VECINOS REPORTABAN.				





BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
21/05/20	C.MARAVILLAS, COL. LAS FLORES	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE SONDEO A BASE DE BARILLAS Y LIMPIEZA DE REGISTROS SATURADOS DE ESCREMENTO Y PAPEL HIGIENICO, YA QUE ESTO PROVOCABA EL TAPONAMIENTO DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE, AFECTANDO A VARIOS VECINOS DE ESTA CALLE.				




BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
21/05/20	C. SAN JOSE OBRERO	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	ATENDIENDIENDO AL LLAMADO DE LOS VECINOS DE LA C, SAN JOSE OBRERO, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE SONDEO DE 62 M A BASE DE BARILLAS DEBIDO A QUE LA LINEA SE ENCUENTRA ENSOLVADA EN UN 80%,				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
21/05/20	C. SAN JOSE OBRERO	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	SIGUIENDO LA PROGRAMACION DE LOS REPORTES DE LA CIUDADANIA, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, HACEN DOBLE SERVICIO EN LA C. SAN JOSE OBRERO, SONSEAN A BASE DE BARILLAS UNA LINEA PARTICULAR Y DESASOLVE A LA LINEA GENERAL DE DRENAJE CON EL BACALL, ESTO CON LA FINALIDAD DE DAR REPUESTA INMEDIATA A LOS CADA UNA DE LAS DENUNCIAS QUE NOS LLEGAN DIARIAMENTE.				

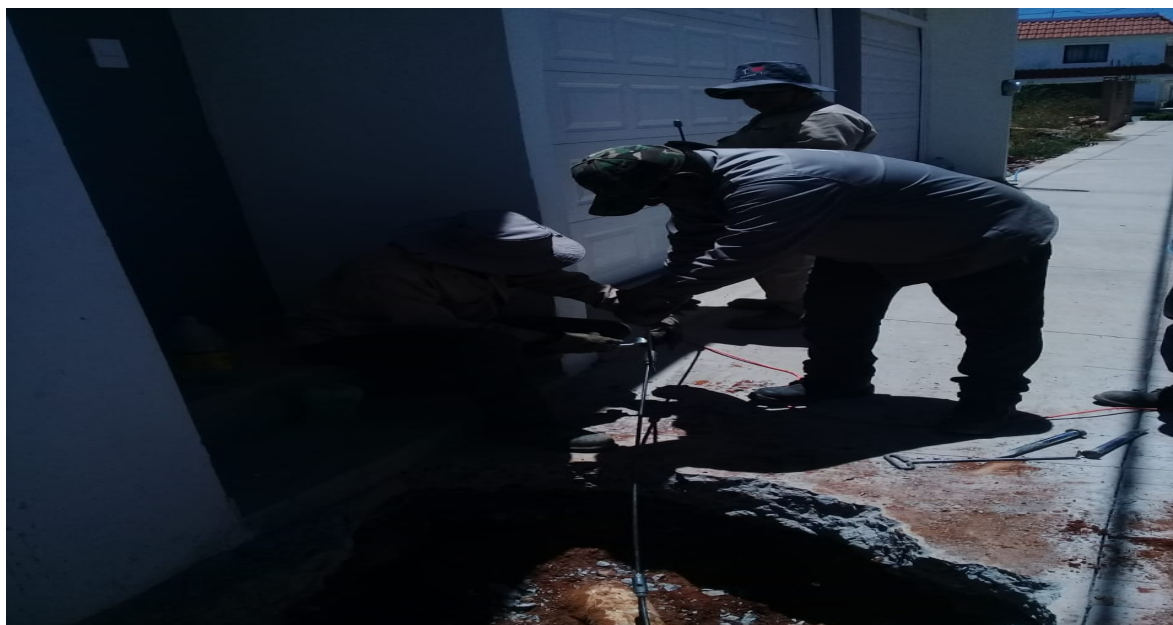

BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25/05/20	C. PUERTO RICI COL LADS AMERICAS	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE SONDEO DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE, DE 32 M A BASE DE BARILLAS EN LA C. PUERO RICO PARA EL DESASOLVE DE LA LINEA.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25/05/20	CALLEJON SANTA CLARA	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE LIMPIEZA Y SONDEA A BASE DE BARILLAS, DEBIDO AL TAPONAMIENTO DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE, OCASIONADO POR LA GRAN CANTIDAD DE BASURA QUE OBSTRUIA EL PASO DE AGUAS RESIDUALES.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26/05/20	AQUILES SERDAN, COL. CENTRO	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE SONDE A BASE DE BARILLAS EN LA LINEA CENTRAL DE DRENAJE, Y A SI DAR FIN AL TAPONAMIENTO QUE AFECTA A VARIOS VECINOS DE ESTA CUADRA.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26/05/20	AQUILES SERDAN, COL. LAGUNILLA	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE SONDE A BASE DE BARILLAS EN LA LINEA CENTRAL DE DRENAJE, Y A SI DAR FIN AL TAPONAMIENTO QUE AFECTA A VARIOS VECINOS DE ESTA CUADRA.				




BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26/05/20	AQUILES SERDAN, COL. LAGUNILLA	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE SONDE A BASE DE BARILLAS EN LA LINEA CENTRAL DE DRENAJE, Y A SI DAR FIN AL TAPONAMIENTO QUE AFECTA A VARIOS VECINOS DE ESTA CUADRA.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
27/05/20	C. LIMONES, COL ARBOLEDAS	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, DE MANERA INMEDIATA ACUDE AL TIRADERO DE AGUAS NEGRAS REPORTADO POR LOS VECINOS DE LA C. LIMONES, PARA REALIZAR SONDEO Y LIMPIEZA DE REGISTROS, DANDO SOLUCION AL PROBLEMA QUE AFECTABA ESTA CALLE.				

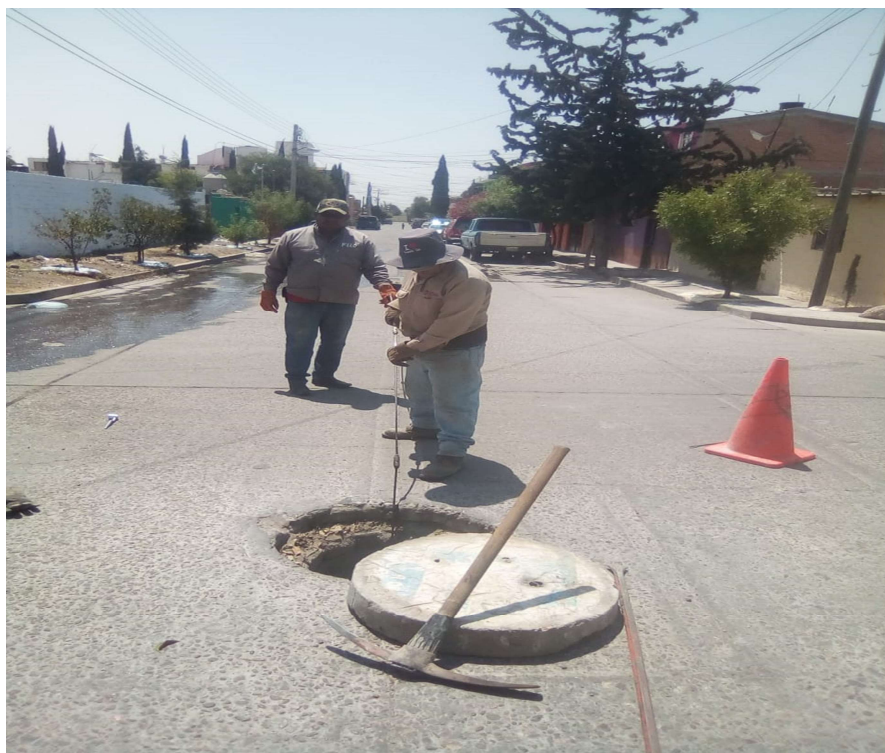

BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
27/05/20	C. PLUTARCO ELIAS CALLE	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	DEBIDO AL TAPONAMIENTO POR DESECHOS (BASURA), LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE TRABAJOS DE LIMPIEZA A BASE DE BARILLAS, DANDO DE MANERA INMEDIATA, AL REPORTE CIUDADANO.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28/05/20	C. LOZA, COL. OBRERA	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	ATENDIENDO A UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CON DOMILIO EL LA CALLE LOZA DE LA COL OBRERA, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, ACUDE DE MANERA INMEDIATA REALIZANDO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE REGISTRO Y SONDEO DE SU LINEA PARTICULAR.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
01/06/20	C. CRUZ ROJA	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE REPOSICION DE UN TRAMO TUBERIA DE PVC DE 12". YA QUE LA LINEA GENERAL SE ENCONTRABA TOTALMENTE ENSOLVADA, EL CUAL PROVOCABA EL PROBLEMA DE INUNDACION CON ALGUNOS VECINOS DE LA CALLE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
02/06/20	C. FCO. I MADERO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE CALA PARA LA CONSTRUCCION DE REGISTRO EN LA C. FCO I MADERO.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
03/06/20	C. FCO. I MADERO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE LA CONSTRUCCION DE REGISTRO EN LA C. FCO I MADERO.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
03/06/20	C. DURANGUITO, COL CENTRO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE TRITURACION CONCRETO, PARA HACER ZANJA DE DRENAJE				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
04/06/20	C. DURANGUITO, COL CENTRO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	DANDO CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS EN LA C. DURANGUITO, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE ZANJA PARA LA REPOSICION DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05/06/20	C. DURANGUITO, COL CENTRO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	PARA FINALIZAR LOS TRABAJOS EN LA C. DURANGUITO, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE REPOSICION DE 66 METROS LINEALES DE TUBERIA DE PVC DE 12", Y ASU VEZ RELLENAN ZANJA PARA SEGURIDAD DE LOS QUE TRANSITAN POR ESTA CALLE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05/06/20	C. DURANGUITO, COL CENTRO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	PARA FINALIZAR LOS TRABAJOS EN LA C. DURANGUITO, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE REPOSICION DE 66 METROS LINEALES DE TUBERIA DE PVC DE 12", Y ASU VEZ RELLENAN ZANJA PARA SEGURIDAD DE LOS QUE TRANSITAN POR ESTA CALLE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
08/06/20	PRIVADA E. ZAPATA, S. LAGUNILLA	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	ATENDIENDO LAS QUEJAS CIUDADANAS, LA CUADRILLA DE MATENIMIENTO FISICO, HACE LIMPIEZA DE REGISTROS Y SONDEO A BASE DE BARILLAS PARA DESTAPAR LA LINEA GENERAL DE DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
09/06/20	COMUNIDAD CARRILLO	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	ATENDIENDO LAS QUEJAS CIUDADANAS, LA CUADRILLA DE MATENIMIENTO FISICO, HACE LIMPIEZA DE REGISTROS Y SONDEO A BASE DE BARILLAS EN LA COMUNIDAD DE CARRILLO YA QUE LA LINEA ESTA DEMACIADO ENSOLVADA.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
09/06/20	COMUNIDAD CARRILLO	DRENAJES	DENAJEROS	254	100
NOTA	ATENDIENDO LAS QUEJAS CIUDADANAS, LA CUADRILLA DE MATENIMIENTO FISICO BARILLEROS Y BACALL SUMAN ESFUERZO PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD DE CARRILLO HACIENDO DESASOLVE DE LINEA GENERAL DE DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
09/06/20	COMUNIDAD CARRILLO	DRENAJES	DENAJEROS	254	100
NOTA	ATENDIENDO LAS QUEJAS CIUDADANAS, LA CUADRILLA DE MATENIMIENTO FISICO BARILLEROS Y BACALL SUMAN ESFUERZO PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD DE CARRILLO HACIENDO DESASOLVE DE LINEA GENERAL DE DRENAJE Y LIMPIEZA DE 8 REGISTROS.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10/06/20	RASTRO TIF	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MATENIMIENTO FISICO, LLEVA ACACABO EL MANTENIMIENTO DE LA LINEA INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS ISNTALACIONES DEL RASTRO TIF, SONDEANDO 52 A BASE DE BARILLAS.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10/06/20	2DA PRIVA EMILIANO ZAPATA , COL. BENITO JUAREZ	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	ATENDIENDO LAS QUEJAS CIUDADANAS, LA CUADRILLA DE MATENIMIENTO FISICO, HACE LIMPIEZA DE REGISTROS Y SONDEO A BASE DE BARILLAS EN LA COL BENITO JUAREZ.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11/06/20	MODULO 30 COL. INDECO	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	ATENDIENDO LAS QUEJAS CIUDADANAS, LA CUADRILLA DE MATENIMIENTO FISICO, SONDEA A BASE DE BARILLAS PARA DESTAPAR LINEA GENERAL DE DRENAJE				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
01/04/20	EDIFICIO 307, EL OLIVAR	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	EN ATENCION A LA DENUNCIA CIUDADANA, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE SONDEO DE 48 M CON BARILLAS PARA DESTAPAR Y SOLUCIONAR EL TIRADERO DE AGUAS NEGRAS DERRAMADAS POR LA CALLE				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
01/04/20	C.DANIEL PERALTA Y OAXACA, COL INDUSTRIAL	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	EN ATENCION AL REPORTE CIUDADANO, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE SONDEO DE 38 M CON BARILLAS Y A SU VEZ SE HACE LIMPIEZA DE POZOS DE VISITA, DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE TIERRA Y BASURA.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
02/04/20	C. MOCTEZUMA Y 2 DE ABRIL	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE DE LA C. MOCTEZUMA ESQUINA CON 2 DE ABRIL, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE EXCAVACION DE DE 1.40 M DE PROFUNDIDAD, 80 CM DE ANCHO Y 1.20 M DE LARGO, Y DE ESTA MANERA SONDEAR 73 M A BASE DE BARILLAS PARA DARLE SOLUCION AL PROBLEMA.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
02/04/20	SALIDA A JEREZ	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE UNA EXCAVACION PARA ZANJA DE DRENAJE, PARA CAMBIO DE 3 TRAMOS DE TUBERIA DE PVC DE 12"				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
02/04/20	C. SIERRA DE VALDECAÑAS, COL LOMAS DE PLATEROS	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	ATENDIENDO A LA SOLICITUD DE LOS VECINOS DE LA C. SIERRA DE VALDECAÑAS, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, LLEVA ACABO LA DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO, PARA DAR PASO AL CAMBIO DE TUBERIA.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
02/04/20	C. SIERRA DE VALDECAÑAS, COL LOMAS DE PLATEROS	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	PARA DAR CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERIA EN LA C. SIERRA DE VALDECAÑAS, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE EXCAVACION DE ZANJA DE 65 METROS LINEALES.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
03/04/20	C. SIERRA DE VALDECAÑAS, COL LOMAS DE PLATEROS	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	DANDO RESPUESTA INMEDIATA EN 2 DIAS, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE CAMBIO DE 60 METROS LINEALES DE TUBERIA DE PVC DE 12" EN LA C. SIERRA DE VALDECAÑAS. YA QUE DESDE HACE 40 AÑOS TENIAN EL PROBLEMA DE INUNDACION DE EN SUS DOMICILIOS				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
07/04/20	C.VICTORIANO ZAMORA Y MARIANO ARISTAS, COL. GONZALEZ ORTEGA	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	ATENDIENDO AL REPORTE CIUDADANO LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO ACUDE A LA COL. GONZALEZ ORTEGA, PARA HACER SONDEO DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE DE 42 M A BASE DE BARILLAS YA QUE LA LINEA SE ENCONTRABA TAPADA DE BASURA,				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
08/04/20	COMUNIDAD: PROVIDENCIA DE RIVERA	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	ATENDIENDO AL REPORTE CIUDANANO LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO ACUDE A LA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA DE RIVERA , PARA HACER SONDEO DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE DE 51 M A BASE DE BARILLAS YA QUE LA LINEA ESTABA LLENA DE GRASA ,				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11/04/20	EDIFICIO 6, EL OLIVAR	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	EN ATENCION A LA DENUNCIA CIUDANANA, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE SONDEO DE 72 M LINEALES A BASE DE BARILLAS, YA QUE EL PROBLEMA QUE SE PRESENTABA YA AFECTABA A 3 EDIFICIOS, A LOS CUALES SE LES ATENDIO DE MANERA OPORTUNA, EVITANDO EL DERRAME POR LAS CALLES DE AGUAS NEGRAS Y POSIBLES INUNDACIONES DENTRO DE SUS DOMICILIOS.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13/04/20	C. CHIHUAHUA, COL. CENTRO	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	ATENDIENDO LOS REPORTES COTIDIANOS DE LA CIUDADANIA EN GENERAL , LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE SONDEO DE 48 M LINEALES A BASE DE BARILLAS, PARA DESTAPAR LA LINEA GENERAL DE DRENAJE, DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE GRASA Y BASURA QUE EN ELLA SE ENCOTRABA.				




BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13/04/20	C. PEDRO RUIZ GONZALEZ, COL. VENUSTIANO CARRANZA	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	ATENDIENDO AL REPORTE Y SOLICITUD DE LOS VECINOS DE LA C. PEDRO RUIZ GONZALEZ , LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACEN TRABAJOS DE DEMOLICION DE CONCRETO, PARA CAMBIO DE TUBERIA.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13/04/20	CALLEJON SOBRETERETE, COL.CENTRO	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	ATENDIENDO AL REPORTE CIUDADANO, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE SONDEO DE 27 M DE LA LINE GENERAL DE DRENAJE CON BARILLAS, LIMPIA REGISTROS, YA QUE SE ENCONTRABAN ENSOLVADOS DE BASURA, GRASA Y TPAOS VIEJOS.				

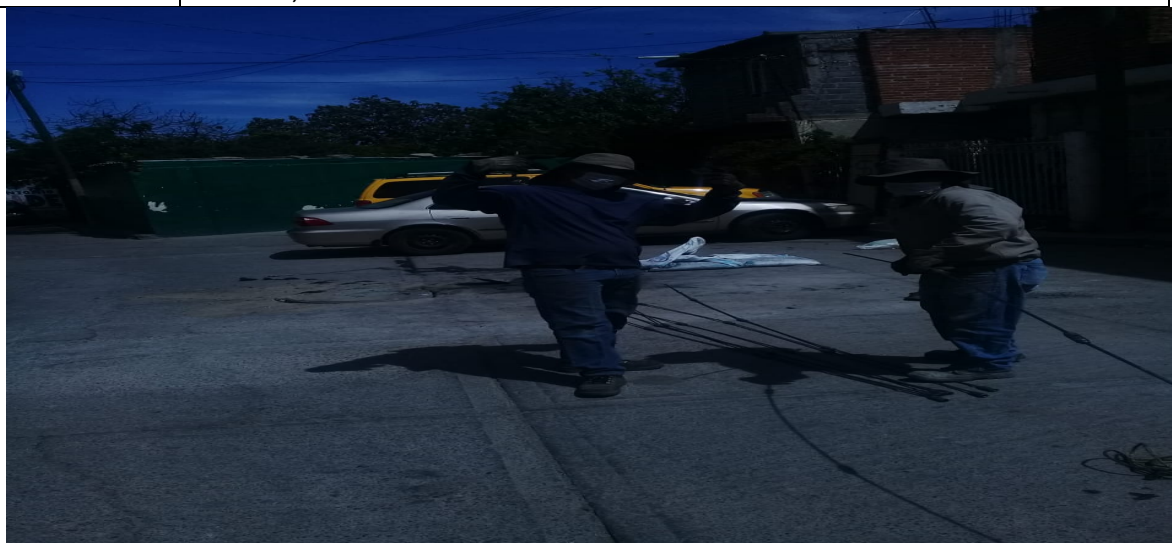

BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15/04/20	C.TECNOLOGICA, COL. SOLIDARIDAD	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	SE RECIBE EL REPORTE POR PARTE DE LA CIUDADANIA, EN EL CUAL NOS INFORMAN QUE HAY UN TIRADERO MUY FUERTE DE DRENAJE POR LA CALLE, ACUDIENDO DE MANERA INMEDIATA LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACIENDO SONDEO DE 62 M DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE CON BARILLAS, YA QUE LA TUBERIA SE ENCONTRABA ENSOLVADA DE DESECHOS, (BASURA, PAÑALES, TIERRA).				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16/04/20	C. BELIZARIO DOMINGUEZ, COL. CENTRO	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	PARA UNA MEJOR ATENCION A LOS PROBLEMAS DE DRENAJES, QUE AÑOS ANTERIORES NO SE LES DIO MANTENIMIENTO, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO; HACE COLOCACION DE 50 METROS LINEALES DE TUBERIA DE PVC DE 12", Y ASI ARANCAR EL PROBLEMA DE RAIZ.				





BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
DEL 3 AL 16 DE ABRIL	VARIOS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE BACHEO, SE ENCUENTRA INTEGRADA EN APOYO A LA CUADRILLA DE DRENAJEROS, DEVIDO A LA CONTINGENCIA Y FALTA DE MATERIAL ASFALTICO E HIDRAULICO, POR TANTO NO HAY ACTIVIDAD DE BACHEO. Y ASU VEZ EL CAMION DE DESASOLVE (BACALL) SE ENCUENTRA EN MATENIMIENTO EN EL TALLER DEL MUNICIPIO.				

BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20/04/20	C. TECNOLOGICA, COL. SOLIDARIDAD	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	PARA SOLUCIONAR EL PRBLEMA DE DRENAJE DE LA C, TECNOLOGICA LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, REALIZA ACTIVIDADES DE CORTE Y EXCAVACION DE ZANJA DE 4 METROS DE LARGO, .94 CM DE LA ANCHO Y 1.60 DE PROFUNDIDAD, ASI COMO RELLENO DE LA MISMA.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20/04/20	C. TECNOLOGICA, COL. SOLIDARIDAD	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	PARA SOLUCIONAR EL PRBLEMA DE DRENAJE DE LA C, TECNOLOGICA LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, REALIZA ACTIVIDADES DE CORTE Y EXCAVACION DE ZANJA DE 4 METROS DE LARGO, .94 CM DE LA ANCHO Y 1.60 DE PROFUNDIDAD, ASI COMO RELLENO DE LA MISMA.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20/04/20	C. PUERTO RICO Y GABRIEL LUGO, COL. LAS AMERICAS	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	EN ATENCION A LA CIUDADANIA, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE SONDEO DE 50 METROS A BASE DE BARILLAS, DE LA LINEA GENERAL DEL DRENAJE Y DE UNA TOMA PARTICULAR.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20/04/20	C. PUERTO RICO Y GABRIEL LUGO, COL. LAS AMERICAS	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	EN ATENCION A LA CIUDADANIA, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE SONDEO DE 50 METROS A BASE DE BARILLAS, DE LA LINEA GENERAL DEL DRENAJE Y DE UNA TOMA PARTICULAR.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
21/04/20	EDIFICIO 24 COL, EL OLIVAR	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	EN ATENCION AL REPORTE CIUDADNO, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, DE MANERA INMEDIATA; HACE SONDEO DE 24 M A BASE DE BARILLAS EN EL EDIFICIO 24, ESTO CON EL FIN DE BRINDARLE ATENCION A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
21/04/20	INDEPENDENCIA, COL FACO VILLA	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	PARA UNA MEJOR ATENCION A LOS PROBLEMAS DE DRENAJES, LA CUADRILLA DE ANTENIMIENTO FISICO; HACE SONDEO CON BARILLAS DE 22 METROS PARA DESTAPAR EL DREAJAJE YA QUE SE ENCONTRABA LLENO DE TRAPOS VIEJOS				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22/04/20	SAMUEL QUIÑONES, COL. EMILIANO ZAPATA	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	DANDO SEGUIMIENTO A LA DENUNCIA DE LA CALLE SAMUEL QUIÑONES Y KGM, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE ZANJA PARA LA REPOSICION DE 24 M DE TUBERIA DE PVC DE 12" DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22/04/20	SAMUEL QUIÑONES, COL. EMILIANO ZAPATA	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	DANDO SEGUIMIENTO A LA DENUNCIA DE LA CALLE SAMUEL QUIÑONES Y KGM, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE ZANJA PARA LA REPOSICION DE 24 M DE TUBERIA DE PVC DE 12" DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23/04/20	LATERAL AV. PLATEROS	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MATENIMIENTO FISICO, ATIENDE DE MANERA INMEDIATA EL REPORTE DE TIRADERO DE AGUAS NEGRAS EN LA LATERAL DE LA AV. PLAREROS, PARA HACER SONDEO CON BARILLAS DE 52 METROS PARA DESTAPAR Y SOLUCIONAR EL TIRADERO QUE AFECTA A LOS QUE TRANSITAN POR ESTE LUGAR.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23/04/20	C. FCO VILLA COL EMILIANO ZAPATA	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MATENIMIENTO FISICO, ATIENDE UN REPORTE MAS DE TAPONAMIENTO DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE, SONDEANDO A BASE DE BARILLAS DE 38 M, PARA DAR LA SOLUCION DE MANERA INMEDIATA A LOS VECINOS DE LA CALLE FCO VILLA				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23/04/20	C.SAN LORENZO, COL. INDUSTRIAL	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MATENIMIENTO FISICO, ACUDE A LA C. SAN LORENZO DE LA COL INDUSTRIAL, SONDEANDO LA LINEA GENERAL Y LLEGANDO A LA CONCLUSION QUE ES NECESRIA EL CAMBIO DE 10 METROS DE TUBERIA YA QUE EL EXISTENTE, ESTA FRACTURADO Y ESTO PROVOCA EL TAPONAMIENTO DEL DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24/04/20	C.SAN LORENZO, COL. INDUSTRIAL	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	DANDO SEGUIMIENTO A LA DENUNCIA DE C. SAN LORENZO, LA CUADRILLA DE MATENIMIENTO FISICO, CORTA ZANJA, Y TRITURA CONCRETO PARA HACER REPOSICION DE 6 M DE TUBO DE PVC DE 12".				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24/04/20	C.SAN LORENZO, COL. INDUSTRIAL	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	DANDO SEGUIMIENTO A LA DENUNCIA DE C. SAN LORENZO, LA CUADRILLA DE MATENIMIENTO FISICO, CORTA ZANJA, Y TRITURA CONCRETO PARA HACER REPOSICION DE 6 M DE TUBO DE PVC DE 12".				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
27/04/20	COMUNIDAD DE PLATEROS	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	ATENDIENDO LAS DENUNCIAS NO SOLO EN LA CIUDAD, LA CUADRILLA DE MATENIMIENTO FISICO, ACUDE A LA COMUNIDAD DE PLATEROS. PARA SOLUCIONAR EL PRBLEMA DE DRENAJE QUE AFECTA A LOS COMERCIANTES DE ESTE LUGAR, POR EL CUAL SE HACEN 2 CALAS A BASE DE PICO Y PALA, PARA SONDEAR 44 M A BASE DE BARILLAS Y DAR SOLUCION AL PROBLEMA.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28/04/20	COMUNIDAD DE PLATEROS	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	ATENDIENDO LAS DENUNCIAS NO SOLO EN LA CIUDAD, LA CUADRILLA DE MATENIMIENTO FISICO, ACUDE A LA COMUNIDAD DE PLATEROS. PARA SOLUCIONAR EL PRBLEMA DE DRENAJE QUE AFECTA A LOS COMERCIANTES DE ESTE LUGAR, POR EL CUAL SE HACEN 2 CALAS A BASE DE PICO Y PALA, PARA SONDEAR 44 M A BASE DE BARILLAS Y DAR SOLUCION AL PROBLEMA.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28/04/20	C. VETA LA ESPERANZA, COL MINERA	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	ATENDIENDO AL LLAMDO DE LA CIUDADANIA, LA CUADRILLA DE MATENIMIENTO FISICO, SONDEA A BASE DE BARRILLAS Y AL NO LOGRAR DESTAPAR LA LINEA GENERAL, OPTARON POR HACER UNA ZANJA Y ASI PODER SOLUCIONAR EL PROBLEMA, PERCATANDOSE QUE EL PROBLEMA VENIA DE UNA TOMA PARTICULAR QUE EN SU MOMENTO NO FUE CONECTADA, LO CUAL PROVOCABA EL PROBLEMA CON MAS VECINOS, SE HACEN LAS CONECCIONES CORRESPONDIENTES A LA LINEA DE DRENAJE, DEJANDO EL PROBLEMA RESUELTO.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28/04/20	C.VIGA, COL OBRERA	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	ATENDIENDO AL LLAMADO CIUDADANO, LA CUADRILLA DE MATENIMIENTO FISICO, ACUDE A LA C. VIGA, PARA DAR SOLUCION AL REPORTE DE TAPONAMIENTO DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE, SONDEANDO 37 M LINEALES A BASE DE BARILLAS, DANDO RESPUESTA A DICHA PETICION.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
29/04/20	C.2DA DE OAXACA	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	DANDO SEGUIMIENTO A LAS INDICACIONES DE ATENDER A LOS CIUDADNOS, LA CUADRILLA DE MATENIMIENTO FISICO, ACUDE A LA COL INDUSTRIAL PARA REVISAR LA LINEA GENERAL SONDEANDO 45 M CON BARILLAS				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
29/04/20	C.NIÑO ARTILLERO	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	DANDO SEGUIMIENTO A LAS INDICACIONES DE ATENDER A LOS CIUDADNOS, LA CUADRILLA DE MATENIMIENTO FISICO, ACUDE A LA COL INDUFSTRIAL PARA REVISAR LA LINEA GENERAL SONDEANDO 34 M CON BARILLAS				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
29/04/20	C.MAGNESIO, COL REAL DE FRESNILLO	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MATENIMIENTO FISICO, ATIENDE AL LLAMADA DE LOS VECINOS DE LA C MAGNESIO, SONDEANDO 52 METROS A BASE DE BARILLAS PARA LIMPIAR LA LINEA GENERAL.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
30/04/20	C. DANIEL PERALTA Y MANUEL ACUÑA	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	EL PERSONAL DE MATENIMIENTO FISICO, ACUDE A ALGUNAS CALLES DE LA CIUDAD, PARA HACER UNA REVISION COMPLETA DE LOS REGISTROS Y LA LINEA GENERAL DE DRENAJE				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
01/06/20	C. CRUZ ROJA	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE REPOSICION DE UN TRAMO TUBERIA DE PVC DE 12". YA QUE LA LINEA GENERAL SE ENCONTRABA TOTALMENTE ENSOLVADA, EL CUAL PROVOCABA EL PROBLEMA DE INUNDACION CON ALGUNOS VECINOS DE LA CALLE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
02/06/20	C. FCO. I MADERO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE CALA PARA LA CONSTRUCCION DE REGISTRO EN LA C. FCO I MADERO.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
03/06/20	C. FCO. I MADERO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE LA CONSTRUCCION DE REGISTRO EN LA C. FCO I MADERO.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
03/06/20	C. DURANGUITO, COL CENTRO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE TRITURACION CONCRETO, PARA HACER ZANJA DE DRENAJE				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
04/06/20	C. DURANGUITO, COL CENTRO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	DANDO CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS EN LA C. DURANGUITO, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE ZANJA PARA LA REPOSICION DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05/06/20	C. DURANGUITO, COL CENTRO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	PARA FINALIZAR LOS TRABAJOS EN LA C. DURANGUITO, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE REPOSICION DE 66 METROS LINEALES DE TUBERIA DE PVC DE 12", Y ASU VEZ RELLENAN ZANJA PARA SEGURIDAD DE LOS QUE TRANSITAN POR ESTA CALLE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05/06/20	C. DURANGUITO, COL CENTRO	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	PARA FINALIZAR LOS TRABAJOS EN LA C. DURANGUITO, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE REPOSICION DE 66 METROS LINEALES DE TUBERIA DE PVC DE 12", Y ASU VEZ RELLENAN ZANJA PARA SEGURIDAD DE LOS QUE TRANSITAN POR ESTA CALLE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
08/06/20	PRIVADA E. ZAPATA, S. LAGUNILLA	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	ATENDIENDO LAS QUEJAS CIUDADANAS, LA CUADRILLA DE MATENIMIENTO FISICO, HACE LIMPIEZA DE REGISTROS Y SONDEO A BASE DE BARILLAS PARA DESTAPAR LA LINEA GENERAL DE DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
09/06/20	COMUNIDAD CARRILLO	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	ATENDIENDO LAS QUEJAS CIUDADANAS, LA CUADRILLA DE MATENIMIENTO FISICO, HACE LIMPIEZA DE REGISTROS Y SONDEO A BASE DE BARILLAS EN LA COMUNIDAD DE CARRILLO YA QUE LA LINEA ESTA DEMACIADO ENSOLVADA.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
09/06/20	COMUNIDAD CARRILLO	DRENAJES	DENAJEROS	254	100
NOTA	ATENDIENDO LAS QUEJAS CIUDADANAS, LA CUADRILLA DE MATENIMIENTO FISICO BARILLEROS Y BACALL SUMAN ESFUERZO PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD DE CARRILLO HACIENDO DESASOLVE DE LINEA GENERAL DE DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
09/06/20	COMUNIDAD CARRILLO	DRENAJES	DENAJEROS	254	100
NOTA	ATENDIENDO LAS QUEJAS CIUDADANAS, LA CUADRILLA DE MATENIMIENTO FISICO BARILLEROS Y BACALL SUMAN ESFUERZO PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD DE CARRILLO HACIENDO DESASOLVE DE LINEA GENERAL DE DRENAJE Y LIMPIEZA DE 8 REGISTROS.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10/06/20	RASTRO TIF	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MATENIMIENTO FISICO, LLEVA ACACABO EL MANTENIMIENTO DE LA LINEA INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS ISNTALACIONES DEL RASTRO TIF, SONDEANDO 52 A BASE DE BARILLAS.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10/06/20	2DA PRIVA EMILIANO ZAPATA , COL. BENITO JUAREZ	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	ATENDIENDO LAS QUEJAS CIUDADANAS, LA CUADRILLA DE MATENIMIENTO FISICO, HACE LIMPIEZA DE REGISTROS Y SONDEO A BASE DE BARILLAS EN LA COL BENITO JUAREZ.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11/06/20	MODULO 30 COL. INDECO	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	ATENDIENDO LAS QUEJAS CIUDADANAS, LA CUADRILLA DE MATENIMIENTO FISICO, SONDEA A BASE DE BARILLAS PARA DESTAPAR LINEA GENERAL DE DRENAJE				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12/06/20	C.FELIPE ANGELES, COL. EMILIANO ZAPATA	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	ATENDIENDO LAS QUEJAS CIUDADANAS, LA CUADRILLA DE MATENIMIENTO FISICO, HACE TRTURACION DE CONCRETO PARA ZANJA DE DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12/06/20	C.FELIPE ANGELES, COL. EMILIANO ZAPATA	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	CONTINUANDO CON LOS TRABAJOS DE LA C. FELIPE ANGELES DE LA EMILIANO ZAPATA, LA CUADRILLA DE MATENIMIENTO FISICO, HACE ZANJA PARA LA REPOSICION DE 8 METROS LINEALES DE TUBERIA DE PVC DE 12".				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12/06/20	C.FELIPE ANGELES, COL. EMILIANO ZAPATA	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE REPOSICION DE TUBERIA DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE EN LA C. FELIPE ANGELES DE LA COL.EMILIANO ZAPATA, RELLENANDO ZANJA PARA LA SEGURIDAD DE LOS QUE TRANSITAN POR ESTA VIALIDAD..				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15/06/20	AV. TECNOLOGICA, COL. SOLIDARIDAD	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	ATENDIENDO A LA DENUNCIA FRESNILLO MUNICIPIO, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, LE DA SOLUCION AL TIRADERO DE AGUAS RESIDUALES POR LA AV. TECNOLOGICA, LIMPIANDO REGISTRO Y DESASOLVANDO 100 M LINEALES DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE CON EL BACALL				




BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15/06/20	AV. TECNOLOGICA, COL. SOLIDARIDAD	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	ATENDIENDO A LA DENUNCIA FRESNILLO MUNICIPIO, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, LE DA SOLUCION AL TIRADERO DE AGUAS RESIDUALES POR LA AV. TECNOLOGICA, LIMPIANDO REGISTRO Y DESASOLVANDO 100 M LINEALES DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE CON EL BACALL				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16/06/20	EL OLIVAR	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	ATENDIENDO A LA DENUNCIA FRESNILLO MUNICIPIO, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, LE DA SOLUCION AL TIRADERO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS EDIFICIOS, DESASOLVANDO LA LINEA GENERAL DE DRENAJE Y LIMPIEZA DE REGISTROD LLENO DE BASURA.				

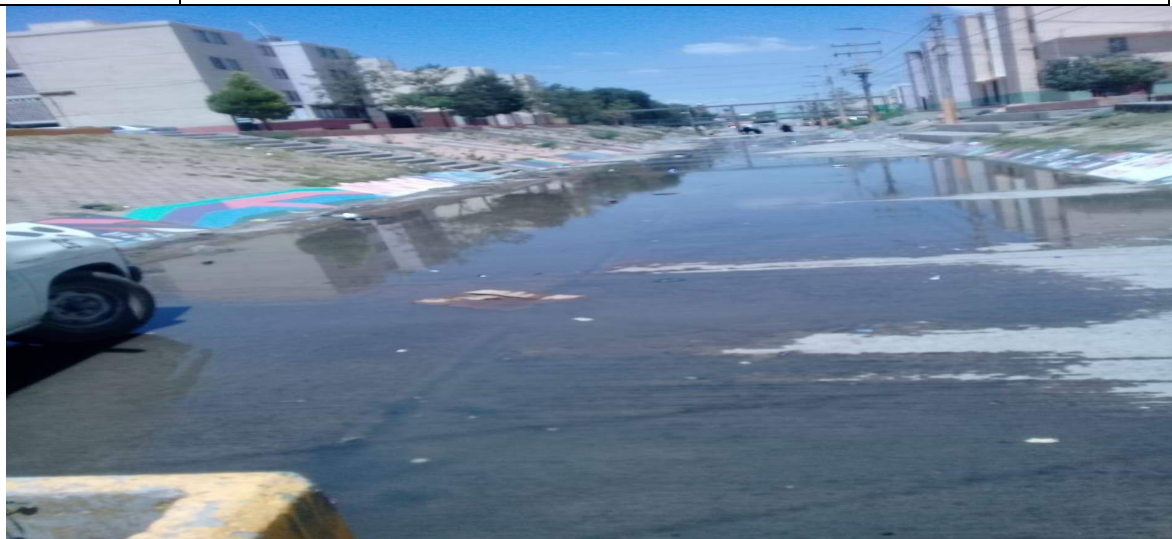

BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17/06/20	C.MORELOS, COL. MIGUEL HIDALGO	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	ATENDIENDO A LA DENUNCIA FRESNILLO MUNICIPIO, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO,HACE LIMPIEZA DE REGISTRO Y DESASOLVE DE LINEA GENERAL DE DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18/06/20	C. FELIPE ANGELES, COL. FCO VILLA	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	ATENDIENDO AL REPORTE DE LA CIUDADANIA, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE CALA PARA HACER SONDEO DE 125 M CON BARILLAS Y BACALL, PARA DAR SOLUCION AL PROBLEMA DE TAPONAMIENTO DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18/06/20	C. FELIPE ANGELES, COL. FCO VILLA	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	ATENDIENDO AL REPORTE DE LA CIUDADANIA, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE CALA PARA HACER SONDEO DE 125 M CON BARILLAS Y BACALL, PARA DAR SOLUCION AL PROBLEMA DE TAPONAMIENTO DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19/06/20	C. SIERRA DE ORGANOS	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	DANDO CONTINUIDAD AL REPORTE DE LA CIUDADANIA, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE SONDEO A BASE DE BARILLS PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE TAPONAMIENTO DE DRENAJE, EN LA COL. LOMAS DE PLATEROS				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22/06/20	C.SARAOS, COL ESPARZA	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, ATIENDE EL REPOTE DE LA CALLE SARAOS DE LA COL. ESPARZA PARA EVITAR EL DERRAME AGUAS NEGRAS, HACIENDO SONDEO A BASE DE BARILLAS.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22/06/20	CUMUNIDAD LA CHICHARRONA	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE REVISION DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE YA QUE LOS TUBOS ESTAN CONTRA PENDIENTE Y EN ALGUNOS TRAMOS QUEMADOS.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23/06/20	MANUEL ACUÑA	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, ATIENDE EL REPOTE DE INUNDACION EN VARIOS DOMICILIOS HACIENDO SONDEAR A BASE DE BARILLAS Y DESTAPAR LA LINEA GENERAL.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23/06/20	COMUNIDAD: LA CHICHARRONA	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, ATIENDE EL REPOTE DE INUNDACION EN VARIOS DOMICILIOS HACIENDO CALA PARA SONDEAR A BASE DE BARILLAS Y DESTAPAR LA LINEA GENERAL.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23/06/20	COMUNIDAD: CARRILLO	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE EXCAVACION A BASE DE PICO Y PALA, PARA PODER LOCALIZAR POZO DE VISTA Y DAR MANTENIMIENTO A LA LINEA GENERAL.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23/06/20	COMUNIDAD: CARRILLO	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE EXCAVACION A BASE DE PICO Y PALA, PARA PODER LOCALIZAR POZO DE VISTA Y DAR MANTENIMIENTO A LA LINEA GENERAL.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24/06/20	COMUNIDAD: CARRILLO	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE SONDEO A BASE DE BARILLAS PARA DESTAPAR LA LINEA GENERAL DE DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24/06/20	MANUEL M PONCE	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE SONDEO A BASE DE BARILLAS PARA DESTAPAR LA LINEA GENERAL DE DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25/06/20	TLALTENAGO COL INDUSRIAL	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, ATIENDE DE MANERA INMEDIATA EL TIRADERO DE AGUAS NEGRAS, HACIENDO SONDEO A BASE DE BARILLAS PARA DESTAPAR LA LINEA GENERAL DE DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
02/06/20	COMUNIDAD NUEVO ZARAGOZA	DRENAJES	DENAJEROS	254	100
NOTA	ATENDIENDO A LA SOLICITUD DE LOS HABITANTES DE NUEVO ZARAGOZA, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, ACUDE A ESTA COMUNIDAD A HACER LIMPIEZA DE LAS PILETAS DONDE DESENBoca LA LINEA GENERAL DE DRENAJE-				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
03/06/20	SAUCES COL ARBOLEDAS	DRENAJES	DENAJEROS	254	100
NOTA	ATENDIENDO LAS QUEJAS CIUDADANAS, LA CUADRILLA DE MATENIMIENTO FISICO HACE DESASOLVE DE 79 METROS PARA DESTAPAR LINEA GENERAL DE DFEMAJE				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
04/06/20	C. CRUZ ROJA	DRENAJES	DENAJEROS	254	100
NOTA	ATENDIENDO LAS QUEJAS CIUDADANAS, LA CUADRILLA DE MATENIMIENTO FISICO BARILLEROS Y BACALL SUMAN ESFUERZO PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA C. CRUZ ROJA, DESASOLVANDO DE LINEA GENERAL DE DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05/06/20	PALMIRA	DRENAJES	DENAJEROS	254	100
NOTA	ATENDIENDO LAS QUEJAS CIUDADANAS, LA CUADRILLA DE MATENIMIENTO FISICO HACE DESASOLVE DE 87 METROS PARA DESTAPAR LINEA GENERAL DE DFEMAJE DE LA COMUNIDAD DE PALMIRA.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
09/06/20	COMUNIDAD CARRILLO	DRENAJES	DENAJEROS	254	100
NOTA	ATENDIENDO LAS QUEJAS CIUDADANAS, LA CUADRILLA DE MATENIMIENTO FISICO BARILLEROS Y BACALL SUMAN ESFUERZO PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD DE CARRILLO HACIENDO DESASOLVE DE LINEA GENERAL DE DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
09/06/20	COMUNIDAD CARRILLO	DRENAJES	DENAJEROS	254	100
NOTA	ATENDIENDO LAS QUEJAS CIUDADANAS, LA CUADRILLA DE MATENIMIENTO FISICO BARILLEROS Y BACALL SUMAN ESFUERZO PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD DE CARRILLO HACIENDO DESASOLVE DE LINEA GENERAL DE DRENAJE Y LIMPIEZA DE 8 REGISTROS.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10/06/20	M. PONCE, EL OLIVAR	DRENAJES	DENAJEROS	254	100
NOTA	ATENDIENDO LAS QUEJAS CIUDADANAS, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE DESASOLVE EN LOS EDIFICIOS YA QUE VARIOS DEPARTAMENTOS TENIAN TAPONAMIENTO EN SU DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12 Y 15/06/20	GASOLINERA GUDE	DRENAJES	DENAJEROS	254	100
NOTA	EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN LA GASOLINERA GUDE SALIDA A DURANGO.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15/06/20	SIERRA FRIA, COL. LOMAS DE PLATEROS	DRENAJES	DENAJEROS	254	100
NOTA	EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE DESASOLVE DE 80 METROS DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE DE LA CALLE SIERRA FRIA EN LA COL. LOMAS DE PLATEROS.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15/06/20	AV. TECNOLOGICA, COL. SOLIDARIDAD	DRENAJES	DENAJEROS	254	100
NOTA	ATENDIENDO A LA DENUNCIA FRESNILLO MUNICIPIO, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO EN COORDINACIÓN CON LA CUADRILLA DE DRENAJEROS, ACUDEN DE MANERA INMEDIATA A RESOLVER EL TIRADERO DE AGUAS NEGRAS POR LA AV TECNOLOGICA, POR LO CUAL SE HACE SONDEO DE 100 METROS A LA LINEA GENERAL DE DRENAJE, SOLUCIONANDO EL PROBLEMA.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16/06/20	COMUNIDAD EL TRIUNFO	BACALL	DENAJEROS	254	100
NOTA	ATENDIENDO A LA PETICION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD POR ESCRITO, EL PERSONAL DE MATENIMIENTO FISICO , ACUDE A LA COMUNIDAD DEL TRIUNFO A REALIZAR LIMPIEZA DE 2 FOSAS SEPTICAS. UN COMPROMISO MAS DE ATENDER A LAS COMUNIDADES, SIN PAGAR POR OTORGARLES UN SERVICIO,				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16/06/20	COMUNIDAD; EST SAN JOSE	BACALL	DENAJEROS	254	100
NOTA	ATENDIENDO A LA PETICION HECHA POR LOS CIUDADANOS, EL PERSONAL DE MATENIMIENTO FISICO , ACUDE A LA COMUNIDAD DE ESTACION SAN JOSE, A RESOLVER EL PROBLEMA DE TAPONAMIENTO DE DRENAJE, POR LA GRAN CANTIDAD DE BASURA QUE OCASIONA LA MOLESTIA PARA LOS VECINLOS DE ESTA CALLE,				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17/06/20	COMUNIDAD: PLAMIRA	BACALL	DENAJEROS	254	100
NOTA	ATENDIENDO A LA SOLICITUD DE IMELDA GONZALEZ , EL PERSONAL DE MATENIMIENTO FISICO , ACUDE A LA COMUNIDAD DE PALMIRA A REALIZAR LIMPIEZA DE 2 FOSAS SEPTICAS. UN COMPROMISO MAS DE ATENDER A LAS COMUNIDADES DE MANERA GRATUITA.				




BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18/06/20	C. FELIPE ANGELES, COL. FCO VILLA	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	ATENDIENDO AL REPORTE DE LA CIUDADANIA, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE CALA PARA HACER SONDEO DE 125 M CON BARILLAS Y BACALL, PARA DAR SOLUCION AL PROBLEMA DE TAPONAMIENTO DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19/06/20	AV ENRIQUE ESTRADA	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	ATENDIENDO AL REPORTE DE LA CIUDADANIA, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE LIMPIEZA DE REGISTROS SATURADOS DE GRASA Y A SU VEZ EL DESASOLVE DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE QUE YA SE ENCUENTRA A FECTADA POR LA MISMA GRASA.				

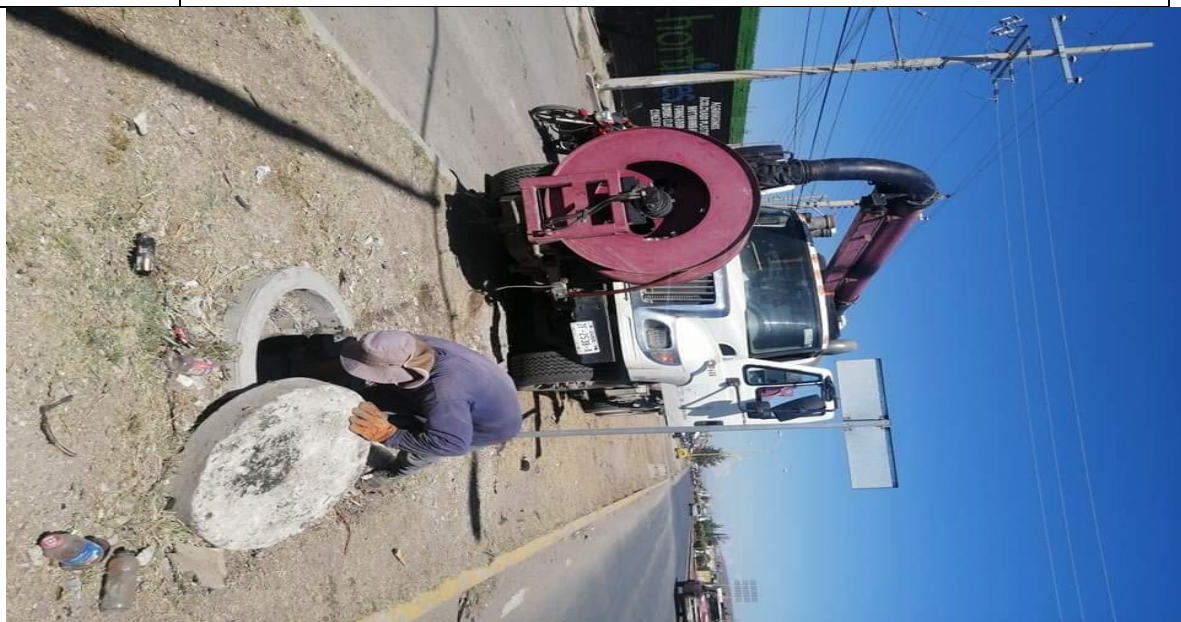

BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22/06/20	COMUNIDAD: BOCA DE LOBOS	DRENAJES		216	100
NOTA	ATENDIENDO A LA SOLICITUD DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD BOCA DE LOBOS, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS, PARA EVITAR QUE LOS MANTOS DE AGUAS DULCES SEAN CONTAMINADOS POR LOS DESECHOS QUE ESTABAN AL TOPE DE LAS FOSAS DE ESTA COMUNIDAD.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24/06/20	INDECO, MOLDULO 35 B	DRENAJES		216	100
NOTA	ATENDIENDO A LA DENUNCIA CIUDADANA, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE LIMPIEZA DE REGISTROS Y SONDEO DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25/06/20	TLALTENANGO, COL INDUSTRIAL	DRENAJES		216	100
NOTA	ATENDIENDO A LA DENUNCIA CIUDADANA, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE LIMPIEZA DE REGISTROS Y SONDEO DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE EN LA CALLE TLALTENANGO.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26/06/20	TORBELLINO, COL. POLVADERAS	DRENAJES		216	100
NOTA	ATENDIENDO A LA DENUNCIA CIUDADANA, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE SONDEO DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE EN LA CALLE TORBELLINO..				





INFORME SEMANAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Periodo	Actividad	Fecha de inicio de actividad	Fecha de término	Comunidad/ Cabecera/ Ayuntamiento	Coordinación	Número de beneficiarios de la actividad (impacto)	Status al final de la semana	Observaciones
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA								
	SE TRABAJA EN CAPTURA AL SISTEMA SIA Y RFT, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES PARA ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA A LA ASE.	20 Abril 2020	24 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	40%	EN PROCESO
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PATILLOS (ENTRE C. PIRAMIDE DEL SOL Y C. LASALLE, COL. FRANCISCO GOITIA Y CALLE LASALLE (ENTRE C. PATILLOS Y BLVD HOMBRES ILUSTRES, FRESNILLO, ZAC.	20 Abril 2020	24 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	75%	OBRA EN PROCESO
	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE GABRIEL LUGO, ENTRE EL BOULEVARD JESUS VARELA RICO Y CALLE REPUBLICA DE CUBA: ENTRE CALLE PANAMA Y CALLE REPUBLICA DE BRASIL Y LA CALLE SEGUNDA DE LA PAZ ENTRE CALLE REPUBLICA DE BRASIL Y CALLE DE LA PAZ.	20 Abril 2020	24 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	OBRA TERMINADA, GASTO CORRIENTE 2020 (EN TRÁMITE DE PAGO)
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGUILES SERDAN Y REFORMA, COL. CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	20 Abril 2020	24 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	OBRA TERMINADA, GASTO CORRIENTE 2020 (EN TRÁMITE DE PAGO)
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO (TOMAS DOMICILIARIAS) AV. DE LOS FRESNOS, COL. ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	20 Abril 2020	24 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	OBRA TERMINADA, GASTO CORRIENTE 2020 (EN TRÁMITE DE PAGO)
	TRABAJOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE PREPARATORIA RAMON LOPEZ VELARDE EN LA LOCALIDAD DE MONTEMARIANA.	20 Abril 2020	24 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	90%	OBRA EN PROCESO
	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULAS Y CAMBIO DE PIEZAS PARA MEJORAR LA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIAS DEL VALLE Y MIGUEL HIDALGO (SECTOR 1). LA CONSTRUCCIÓN DE 6 SECTORIZACIONES MEDIANTE PUNTOS DE ALIMENTACIÓN Y DOS PUNTOS DE PRESIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE LA RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE AUMENTO DE CAPACIDAD DE BOMBEO.	20 Abril 2020	24 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	125,304	87%	FONDO MINERO
	TRABAJOS DE CATALOGO CONCLUIDOS EN CANAL PARA RECOLECCIÓN DE AGUA PLUVIAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA LONGITUD DE 180.00 ML, EN LA COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS.	20 Abril 2020	24 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	32,727	100%	OBRA TERMINADA. LISTA PARA INAUGURAR
	COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL PUENTE HASTA ACCESO PRINCIPAL A COMUNIDAD EN CALLE LÓPEZ MATEOS, COMUNIDAD DE CARRILLO.	20 Abril 2020	24 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	1,088	70%	TRABAJOS DETENIDOS EN ESPERA DE PAGO FONDO MINERO, PARA CONTINUAR.

A partir del 20 al 24 abril 2020	SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA MOTOR SUMERGIBLE EN LOS POZOS 15 Y 16 E INSTALACION DE CAPACITORES EN POZO 17 SISTEMA PARDILLO; Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE EN REBOMBEO 5, POZO 3 Y POZO 5 SISTEMA CARRILLO E INSTALACION DE CAPACITORES EN POZOS 3, 8 Y 10 SISTEMA CARRILLO.	20 Abril 2020	24 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	122,249	80%	FONDO MINERO. TRABAJOS DETENIDOS EN ESPERA DE RECURSO FONDO MINERO.
	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VALVULA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA EN LA PUESTA EN MARCHA Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 7 SECTORES HIDRÁULICOS EN DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.	20 Abril 2020	24 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	120,944	70%	FONDO MINERO, TRABAJOS DETENIDOS EN ESPERA DE RECURSO FONDO MINERO
	SE TRABAJA EN COLADO DE DADOS PARA LUMINARIAS Y TERRACERIAS Y CONECTAR A LA COL. FRANCISCO VILLA EN AV. DOCTORES, COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZAC.	20 Abril 2020	24 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	95%	FONDO MINERO
	REENCARPETAMIENTO DEL BOULEVARD J. VARELA RICO CUERPO "A", FRESNILLO, ZAC. (PRIMERA ETAPA).	30 Marzo 2020	03 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	GASTO CORRIENTE 2020
	TRABAJOS TERMINADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR LOCALIZADO EN ARROYO PRIETO.	13 Abril 2020	17 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	GASTO CORRIENTE 2020
	TRABAJOS DE CATALOGO CONCLUIDOS EN PLAZA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE RAFAEL YAÑEZ SOSA (EL MEZQUITE), FRESNILLO, ZAC.	30 Marzo 2020	03 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	2,085	100%	FONDO MINERO. PENDIENTE INAUGURACIÓN, EN ESPERA DE QUE TERMINEN PAVIMENTO HIDRÁULICO DE OTRO CONTRATO.
	REENCARPETAMIENTO DEL BOULEVARD J. VARELA RICO CUERPO "B", FRESNILLO, ZAC. (SEGUNDA ETAPA).	13 Abril 2020	17 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	GASTO CORRIENTE 2020 (EN TRÁMITE DE PAGO)
	PAVIMENTO Y TOMAS DE AGUA POTABLE EN CALLE FRESNOS, COLONIA ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZAC.	13 Abril 2020	17 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	GASTO CORRIENTE 2020 (EN TRÁMITE DE PAGO)
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CABRESTOS, COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZAC.	13 Abril 2020	17 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	GASTO CORRIENTE 2020 (EN TRÁMITE DE PAGO)
	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO CON CAPACIDAD DE 2,250 M3 EN REBOMBEO PARDILLO.	20 Abril 2020	24 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	5%	PRODDER 2020
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO FISICO								

Apartir del 20 al 24 abril 2020	TRABAJOS DE AREA DRENAJEROS EN: (1) LIMPIEZA GENERAL DE FOSA EN COL. UNIVERSIDAD (2) DESTAPE DE LINEA GENERAL EN AV. ENRIQUE ESTRADA (3) DESASOLVE DEE TUBERIA EN CALLE NIÑOS HEROES COMUNIDAD DE PLATEROS (4) REPOSICION DE LINEA GERAL DE DRENAJE EN CALLE LOZA DE LA COL. OBRERA (5) DESTAPE DE LINEA DE DRENAJE EN COL. MANUEL M. PONCE DIFICIO 24 (6) REPOSICIÓN DE TUBERIA DE LINEA GENERAL DE DRENAJE EN CALLE SAMUEL QUIÑONES DE LA COL. EMILIANO ZAPATA. (7) EN COORDINACIÓN CON SIAPASF REALIZARN TRABAJOS DE DESTAPE EN CALLE RIO BRAVO DE COL. DEL VALLE. (8) DESTAPE DE LINEA GENERAL DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO VILLA (9) DESASOLVE EN CALLE PLATA DE LA COMUNIDAD DE PLATEROS. (10) DESTAPE DE LINEA GENERAL DE DRENAJE EN AVENIDA PLATEROS FRENTE A CALLE LORETO.	20 Abril 2020	24 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	TRABAJOS DE BACHEO: LA CUADRILLA DE BACHEO, SE ENCUENTRA INTEGRADA EN APOYO A LA CUADRILLA DE DRENAJEROS, DEVIDO A LA CONTINGENCIA Y FALTA DE MATERIAL ASFALTICO E HIDRAULICO, POR TANTO NO HAY ACTIVIDAD DE BACHEO. SE TERMINAN LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO QUE CONDUCE DE SAN FELIPE HACIA ARROYO PRIETO.	20 Abril 2020	24 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	SUSPENDIDOS SERVICIOS ATENDIDOS CON CAMIÓN VACALL DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REPARACIÓN.	30 Marzo 2020	03 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	0%	
DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA								
	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AV. DE LOS FRESNOS	20 Abril 2020	20 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO COMUNIDAD EL MEZQUITE	21 Abril 2020	21 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CALLE LASALLE	23 Abril 2020	23 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CALLE PATILLOS	24 Abril 2020	24 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS								
	Se completó el Proyecto de CENTRO DE CONVENCIONES Se revisaron 5 expedientes para licencia de construcción Se revisaron 3 expedientes de subdivisión Se digitalizaron 3 levantamientos topográficos.	20 Abril 2020	24 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO								
	Alinimientoy No. oficial							
	Determina el numero ofical del inmueble	20-abr	24-abr	Ayuntamiento	Municipal	3 ciudadanos	90%	
	Licencias de Construcción							

permisos mayores a los 45 m, y prorrogas y prorrogas de licencias	20-abr	24-abr	Ayuntamiento	Municipal	3 ciudadanos y empresas	95%	
permisos menores a los 45 metros							
permisos menores a los 45 metros	20-abr	24-abr	Ayuntamiento	Municipal	4 ciudadanos	70%	
Fusion, Subdivicion y Anuncios							
el conjunto de dos o mas predios, y el desmenbramiento de un predio en dos o mas lotes			Ayuntamiento	Municipal	0 ciudadanoS		
Uso de suelo							
compatibilidad urbanistica			Ayuntamiento	Municipal	0 ciudadanos		
Conexión de Tubería							
Conexión de Tubería, cambio de drenaje o conexión de agua potable	20-abr	24-abr	Ayuntamiento	Municipal	2 ciudadanos	80%	
Constancias Varias							
constancia de funcionamiento			Ayuntamiento	Municipal	0 ciudadanos		

INFORME SEMANAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Periodo	Actividad	Fecha de inicio de actividad	Fecha de término	Comunidad/ Cabecera/ Ayuntamiento	Coordinación	Número de beneficiarios de la actividad (impacto)	Status al final de la semana	Observaciones
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA								
Apartir del 30 Marzo al 03 abril 2020	TRABAJOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE PREPARATORIA RAMON LOPEZ VELARDE EN LA LOCALIDAD DE MONTEMARIANA.	30 Marzo 2020	03 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	90%	OBRA EN PROCESO
	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULAS Y CAMBIO DE PIEZAS PARA MEJORAR LA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIAS DEL VALLE Y MIGUEL HIDALGO (SECTOR 1). LA CONSTRUCCIÓN DE 6 SECTORIZACIONES MEDIANTE PUNTOS DE ALIMENTACIÓN Y DOS PUNTOS DE PRESIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE LA RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE AUMENTO DE CAPACIDAD DE BOMBEO.	30 Marzo 2020	03 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	125,304	87%	FONDO MINERO
	TRABAJOS DE CATALOGO CONCLUIDOS EN CANAL PARA RECOLECCIÓN DE AGUA PLUVIAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA LONGITUD DE 180.00 ML, EN LA COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS.	30 Marzo 2020	03 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	32,727	100%	OBRA TERMINADA. LISTA PARA INAUGURAR
	COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL PUENTE HASTA ACCESO PRINCIPAL A COMUNIDAD EN CALLE LÓPEZ MATEOS, COMUNIDAD DE CARRILLO.	30 Marzo 2020	03 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	1,088	70%	TRABAJOS DETENIDOS EN ESPERA DE PAGO FONDO MINERO, PARA CONTINUAR.
	SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA MOTOR SUMERGIBLE EN LOS POZOS 15 Y 16 E INSTALACION DE CAPACITORES EN POZO 17 SISTEMA PARDILLO; Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE EN REBOMBEO 5, POZO 3 Y POZO 5 SISTEMA CARRILLO E INSTALACION DE CAPACITORES EN POZOS 3, 8 Y 10 SISTEMA CARRILLO.	30 Marzo 2020	03 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	122,249	80%	FONDO MINERO. TRABAJOS DETENIDOS EN ESPERA DE RECURSO FONDO MINERO.
	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VALVULA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA EN LA PUESTA EN MARCHA Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 7 SECTORES HIDRÁULICOS EN DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.	30 Marzo 2020	03 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	120,944	70%	FONDO MINERO, TRABAJOS DETENIDOS EN ESPERA DE RECURSO FONDO MINERO
	SE TRABAJA EN BACHEO ASFÁLTICO EN AV. DOCTORES, COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZAC.	30 Marzo 2020	03 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	93%	FONDO MINERO
	REENCARPETAMIENTO DEL BOULEVARD J. VARELA RICO CUERPO "A", FRESNILLO, ZAC. (PRIMERA ETAPA).	30 Marzo 2020	03 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	GASTO CORRIENTE 2020

	PUENTE VEHICULAR LOCALIZADO EN ARROYO PRIETO, FALTA COLOCAR PARAPETO.	30 Marzo 2020	03 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	98%	GASTO CORRIENTE 2020
	TRABAJOS DE CATALOGO CONCLUIDOS EN PLAZA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE RAFAEL YAÑEZ SOSA (EL MEZQUITE), FRESNILLO, ZAC.	30 Marzo 2020	03 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	2,085	100%	FONDO MINERO. PENDIENTE INAUGURACIÓN, EN ESPERA DE QUE TERMINEN PAVIMENTO HIDRÁULICO DE OTRO CONTRATO.
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO FISICO								
Apartir del 30 Marzo al 03 abril 2020	TRABAJOS DE AREA DRENAJEROS EN: (1) SONDEO PARA REPARAR LINEA GENERAL DE DRENAJE EN C. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y C. CARTERO BARRIO ALTO. (2) SONDEO PARA DESTAPE DE LINEA INTERIOR Y EXTERIOR DE DRENAJE EN RASTRO TIF. (3) SONDEO Y DESTAPE DE LINEA DE DRENAJE EN C. NIÑO ARTILLERO 403, COL. INDUSTRIAL. (4) SONDEO EN C. FCO. I. MADERO, COL. FCO VILLA. (5) SONDEO Y DESTAPE EN C. LUIS MOYA, COL. CENTRO. (6) SONDEO PARA DESTAPE DE DRENAJE EN C. ANDRES FRIAS, COL. BARRIO ALTO. (7) SONDEO Y DESTAPE EN EDIFICIO 307, COL. EL OLIVAR. (8) SONDEO Y LIMPIEZA DE POZOS DE VISITA EN C. DANIEL PERALTA Y OAXACA, COL. INDUSTRIAL. (9) SE ATENDIÓ REPORTE PARA MEJORAR LA LINEA GRAL. DE DRENAJE EN C. MOCTEZUMA Y 2 DE ABRIL, COL. CENTRO (10) CORTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN C. SIERRA DE VALDECAÑAS.	30 Marzo 2020	03 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	TRABAJOS DE BACHEO: (1) CAMBIO DE TAPA DE REGISTRO EN CALLEJON SOMBRERETE, COL. CENTRO. (2) TRABAJOS DE BACHEO EN C. MARGARITAS, C. DIEGO RIVERA, FRACC. PROVIDENCIA. (3) CAMBIO DE BROCAL Y TAPA DE POZO DE VISITA EN C. SAN ANTONIO CLARET FRACC. COLINAS. (4) APOYO DE COLOCACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL EN CASA, CALLE FCO. VILLA, COL. PLAN DE AYALA. (5) LIMPIEZA DE ESCOMBRO EN C. 2DA DE SAN ANTONIO FRACC. COLINAS. (6) REPARACIÓN DE POZO DE VISTA Y CAMBIO TAPA DE REGISTRO EN COL. 4 DE OCTUBRE. (7) BACHEO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. DURANGUITO, COL. CENTRO. (8) REPARACIÓN DE POZO DE VISITA Y CAMBIO DE TAPA DE REGISTRO EN C. DANIEL PERALTA. (9) BACHEO HIDRÁULICO EN C. DIVISIÓN DEL NORTE COL. FCO VILLA.	30 Marzo 2020	03 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	

	SUSPENDIDOS SERVICIOS ATENDIDOS CON CAMIÓN VACALL DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REPARACIÓN.	30 Marzo 2020	03 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	0%	
DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA								
	NO HUBO VEHICULO	30 Marzo 2020	03 Abril 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	0%	
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO								
	Alinimientoy No. oficial							
	Determina el numero ofical del inmueble	31-mar	02-abr	Ayuntamiento	Municipal	1 ciudadanos	90%	
	Licencias de Construcción							
	permisos mayores a los 45 m, y prorrogas y prorrogas de licencias	31-mar	02-abr	Ayuntamiento	Municipal	14 ciudadanos y empresas	95%	
	permisos menores a los 45 metros							
	permisos menores a los 45 metros	31-mar	02-abr	Ayuntamiento	Municipal	7 ciudadanos	70%	
	Fusion, Subdivicion y Anuncios							
	el conjunto de dos o mas predios, y el desmenbramiento de un predio en dos o mas lotes			Ayuntamiento	Municipal	0 ciudadanoS		
	Uso de suelo							
	compatibilidad urbanistica	31-mar	02-abr	Ayuntamiento	Municipal	1 ciudadanos	70%	
	Conexión de Tuberia							
	Conexión de Tuberia, cambio de drenaje o conexión de agua potable	31-mar	02-abr	Ayuntamiento	Municipal	1 ciudadanos	70%	
	Constancias Varias							
	constancia de funcionamiento			Ayuntamiento	Municipal	0 ciudadanos		

INFORME SEMANAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Periodo	Actividad	Fecha de inicio de actividad	Fecha de término	Comunidad/ Cabecera/ Ayuntamiento	Coordinación	Número de beneficiarios de la actividad (impacto)	Status al final de la semana	Observaciones
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA								
	SE TRABAJA EN CAPTURA AL SISTEMA SIA Y RFT, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES PARA ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA A LA ASE.	11 Mayo 2020	15 Mayo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	45%	EN PROCESO
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PATILLOS (ENTRE C. PIRAMIDE DEL SOL Y C. LASALLE, COL. FRANCISCO GOITIA Y CALLE LASALLE (ENTRE C. PATILLOS Y BLVD HOMBRES ILUSTRES, FRESNILLO, ZAC. Se trabaja en la construcción de pavimento.	11 Mayo 2020	15 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	90%	OBRA EN PROCESO (GASTO CORRIENTE 2020)
	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE GABRIEL LUGO, ENTRE EL BOULEVARD JESUS VARELA RICO Y CALLE REPUBLICA DE CUBA: ENTRE CALLE PANAMA Y CALLE REPUBLICA DE BRASIL Y LA CALLE SEGUNDA DE LA PAZ ENTRE CALLE REPUBLICA DE BRASIL Y CALLE DE LA PAZ.	11 Mayo 2020	15 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	OBRA TERMINADA, GASTO CORRIENTE 2020 (EN TRÁMITE DE PAGO)
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGUILAS SERDAN Y REFORMA, COL. CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	11 Mayo 2020	15 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	OBRA TERMINADA, GASTO CORRIENTE 2020 (EN TRÁMITE DE PAGO)
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO (TOMAS DOMICILIARIAS) AV. DE LOS FRESNOS, COL. ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	11 Mayo 2020	15 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	OBRA TERMINADA, GASTO CORRIENTE 2020 (EN TRÁMITE DE PAGO)
	TRABAJO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE PREPARATORIA RAMON LOPEZ VELARDE EN LA LOCALIDAD DE MONTEMARIANA.	11 Mayo 2020	15 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	90%	OBRA EN PROCESO
	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULAS Y CAMBIO DE PIEZAS PARA MEJORAR LA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIAS DEL VALLE Y MIGUEL HIDALGO (SECTOR 1). LA CONSTRUCCIÓN DE 6 SECTORIZACIONES MEDIANTE PUNTOS DE ALIMENTACIÓN Y DOS PUNTOS DE PRESIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE LA RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE AUMENTO DE CAPACIDAD DE BOMBEO.	11 Mayo 2020	15 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	125,304	87%	FONDO MINERO
	TRABAJO DE CATALOGO CONCLUIDOS EN CANAL PARA RECOLECCIÓN DE AGUA PLUVIAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA LONGITUD DE 180.00 ML, EN LA COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS.	11 Mayo 2020	15 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	32,727	100%	OBRA TERMINADA. LISTA PARA INAUGURAR
	COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL PUENTE HASTA ACCESO PRINCIPAL A COMUNIDAD EN CALLE LÓPEZ MATEOS, COMUNIDAD DE CARRILLO.	11 Mayo 2020	15 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	1,088	70%	TRABAJO DETENIDOS EN ESPERA DE PAGO FONDO MINERO, PARA CONTINUAR.

Apartir del 11 al 15 mayo 2020	SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA MOTOR SUMERGIBLE EN LOS POZOS 15 Y 16 E INSTALACION DE CAPACITORES EN POZO 17 SISTEMA PARDILLO; Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE EN REBOMBEO 5, POZO 3 Y POZO 5 SISTEMA CARRILLO E INSTALACION DE CAPACITORES EN POZOS 3, 8 Y 10 SISTEMA CARRILLO.	11 Mayo 2020	15 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	122,249	80%	FONDO MINERO. TRABAJOS DETENIDOS EN ESPERA DE RECURSO FONDO MINERO.
	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VALVULA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA EN LA PUESTA EN MARCHA Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 7 SECTORES HIDRÁULICOS EN DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.	11 Mayo 2020	15 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	120,944	70%	FONDO MINERO, TRABAJOS DETENIDOS EN ESPERA DE RECURSO FONDO MINERO
	SE TRABAJA EN BASE HIDRÁULICA SOBRE SEGUNDA GLORIETA EN AV. DOCTORES, COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZAC.	11 Mayo 2020	15 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	96%	FONDO MINERO
	REENCARPETAMIENTO DEL BOULEVARD J. VARELA RICO CUERPO "A", FRESNILLO, ZAC. (PRIMERA ETAPA).	11 Mayo 2020	15 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	GASTO CORRIENTE 2020
	TRABAJOS TERMINADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR LOCALIZADO EN ARROYO PRIETO.	11 Mayo 2020	15 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	GASTO CORRIENTE 2020
	TRABAJOS DE CATALOGO CONCLUIDOS EN PLAZA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE RAFAEL YAÑEZ SOSA (EL MEZQUITE), FRESNILLO, ZAC.	11 Mayo 2020	15 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	2,085	100%	FONDO MINERO. PENDIENTE INAUGURACIÓN, EN ESPERA DE QUE TERMINEN PAVIMENTO HIDRÁULICO DE OTRO CONTRATO.
	REENCARPETAMIENTO DEL BOULEVARD J. VARELA RICO CUERPO "B", FRESNILLO, ZAC. (SEGUNDA ETAPA).	11 Mayo 2020	15 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	GASTO CORRIENTE 2020 (EN TRÁMITE DE PAGO)
	PAVIMENTO Y TOMAS DE AGUA POTABLE EN CALLE FRESNOS, COLONIA ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZAC.	11 Mayo 2020	15 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	GASTO CORRIENTE 2020 (EN TRÁMITE DE PAGO)
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CABRESTOS, COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZAC.	11 mayo 2020	15 mayo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	GASTO CORRIENTE 2020 (EN TRÁMITE DE PAGO)
	REHABILITACIÓN DE FACHADAS EN CALLE ALLENDE Y AV. HIDALGO, COLONIA CENTRO (SEGUNDA ETAPA), CENTRO HISTÓRICO DE FRESNILLO, ZACATECAS.	11 mayo 2020	15 mayo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	20%	GASTO CORRIENTE 2020 (EN TRÁMITE DE PAGO)
	EN TRÁMITE DE PERMISO DE ECOLOGIA PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO CON CAPACIDAD DE 2,250 M3 EN REBOMBEO PARDILLO.	11 mayo 2020	15 mayo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	5%	PRODDER 2020
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO FISICO								

A partir del 11 al 15 mayo 2020	TRABAJOS DE AREA DRENAJEROS EN: (1) INSTALACIÓN DE TAPA DE DRENAJE EN C. CHABACANOS, COL. ARBOLEDAS (2) LIMPIEZA DE REGISTRO EN EDIFICIO 1, COL EL OLIVAR (3) TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE DRENAJE EN C. 2 DE ABRIL Y MOCTEZUMA (4) ELABORACIÓN DE TAPADERAS DE REGISTRO EN TALLER MUNICIPAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS DENUNCIAS CIUDADANAS (5) LIMPIEZA EN EL TALLER MUNICIPAL (6) DESTAPE DE LINEA GENERAL DE DRENAJE EN C. GONZALEZ ECHEVERRIA, COL. EL OLIVAR (7) LIMPIEZA A LINEA GENERAL DE DRENAJE EN PUENTE A UN COSTADO DE LIVERPOL (8) CORTE DE ZANJA PARA CAMBIO DE TUBERIA EN C. SIERRA DE VALDECAÑAS (9) SONDEO A BAE DE BARRILLAS EN DRENAJE DE C. REFORMA, COL. CENTRO (10) MANTENIMIENTO A LINEA GENERAL DE DRENAJE EN RASTRO TIF (11) SONDEO A LINEA GENERAL DE DRENAJE EN C. MANUEL AVILA CAMACHO, COL. FCO. VILLA (12) MANTENIMEINTO A LINEA GENERAL DE DRENAJE EN C. MECANICOS, COL. SAN JOAQUIN (13) DESASOLVE CON BACALL Y BARILLAS A LINEA GENERAL DE DRENAJE EN C. FUNDA Y BARBIQUEJO, COL. LIENZO CHARRO (14) LIMPIEZA DE REGISTRO EN EDIFICIO 1, COL. EL OLIVVAR (15) REPOSICION DE TUBERIA EN C. 2 DE ABRIL Y MOCTEZUMA, COL BARRIO ALTO (16) LIMPIEZA DE REGISTROS EN C. IGNACIO COMFORT, COL BARRIO ALTO .	11 mayo 2020	15 mayo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	TRABAJOS DE BACHEO: EQUIPO DE BACHEO EN APOYO A DRENAJEROS.	11 mayo 2020	15 mayo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA								
	TRABAJOS EN OFICINA	11 MAYO 2020	11 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	TRABAJOS EN OFICINA	12 MAYO 2020	12 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS								
	Se digitalizaron 3 proyectos de pavimentación de calles Se revisaron 4 expedientes para licencias de construcción Se revisaron 5 expedientes de subdivisión Se revisaron 2 expedientes de compatibilidad urbanística	11 mayo 2020	15 mayo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO								
	Alinimientoy No. oficial							
	Determina el numero ofical del inmueble	11-may	14-may	Ayuntamiento	Municipal	6 ciudadanos	90%	
	Licencias de Construcción							
	permisos mayores a los 45 m, y prorrogas y prorrogas de licencias	11-may	14-may	Ayuntamiento	Municipal	21 ciudadanos y empresas	95%	

permisos menores a los 45 metros							
permisos menores a los 45 metros	11-may	14-may	Ayuntamiento	Municipal	18 ciudadanos	80%	
Fusion, Subdivision y Anuncios							
el conjunto de dos o mas predios, y el desmenbramiento de un predio en dos o mas lotes	11-may	14-may	Ayuntamiento	Municipal	1 ciudadanoS	80%	
Uso de suelo							
compatibilidad urbanistica	11-may	14-may	Ayuntamiento	Municipal	2 ciudadanos	70%	
Conexión de Tuberia							
Conexión de Tuberia, cambio de drenaje o conexión de agua potable	11-may	14-may	Ayuntamiento	Municipal	1 ciudadanos	80%	
Constancias Varias							
constancia de funcionamiento			Ayuntamiento	Municipal	ciudadanos		

INFORME SEMANAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Periodo	Actividad	Fecha de inicio de actividad	Fecha de término	Comunidad/ Cabecera/ Ayuntamiento	Coordinación	Número de beneficiarios de la actividad (impacto)	Status al final de la semana	Observaciones
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA								
	SE TRABAJA EN CAPTURA AL SISTEMA SIA Y RFT, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES PARA ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA A LA ASE.	18 Mayo 2020	22 Mayo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	60%	EN PROCESO
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PATILLOS (ENTRE C. PIRAMIDE DEL SOL Y C. LASALLE, COL. FRANCISCO GOITIA Y CALLE LASALLE (ENTRE C. PATILLOS Y BLVD HOMBRES ILUSTRES, FRESNILLO, ZAC. Se trabaja en la construcción de pavimento.	18 Mayo 2020	22 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	90%	OBRA EN PROCESO (GASTO CORRIENTE 2020)
	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE 36" EN CALLE LA SALLE (ENTRE BLVD HOMBRES ILUSTRES Y CALLE 18 DE MARZO), COL. LA SALLE, FRESNILLO, ZACATECAS.	18 Mayo 2020	22 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	95%	OBRA EN PROCESO (GASTO CORRIENTE 2020)
	REHABILITACIÓN DE FACHADAS EN CALLE ALLENDE Y AV. HIDALGO, COLONIA CENTRO (SEGUNDA ETAPA), CENTRO HISTÓRICO DE FRESNILLO, ZACATECAS. (Se trabaja en aplanados de fachada y pintura de aplanados).	18 Mayo 2020	22 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	35%	OBRA EN PROCESO (GASTO CORRIENTE 2020)
	IMPERMEABILIZACION Y BAJADAS PLUVIALES EN CENTRO DE SERVICIOS, SNTE SECCION 34. (Trabajando en ajuste de metas de muro y en recubrir bajadas pluviales).	18 Mayo 2020	22 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	98%	OBRA EN PROCESO (GASTO CORRIENTE 2020)
	CONSTRUCCION DE KIOSCO EN COMUNIDAD DE CHICHIMEQUILLAS	18 Mayo 2020	22 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	40%	OBRA EN PROCESO (GASTO CORRIENTE 2020)
	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO CON CAPACIDAD DE 2,250 M3 EN REBOMBEO PARDILLO. (Resultados de mecánica de suelos y con la autorización de tala de arboles. En espera de autorización de precios extraordinarios).	18 Mayo 2020	22 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	5%	OBRA EN PROCESO (PRODDER 2020)
	TRABAJOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE PREPARATORIA RAMON LOPEZ VELARDE EN LA LOCALIDAD DE MONTEMARIANA.	18 Mayo 2020	22 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	90%	OBRA EN PROCESO (FONDO MINERO)

Apartir del 18 al 22 mayo 2020	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULAS Y CAMBIO DE PIEZAS PARA MEJORAR LA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIAS DEL VALLE Y MIGUEL HIDALGO (SECTOR 1). LA CONSTRUCCIÓN DE 6 SECTORIZACIONES MEDIANTE PUNTOS DE ALIMENTACIÓN Y DOS PUNTOS DE PRESIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE LA RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE AUMENTO DE CAPACIDAD DE BOMBEO.	18 Mayo 2020	22 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	125,304	87%	FONDO MINERO
	COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL PUENTE HASTA ACCESO PRINCIPAL A COMUNIDAD EN CALLE LÓPEZ MATEOS, COMUNIDAD DE CARRILLO.	18 Mayo 2020	22 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	1,088	70%	TRABAJOS DETENIDOS EN ESPERA DE PAGO FONDO MINERO, PARA CONTINUAR.
	SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA MOTOR SUMERGIBLE EN LOS POZOS 15 Y 16 E INSTALACION DE CAPACITORES EN POZO 17 SISTEMA PARDILLO; Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE EN REBOMBEO 5, POZO 3 Y POZO 5 SISTEMA CARRILLO E INSTALACION DE CAPACITORES EN POZOS 3, 8 Y 10 SISTEMA CARRILLO.	18 Mayo 2020	22 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	122,249	80%	FONDO MINERO. TRABAJOS DETENIDOS EN ESPERA DE RECURSO FONDO MINERO.
	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VALVULA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA EN LA PUESTA EN MARCHA Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 7 SECTORES HIDRÁULICOS EN DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.	18 Mayo 2020	22 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	120,944	70%	FONDO MINERO, TRABAJOS DETENIDOS EN ESPERA DE RECURSO FONDO MINERO
	SE TRABAJA EN BASE HIDRÁULICA SOBRE SEGUNDA GLORIETA EN AV. DOCTORES, COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZAC.	18 Mayo 2020	22 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	96%	FONDO MINERO
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO FISICO								

A partir del 18 al 22 mayo 2020	TRABAJOS DE AREA DRENAJEROS EN: (1) INSTALACIÓN DE TAPA DE DRENAJE EN C. CHABACANOS, COL. ARBOLEDAS (2) LIMPIEZA DE REGISTRO EN EDIFICIO 1, COL EL OLIVAR (3) TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE DRENAJE EN C. 2 DE ABRIL Y MOCTEZUMA (4) ELABORACIÓN DE TAPADERAS DE REGISTRO EN TALLER MUNICIPAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS DENUNCIAS CIUDADANAS (5) LIMPIEZA EN EL TALLER MUNICIPAL (6) DESTAPE DE LINEA GENERAL DE DRENAJE EN C. GONZALEZ ECHEVERRIA, COL. EL OLIVAR (7) LIMPIEZA A LINEA GENERAL DE DRENAJE EN PUENTE A UN COSTADO DE LIVERPOL (8) CORTE DE ZANJA PARA CAMBIO DE TUBERIA EN C. SIERRA DE VALDECAÑAS (9) SONDEO A BAE DE BARRILLAS EN DRENAJE DE C. REFORMA, COL. CENTRO (10) MANTENIMIENTO A LINEA GENERAL DE DRENAJE EN RASTRO TIF (11) SONDEO A LINEA GENERAL DE DRENAJE EN C. MANUEL AVILA CAMACHO, COL. FCO. VILLA (12) MANTENIMEINTO A LINEA GENERAL DE DRENAJE EN C. MECANICOS, COL. SAN JOAQUIN (13) DESASOLVE CON BACALL Y BARILLAS A LINEA GENERAL DE DRENAJE EN C. FUNDA Y BARBIQUEJO, COL. LIENZO CHARRO (14) LIMPIEZA DE REGISTRO EN EDIFICIO 1, COL. EL OLIVVAR (15) REPOSICION DE TUBERIA EN C. 2 DE ABRIL Y MOCTEZUMA, COL BARRIO ALTO (16) LIMPIEZA DE REGISTROS EN C. IGNACIO COMFORT, COL BARRIO ALTO .	18 mayo 2020	22 mayo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	TRABAJOS DE BACHEO: (1) ELABORACION DE TAPAS DE REGISTRO (2) CAMBIO DE TUBERIA EN C. 2 DE ABRIL (3) CORTE DE ZANJA EN C. MARAVILLAS PARA CAMBIO DE DRENAJE EN LINEA GENERAL DE DRENAJE (4) SE ABRIÓ ZANJA PARA REPOSICION DE TUBERIA EN C. SIERRA DE VALDECAÑAS, COL LOMAS DE PLATEROS (5) SE ABRIÓ ZANJA PARA CAMBIO DE TUBERIA EN C. BARBIQUEJO, COL. LIENZO CHARRO	18 mayo 2020	22 mayo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA								
	TRABAJOS EN OFICINA	18 MAYO 2020	18MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	TRABAJOS EN OFICINA	19 MAYO 2020	19 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO								
	Alinimientto y No. oficial							
	Determina el numero ofical del inmueble	18-may	22-may	Ayuntamiento	Municipal	6 ciudadanos	80%	
	Licencias de Construcción							
	permisos mayores a los 45 m, y prorrogas y prorrogas de licencias	18-may	22-may	Ayuntamiento	Municipal	5 ciudadanos y empresas	90%	
	permisos menores a los 45 metros							

permisos menores a los 45 metros	18-may	22-may	Ayuntamiento	Municipal	27 ciudadanos	80%	
Fusion, Subdivicion y Anuncios							
el conjunto de dos o mas predios, y el desmenbramiento de un predio en dos o mas lotes			Ayuntamiento	Municipal	0 ciudadanos		
Uso de suelo							
compatibilidad urbanistica			Ayuntamiento	Municipal	0 ciudadanos	70%	
Conexión de Tubería							
Conexión de Tubería, cambio de drenaje o conexión de agua potable	18-may	22-may	Ayuntamiento	Municipal	1 ciudadanos	90%	
Constancias Varias							
constancia de funcionamiento			Ayuntamiento	Municipal	ciudadanos		

INFORME SEMANAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Periodo	Actividad	Fecha de inicio de actividad	Fecha de término	Comunidad/ Cabecera/ Ayuntamiento	Coordinación	Número de beneficiarios de la actividad (impacto)	Status al final de la semana	Observaciones
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA								
	SE TRABAJA EN CAPTURA AL SISTEMA SIA Y RFT, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES PARA ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA A LA ASE.	25 Mayo 2020	29 Mayo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	98%	EN PROCESO
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PATILLOS (ENTRE C. PIRAMIDE DEL SOL Y C. LASALLE, COL. FRANCISCO GOITIA Y CALLE LASALLE (ENTRE C. PATILLOS Y BLVD HOMBRES ILUSTRES, FRESNILLO, ZAC. Se trabaja en la construcción de pavimento.	25 Mayo 2020	29 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	90%	OBRA EN PROCESO (GASTO CORRIENTE 2020)
	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE 36" EN CALLE LA SALLE (ENTRE BLVD HOMBRES ILUSTRES Y CALLE 18 DE MARZO), COL. LA SALLE, FRESNILLO, ZACATECAS.	25 Mayo 2020	29 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	95%	OBRA EN PROCESO (GASTO CORRIENTE 2020)
	REHABILITACIÓN DE FACHADAS EN CALLE ALLENDE Y AV. HIDALGO, COLONIA CENTRO (SEGUNDA ETAPA), CENTRO HISTÓRICO DE FRESNILLO, ZACATECAS. (Se trabaja en la aplicación de pintura en muros y en la realización de quebra vistas y toldos eso se está trabajando en taller).	25 Mayo 2020	29 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	40%	OBRA EN PROCESO (GASTO CORRIENTE 2020)
	IMPERMEABILIZACION Y BAJADAS PLUVIALES EN CENTRO DE SERVICIOS, SNTE SECCION 34. (Trabajando en ajuste de metas de muro y en recubrir bajadas pluviales).	25 Mayo 2020	29 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	98%	OBRA EN PROCESO (GASTO CORRIENTE 2020)
	CONSTRUCCION DE KIOSCO EN COMUNIDAD DE CHICHIMEQUILLAS	25 Mayo 2020	29 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	65%	OBRA EN PROCESO (GASTO CORRIENTE 2020)
	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO CON CAPACIDAD DE 2,250 M3 EN REBOMBEO PARDILLO. (Desplante de arboles).	25 Mayo 2020	29 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	7%	OBRA EN PROCESO (PRODDER 2020)
	TRABAJOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE PREPARATORIA RAMON LOPEZ VELARDE EN LA LOCALIDAD DE MONTEMARIANA (Falta pintura)	25 Mayo 2020	29 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	95%	OBRA EN PROCESO (FONDO MINERO)

Apartir del 25 al 29 mayo 2020	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULAS Y CAMBIO DE PIEZAS PARA MEJORAR LA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIAS DEL VALLE Y MIGUEL HIDALGO (SECTOR 1). LA CONSTRUCCIÓN DE 6 SECTORIZACIONES MEDIANTE PUNTOS DE ALIMENTACIÓN Y DOS PUNTOS DE PRESIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE LA RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE AUMENTO DE CAPACIDAD DE BOMBEO.	25 Mayo 2020	29 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	125,304	87%	FONDO MINERO
	COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL PUENTE HASTA ACCESO PRINCIPAL A COMUNIDAD EN CALLE LÓPEZ MATEOS, COMUNIDAD DE CARRILLO.	25 Mayo 2020	29 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	1,088	70%	TRABAJO DETENIDOS EN ESPERA DE PAGO FONDO MINERO, PARA CONTINUAR.
	SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA MOTOR SUMERGIBLE EN LOS POZOS 15 Y 16 E INSTALACION DE CAPACITORES EN POZO 17 SISTEMA PARDILLO; Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE EN REBOMBEO 5, POZO 3 Y POZO 5 SISTEMA CARRILLO E INSTALACION DE CAPACITORES EN POZOS 3, 8 Y 10 SISTEMA CARRILLO.	25 Mayo 2020	29 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	122,249	80%	FONDO MINERO. TRABAJOS DETENIDOS EN ESPERA DE RECURSO FONDO MINERO.
	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VALVULA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA EN LA PUESTA EN MARCHA Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 7 SECTORES HIDRÁULICOS EN DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.	25 Mayo 2020	29 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	120,944	70%	FONDO MINERO
	FALTA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN AV. DOCTORES, COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZAC.	25 Mayo 2020	29 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	98.5%	FONDO MINERO (EN TRAMITE DE PAGO ESTIMACIÓN 8)
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO FISICO								

Apartir del 25 al 29 mayo 2020	TRABAJOS DE AREA DRENAJEROS EN: (1) SONDEO DE LINEA GENERALD E DRENAJE EN C. PUERTO RICO COL. LAS AMERICAS (2) SONDEO Y LIMPIEZA EN LINEA GENERAL DE DRENAJE EN CALLEJON SANTA CLARA (3) SONDEO A BASE DE VARILLAS EN LA LINEA CENTRAL DE DRENAJE EN C. AGUILES SERDAN, COL. CENTRO (4) SONDEO Y LIMPIEZA DE REGISTRO EN C. LIMONES, COL. ARBOLEDAS (5) TRABAJOS DE LIMPIEZA EN C. PLUTARCO ELIAS CALLES (6) LIMPIEZA DE REGISTRO Y SONDEO EN LINEA PARTICULAR C. LOZA, COL. OBRERA .	22 mayo 2020	28 mayo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	TRABAJOS DE BACHEO: (1) REPOSICIÓN DE TUBERIA Y RELLENO DE ZANJA EN C. SIERRA DE VALDECAÑAS (2) REPOSICIÓN DE TUBERIA Y CIERRE DE ZANJA EN PRIVADA NIÑO ARTILLERO (3) LIMPIEZA DE ESCOMBRO EN PRIVADA NIÑO ARTILLERO, COL. INDUSTRIAL (4) REPOSICIÓN DE TUBERIA EN C. JOAQUIN ARRIETA (5) LIMPIEZA DE REJILLAS DE AGUAS PLUVIALES EN AV. ENRIQUE ESTRADA.	22 mayo 2020	28 mayo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA								
	TRABAJOS EN OFICINA	22 MAYO 2020	22 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	TRABAJOS EN OFICINA	23 MAYO 2020	23 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS								
	Se actualizó la base de datos proyectos 2019, Se ejecutaron 3 proyecto de apoyo que fueron: una capilla funeraria, una cancha de usos múltiples y pavimentación de calle. También se revisaron dos expedientes para subdivisión.	23 MAYO 2020	23 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO								
	Alinimientoy No. oficial							
	Determina el numero ofical del inmueble	25-may	29-may	Ayuntamiento	Municipal	4 ciudadanos	85%	

Licencias de Construcción							
permisos mayores a los 45 m, y prorrogas y prorrogas de licencias	25-may	29-may	Ayuntamiento	Municipal	19 ciudadanos y empresas	90%	
permisos menores a los 45 metros							
permisos menores a los 45 metros	25-may	29-may	Ayuntamiento	Municipal	18 ciudadanos	80%	
Fusion, Subdivicion y Anuncios							
el conjunto de dos o mas predios, y el desmenbramiento de un predio en dos o mas lotes			Ayuntamiento	Municipal	0 ciudadanos		
Uso de suelo							
compatibilidad urbanistica			Ayuntamiento	Municipal	5 ciudadanos	70%	
Conexión de Tuberia							
Conexión de Tuberia, cambio de drenaje o conexión de agua potable	25-may	29-may	Ayuntamiento	Municipal	3 ciudadanos	80%	
Constancias Varias							
constancia de funcionamiento			Ayuntamiento	Municipal	3 ciudadanos	80%	

INFORME SEMANAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Periodo	Actividad	Fecha de inicio de actividad	Fecha de término	Comunidad/ Cabecera/ Ayuntamiento	Coordinación	Número de beneficiarios de la actividad (impacto)	Status al final de la semana	Observaciones
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA								
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PATILLOS (ENTRE C. PIRAMIDE DEL SOL Y C. LASALLE, COL. FRANCISCO GOITIA Y CALLE LASALLE (ENTRE C. PATILLOS Y BLVD HOMBRES ILUSTRES, FRESNILLO, ZAC. Se trabaja en la construcción de pavimento.	08 Junio 2020	12 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	95%	OBRA EN PROCESO (GASTO CORRIENTE 2020)
	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE 36" EN CALLE LA SALLE (ENTRE BLVD HOMBRES ILUSTRES Y CALLE 18 DE MARZO), COL. LA SALLE, FRESNILLO, ZACATECAS.	08 Junio 2020	12 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	98%	OBRA EN PROCESO (GASTO CORRIENTE 2020)
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA SALLE, COLONIA LA SALLE, FRESNILLO, ZACATECAS.	08 Junio 2020	12 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	20%	OBRA EN PROCESO (GASTO CORRIENTE 2020)
	REHABILITACIÓN DE FACHADAS EN CALLE ALLENDE Y AV. HIDALGO, COLONIA CENTRO (SEGUNDA ETAPA), CENTRO HISTÓRICO DE FRESNILLO, ZACATECAS. (Se trabaja en la aplicación de pintura en muros y en la realización de quebra vistas y toldos eso se está trabajando en taller).	08 Junio 2020	12 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	45%	OBRA EN PROCESO (GASTO CORRIENTE 2020)
	IMPERMEABILIZACION Y BAJADAS PLUVIALES EN CENTRO DE SERVICIOS, SNTE SECCION 34. (Trabajando en ajuste de metas de muro y en recubrir bajadas pluviales).	08 Junio 2020	12 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	98%	OBRA EN PROCESO (GASTO CORRIENTE 2020)
	CONSTRUCCION DE KIOSCO EN COMUNIDAD DE CHICHIMEQUILLAS	08 Junio 2020	12 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	65%	OBRA EN PROCESO (GASTO CORRIENTE 2020)
	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO CON CAPACIDAD DE 2,250 M3 EN REBOMBEO PARDILLO. (Plataforma para cimentación).	08 Junio 2020	12 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	15%	OBRA EN PROCESO (PRODDER 2020)
	TRABAJOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE PREPARATORIA RAMON LOPEZ VELARDE EN LA LOCALIDAD DE MONTEMARIANA (Falta pintura)	08 Junio 2020	12 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	95%	OBRA EN PROCESO (FONDO MINERO)

Apartir del 08 al 12 junio 2020	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULAS Y CAMBIO DE PIEZAS PARA MEJORAR LA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIAS DEL VALLE Y MIGUEL HIDALGO (SECTOR 1). LA CONSTRUCCIÓN DE 6 SECTORIZACIONES MEDIANTE PUNTOS DE ALIMENTACIÓN Y DOS PUNTOS DE PRESIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE LA RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE AUMENTO DE CAPACIDAD DE BOMBEO.	08 Junio 2020	12 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	125,304	87%	FONDO MINERO
	COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL PUENTE HASTA ACCESO PRINCIPAL A COMUNIDAD EN CALLE LÓPEZ MATEOS, COMUNIDAD DE CARRILLO.	08 Junio 2020	12 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	1,088	70%	FONDO MINERO (APARTIR DEL 15 DE JUNIO REANUDA TRABAJOS).
	SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA MOTOR SUMERGIBLE EN LOS POZOS 15 Y 16 E INSTALACION DE CAPACITORES EN POZO 17 SISTEMA PARDILLO; Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE EN REBOMBEO 5, POZO 3 Y POZO 5 SISTEMA CARRILLO E INSTALACION DE CAPACITORES EN POZOS 3, 8 Y 10 SISTEMA CARRILLO.	08 Junio 2020	12 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	122,249	80%	FONDO MINERO. TRABAJOS DETENIDOS EN ESPERA DE RECURSO FONDO MINERO.
	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VALVULA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA EN LA PUESTA EN MARCHA Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 7 SECTORES HIDRÁULICOS EN DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.	08 Junio 2020	12 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	120,944	70%	FONDO MINERO
	FALTA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN AV. DOCTORES, COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZAC.	08 Junio 2020	12 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	99%	FONDO MINERO (EN TRAMITE DE PAGO ESTIMACIÓN 8)
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO FISICO								

Apartir del 08 AL 12 Junio 2020	TRABAJOS DE AREA DRENAJEROS EN: (1) LIMPIEZA DE REGISTROS Y SONEO A BASE DE VARILLAS EN PRIVADA E. ZAPATA, S. LAGUNILLA (2) LIMPIEZA DE REGISTROS Y SONEO A BASE DE VARILLAS EN COMUNIDAD DE CARRILLO (3) DESASOLVE DE LINEA GENERAL DE DRENAJE Y OCHO REGSTROS CON VARILLEROS Y BACALL EN COMUNIDAD DE CARRILLO (4) MANTENIMIENTO EN LINEA INTERIOR Y EXTERIOR DE INSTALCIONES DEL RASTRO TIF. (5) LIMPIEZA DE REGISTROS EN 2DA PRIVADA EMILIANO ZAPATA, COL. BENITO JUAREZ. (5) SONEO LINEA GENERAL DE DRENAJE EN MODULO 30 COL. INDECO. (6) REPOSICIÓN DE 66 MTS LINEALES DE TUBERIA PVC 12" Y RELLENO DE ZANJA EN C. DURANGUITO, COL. CENTRO. (7) COLOCACIÓN DE 10 TRAMOS DE TUBERIA DE PVC DE 10" EN CALLE BARBIQUEJO, COL. LIENZO CHARRO. (8) LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DE AGUAS PLUVIALES EN PRIVADA SSA, COL. FOVISSTE. (9) CAMBIO DE TAPA DE REGISTRO EN C. FCO. JAVIER MINA, COL. CENTRO. (10) SE EMPAREJA ZANJA DE DRENAJE CON REVESTIMIENTO EN PROLONGACIÓN ZARAGOZA. (11) LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS RESIDUALES EN COL. HUERTAS DE ABAJO.	08 Junio 2020	12 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	TRABAJOS DE BACHEO: APOYO A CUADRILLA DE DRENAJEROS	08 Junio 2020	12 junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA								
	TRABAJOS EN OFICINA	08 Junio 2020	08 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	TRABAJOS EN OFICINA	09 Junio 2020	09 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	TRABAJOS EN OFICINA	09 Junio 2020	09 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS								
	Se actualizó la base de datos proyectos 2019, Se ejecutaron 3 proyecto de apoyo que fueron: una capilla funeraria, una cancha de usos múltiples y pavimentación de calle. También se revisaron dos expedientes para subdivisión.	23 MAYO 2020	23 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO								
	Alinimient y No. oficial							

Determina el numero ofical del inmueble	08-jun	11-jun	Ayuntamiento	Municipal	2 ciudadanos	90%	
Licencias de Construcción							
permisos mayores a los 45 m, y prorrogas y prorrogas de licencias	08-jun	11-jun	Ayuntamiento	Municipal	13 ciudadanos y empresas	85%	
permisos menores a los 45 metros							
permisos menores a los 45 metros	08-jun	11-jun	Ayuntamiento	Municipal	19 ciudadanos	80%	
Fusion, Subdivicion y Anuncios							
el conjunto de dos o mas predios, y el desmenbramiento de un predio en dos o mas lotes			Ayuntamiento	Municipal	0 ciudadanos		
Uso de suelo							
compatibilidad urbanistica			Ayuntamiento	Municipal	0 ciudadanos		
Conexión de Tubería							
Conexión de Tubería, cambio de drenaje o conexión de agua potable	08-jun	11-jun	Ayuntamiento	Municipal	4 ciudadanos	80%	
Constancias Varias							
constancia de funcionamiento			Ayuntamiento	Municipal	0 ciudadanos		

INFORME SEMANAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Periodo	Actividad	Fecha de inicio de actividad	Fecha de término	Comunidad/ Cabecera/ Ayuntamiento	Coordinación	Número de beneficiarios de la actividad (impacto)	Status al final de la semana	Observaciones
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA								
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PATILLOS (ENTRE C. PIRAMIDE DEL SOL Y C. LASALLE, COL. FRANCISCO GOITIA Y CALLE LASALLE (ENTRE C. PATILLOS Y BLVD HOMBRES ILUSTRES, FRESNILLO, ZAC. Se trabaja en la construcción de pavimento.	15 Junio 2020	19 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	95%	OBRA EN PROCESO (GASTO CORRIENTE 2020)
	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE 36" EN CALLE LA SALLE (ENTRE BLVD HOMBRES ILUSTRES Y CALLE 18 DE MARZO), COL. LA SALLE, FRESNILLO, ZACATECAS.	15 Junio 2020	19 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	98%	OBRA EN PROCESO (GASTO CORRIENTE 2020)
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA SALLE, COLONIA LA SALLE, FRESNILLO, ZACATECAS.	15 Junio 2020	19 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	20%	OBRA EN PROCESO (GASTO CORRIENTE 2020)
	REHABILITACIÓN DE FACHADAS EN CALLE ALLENDE Y AV. HIDALGO, COLONIA CENTRO (SEGUNDA ETAPA), CENTRO HISTÓRICO DE FRESNILLO, ZACATECAS. (Se trabaja en suministro y colocación de toldos).	15 Junio 2020	19 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	50%	OBRA EN PROCESO (GASTO CORRIENTE 2020)
	IMPERMEABILIZACION Y BAJADAS PLUVIALES EN CENTRO DE SERVICIOS, SNTE SECCION 34. (Trabajando en ajuste de metas de muro y en recubrir bajadas pluviales).	15 Junio 2020	19 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	98%	OBRA EN PROCESO (GASTO CORRIENTE 2020)
	CONSTRUCCION DE PLAZA EN CHICHIMEQUILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS	15 Junio 2020	19 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	55%	OBRA EN PROCESO (GASTO CORRIENTE 2020)
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LA LAGUNA Y CALLE FRENTE AL TEMPLO, EN LA COMUNIDAD DE CHICHIMEQUILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	15 Junio 2020	19 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	70%	OBRA EN PROCESO (GASTO CORRIENTE 2020)
	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO CON CAPACIDAD DE 2,250 M3 EN REBOMBEO PARDILLO. (Se trabaja en armado de acero para cimentación).	15 Junio 2020	19 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	15%	OBRA EN PROCESO (PRODDER 2020)
	TRABAJOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE PREPARATORIA RAMON LOPEZ VELARDE EN LA LOCALIDAD DE MONTEMARIANA (Falta pintura)	15 Junio 2020	19 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	95%	OBRA EN PROCESO (FONDO MINERO)

Apartir del 15 al 19 junio 2020	CONSTRUCCIÓN DE 6 SECTORIZACIONES MEDIANTE PUNTOS DE ALIMENTACIÓN, (SECTOR 1 - DEL VALLE, SECTOR 2 - PARQUE INDUSTRIAL, SECTOR 3 - SOLIDARIDAD, SECTOR 4 - ESTACIÓN SAN JOSÉ, SECTOR 5 - LAGUNA SECA, SECTOR 6 - SAN FELIPE) Y DOS PUNTOS DE PRESIÓN EN SECTOR 1 DEL VALLE Y COLONIA LOMAS DEL MINERAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE LA RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE AUMENTO DE CAPACIDAD DE BOMBEO, EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS. PRIMERA ETAPA.	15 Junio 2020	19 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	125,304	95%	FONDO MINERO
	SE TRABAJA EN PAVIMENTO DE LA SEGUNDA SECCIÓN DE ACCESO A LA COMUNIDAD EN CALLE LÓPEZ MATEOS, COMUNIDAD DE CARRILLO, FRESNILLO, ZAC.	15 Junio 2020	19 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	1,088	80%	FONDO MINERO
	SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA MOTOR SUMERGIBLE EN LOS POZOS 15 Y 16 E INSTALACION DE CAPACITORES EN POZO 17 SISTEMA PARDILLO; Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE EN REBOMBEO 5, POZO 3 Y POZO 5 SISTEMA CARRILLO E INSTALACION DE CAPACITORES EN POZOS 3, 8 Y 10 SISTEMA CARRILLO.	15 Junio 2020	19 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	122,249	80%	FONDO MINERO. TRABAJOS DETENIDOS EN ESPERA DE RECURSO FONDO MINERO.
	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VALVULA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA EN LA PUESTA EN MARCHA Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 7 SECTORES HIDRÁULICOS EN DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.	15 Junio 2020	19 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	120,944	70%	FONDO MINERO
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 16,470 M2, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. DOCTORES, COLONIA FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS. (Falta señalamiento vertical bajo y terminar registros eléctrico).	15 Junio 2020	19 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	99.4%	FONDO MINERO
	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO FISICO							

Apartir del 15 AL 19 Junio 2020	TRABAJOS DE AREA DRENAJEROS Y BACHEO EN: (1) REPARACIÓN DE CIMIENTOS DE LA DEPORTIVA BENITO JUAREZ (2) REPOSICIÓN DE 50 MTS LINEALES DE TUBERIA PVC 12" EN C. RECREO COL OBRERA (3) LIMPIEZA Y PINTA DE GUARNICIONES DE LA PRIVADA GABRIEL LUGO Y PRIVADA 2DA GABRIEL LUGO (4) ZANJA PARA REPOSICIÓN DE TUBERIA DE DRENAJE EN CALLE MANGANA COL LIENZO CHARRO (5) LIMPIEZA DE REGISTRO EN CALLE SALTILLO COL SAN JAVIER. (6) LIMPIEZA DE ESCOMBRO EN CALLE CHABACANOS COL ARBOLEDAS. (7) LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE MANUEL M PONCE COL EL OLIVAR. (8) REPOSICIÓN DE TUBERIA DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE EN CALLE FELIPE ANGELES COL. EMILIANO ZAPATA. (9) LIMPIEZA DE REGISTRO Y LINEA GENERAL DE DRENAJE CON VACALL EN AV. TECNOLOGICA COL. SOLIDARIDAD. (10) DESASOLVE DE LINEA GENERAL DE DRENAJE Y LIMPIEZA DE REGISTRO EN COL EL OLIVAR. (11) LIMPIEZA DE REGISTRO Y DESSOLVE DE LINEA GEERAL DE DRENAJE EN CALLE MORELOS COL MIGUEL HIDALGO. (12) SONDEO DE 125 M CON BARRILLAS Y BACALL A LINEA GENERAL DE DRENAJE EN CALLE FELIPE ANGELES COL FCO. VILLA. (13) LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN GASOLINERA GUDE SALIDA A DURANGO. (14) DESASOLVE DE 80 MTS DE LINEA GENERAL DE DRENAJE EN CALLE SIERRA FRIA COL LOMAS DE PLATEROS. (15) SONDEO DE LINEA GENERAL DE DRENAJE EN AV. TECNOLOGICA COL SOLIDARIDAD. (16) LIMPEZA DE FOSA SEPTICA EN COMUNIDAD EL TRIUNFO SIN COBRO POR EL SERVICIO. (17) LIMPIEZA DE DRENAJE EN COMUNIDAD ESTACIÓN SAN JOSE. (18) LIMPIEZA DE DOS FOSAS SEPTICAS EN	15 Junio 2020	19 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA							
	TRABAJOS EN OFICINA	15 Junio 2020	15 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	TRABAJOS EN OFICINA	16 Junio 2020	16 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	TRABAJOS EN OFICINA	19 Junio 2020	19 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS							
	Se actualizó la base de datos proyectos 2019, Se ejecutaron 3 proyecto de apoyo que fueron: una capilla funeraria, una cancha de usos múltiples y pavimentación de calle. También se revisaron dos expedientes para subdivisión.	23 MAYO 2020	23 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO							
	Alinimientoy No. oficial							
	Determina el numero ofical del inmueble	15-jun	18-jun	Ayuntamiento	Municipal	6 ciudadanos	80%	
	Licencias de Construcción							
	permisos mayores a los 45 m, y prorrogas y prorrogas de licencias	15-jun	18-jun	Ayuntamiento	Municipal	19 ciudadanos y empresas	90%	
	permisos menores a los 45 metros							

permisos menores a los 45 metros	15-jun	18-jun	Ayuntamiento	Municipal	16 ciudadanos	85%	
Fusion, Subdivision y Anuncios							
el conjunto de dos o mas predios, y el desmenbramiento de un predio en dos o mas lotes			Ayuntamiento	Municipal	0 ciudadanos		
Uso de suelo							
compatibilidad urbanistica			Ayuntamiento	Municipal	0 ciudadanos		
Conexión de Tubería							
Conexión de Tubería, cambio de drenaje o conexión de agua potable	15-jun	18-jun	Ayuntamiento	Municipal	3 ciudadanos	80%	
Constancias Varias							
constancia de funcionamiento			Ayuntamiento	Municipal	0 ciudadanos		

INFORME SEMANAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Periodo	Actividad	Fecha de inicio de actividad	Fecha de término	Comunidad/ Cabecera/ Ayuntamiento	Coordinación	Número de beneficiarios de la actividad (impacto)	Status al final de la semana	Observaciones
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA								
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PATILLOS (ENTRE C. PIRAMIDE DEL SOL Y C. LASALLE, COL. FRANCISCO GOITIA Y CALLE LASALLE (ENTRE C. PATILLOS Y BLVD HOMBRES ILUSTRES, FRESNILLO, ZAC. Se trabaja en la construcción de pavimento.	22 Junio 2020	26 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	95%	OBRA EN PROCESO (GASTO CORRIENTE 2020)
	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE 36" EN CALLE LA SALLE (ENTRE BLVD HOMBRES ILUSTRES Y CALLE 18 DE MARZO), COL. LA SALLE, FRESNILLO, ZACATECAS.	22 Junio 2020	26 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	98%	OBRA EN PROCESO (GASTO CORRIENTE 2020)
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA SALLE, COLONIA LA SALLE, FRESNILLO, ZACATECAS. (Se trabaja en cimbrado y colado de guarnición, así como relleno y compactación de material de banco).	22 Junio 2020	26 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	30%	OBRA EN PROCESO (GASTO CORRIENTE 2020)
	REHABILITACIÓN DE FACHADAS EN CALLE ALLENDE Y AV. HIDALGO, COLONIA CENTRO (SEGUNDA ETAPA), CENTRO HISTÓRICO DE FRESNILLO, ZACATECAS. (Se trabaja en suministro y colocación de toldos y quebravistas).	22 Junio 2020	26 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	50%	OBRA EN PROCESO (GASTO CORRIENTE 2020)
	IMPERMEABILIZACION Y BAJADAS PLUVIALES EN CENTRO DE SERVICIOS, SNTE SECCION 34. (Trabajando en ajuste de metas de muro y en recubrir bajadas pluviales).	22 Junio 2020	26 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	98%	OBRA EN PROCESO (GASTO CORRIENTE 2020)
	CONSTRUCCION DE PLAZA EN CHICHIMEQUILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS	22 Junio 2020	26 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	60%	OBRA EN PROCESO (GASTO CORRIENTE 2020)
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LA LAGUNA Y CALLE FRENTE AL TEMPLO, EN LA COMUNIDAD DE CHICHIMEQUILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	22 Junio 2020	26 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	95%	OBRA EN PROCESO (GASTO CORRIENTE 2020)
	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO CON CAPACIDAD DE 2,250 M3 EN REBOMBEO PARDILLO. (Se trabaja en armado de acero para cimentación).	22 Junio 2020	26 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	25%	OBRA EN PROCESO (PRODDER 2020)
	TRABAJOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE PREPARATORIA RAMON LOPEZ VELARDE EN LA LOCALIDAD DE MONTEMARIANA (Falta pintura)	22 Junio 2020	26 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	95%	OBRA EN PROCESO (FONDO MINERO)

Apartir del 22 al 26 junio 2020	CONSTRUCCIÓN DE 6 SECTORIZACIONES MEDIANTE PUNTOS DE ALIMENTACIÓN, (SECTOR 1 - DEL VALLE, SECTOR 2 - PARQUE INDUSTRIAL, SECTOR 3 - SOLIDARIDAD, SECTOR 4 - ESTACIÓN SAN JOSÉ, SECTOR 5 - LAGUNA SECA, SECTOR 6 - SAN FELIPE) Y DOS PUNTOS DE PRESIÓN EN SECTOR 1 DEL VALLE Y COLONIA LOMAS DEL MINERAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE LA RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE AUMENTO DE CAPACIDAD DE BOMBEO, EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS. PRIMERA ETAPA.	22 Junio 2020	26 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	125,304	95%	FONDO MINERO
	SE TRABAJA EN COLADO DE PAVIMENTO DE LA SEGUNDA SECCIÓN DE ACCESO A LA COMUNIDAD EN CALLE LÓPEZ MATEOS, COMUNIDAD DE CARRILLO, FRESNILLO, ZAC.	22 Junio 2020	26 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	1,088	85%	FONDO MINERO
	SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA MOTOR SUMERGIBLE EN LOS POZOS 15 Y 16 E INSTALACION DE CAPACITORES EN POZO 17 SISTEMA PARDILLO; Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE EN REBOMBEO 5, POZO 3 Y POZO 5 SISTEMA CARRILLO E INSTALACION DE CAPACITORES EN POZOS 3, 8 Y 10 SISTEMA CARRILLO.	22 Junio 2020	26 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	122,249	80%	FONDO MINERO. TRABAJOS DETENIDOS EN ESPERA DE RECURSO FONDO MINERO.
	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VALVULA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA EN LA PUESTA EN MARCHA Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 7 SECTORES HIDRÁULICOS EN DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.	22 Junio 2020	26 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	120,944	70%	FONDO MINERO
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 16,470 M2, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. DOCTORES, COLONIA FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS. (Falta señalamiento vertical bajo y terminar registros eléctrico).	22 Junio 2020	26 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	99.4%	FONDO MINERO
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO FISICO								

	TRABAJOS DE AREA DRENAJEROS Y BACHEO EN: (1) REPARACIÓN DE CIMIENTOS DE LA DEPORTIVA BENITO JUAREZ (2) REPOSICIÓN DE 50 MTS LINEALES DE TUBERIA PVC 12" EN C. RECREO COL OBRERA (3) LIMPIEZA Y PINTA DE GUARNICIONES DE LA PRIVADA GABRIEL LUGO Y PRIVADA 2DA GABRIEL LUGO (4) ZANJA PARA REPOSICIÓN DE TUBERIA DE DRENAJE EN CALLE MANGANA COL LIENZO CHARRO (5) LIMPIEZA DE REGISTRO EN CALLE SALTILLO COL SAN JAVIER. (6) LIMPIEZA DE ESCOMBRO EN CALLE CHABACANOS COL ARBOLEDAS. (7) LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE MANUEL M PONCE COL EL OLIVAR. (8) REPOSICIÓN DE TUBERIA DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE EN CALLE FELIPE ANGELES COL. EMILIANO ZAPATA. (9) LIMPIEZA DE REGISTRO Y LINEA GENERAL DE DRENAJE CON VACALL EN AV. TECNOLOGICA COL. SOLIDARIDAD. (10) DESASOLVE DE LINEA GENERAL DE DRENAJE Y LIMPIEZA DE REGISTRO EN COL EL OLIVAR. (11) LIMPIEZA DE REGISTRO Y DESSOLVE DE LINEA GEERAL DE DRENAJE EN CALLE MORELOS COL MIGUEL HIDALGO. (12) SONDEO DE 125 M CON BARRILLAS Y BACALL A LINEA GENERAL DE DRENAJE EN CALLE FELIPE ANGELES COL FCO. VILLA. (13) LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN GASOLINERA GUDE SALIDA A DURANGO. (14) DESASOLVE DE 80 MTS DE LINEA GENERAL DE DRENAJE EN CALLE SIERRA FRIA COL LOMAS DE PLATEROS. (15) SONDEO DE LINEA GENERAL DE DRENAJE EN AV. TECNOLOGICA COL SOLIDARIDAD. (16) LIMPEZA DE FOSA SEPTICA EN COMUNIDAD EL TRIUNFO SIN COBRO POR EL SERVICIO. (17) LIMPIEZA DE DRENAJE EN COMUNIDAD ESTACIÓN SAN JOSE. (18) LIMPIEZA DE DOS FOSAS SEPTICAS EN	22 Junio 2020	26 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA								
	TRABAJOS EN OFICINA	22 Junio 2020	22 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	TRABAJOS EN OFICINA	23 Junio 2020	23 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	TRABAJOS EN OFICINA	24 Junio 2020	24 Junio 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS								
	Se actualizó la base de datos proyectos 2019, Se ejecutaron 3 proyecto de apoyo que fueron: una capilla funeraria, una cancha de usos múltiples y pavimentación de calle. También se revisaron dos expedientes para subdivisión.	23 MAYO 2020	23 MAYO 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO								
Alinimientto y No. oficial								
	Determina el numero ofical del inmueble	22-jun	26-jun	Ayuntamiento	Municipal	7 ciudadanos	75%	
Licencias de Construcción								
	permisos mayores a los 45 m, y prorroas y prorroas de licencias	22-jun	26-jun	Ayuntamiento	Municipal	10 ciudadanos y empresas	90%	
permisos menores a los 45 metros								

permisos menores a los 45 metros	22-jun	26-jun	Ayuntamiento	Municipal	17 ciudadanos	85%	
Fusion, Subdivicion y Anuncios							
el conjunto de dos o mas predios, y el desmenbramiento de un predio en dos o mas lotes	22-jun	26-jun	Ayuntamiento	Municipal	3 ciudadanos	70%	
Uso de suelo							
compatibilidad urbanistica	22-jun	26-jun	Ayuntamiento	Municipal	2 ciudadanos	85%	
Conexión de Tubería							
Conexión de Tubería, cambio de drenaje o conexión de agua potable	22-jun	26-jun	Ayuntamiento	Municipal	2 ciudadanos	80%	
Constancias Varias							
constancia de funcionamiento	22-jun	26-jun	Ayuntamiento	Municipal	1 ciudadanos	90%	



INGRESOS DESARROLLO URBANO 2020

TIPO DE TRÁMITE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
	PERMISOS EXPEDIDOS	TOTAL \$	PERMISOS EXPEDIDOS	TOTAL \$	PERMISOS EXPEDIDOS	TOTAL \$	PERMISOS EXPEDIDOS	TOTAL \$	PERMISOS EXPEDIDOS	TOTAL \$	PERMISOS EXPEDIDOS	TOTAL \$
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	62	\$ 2712740,82	54	\$ 519659,64	80	\$ 432934,98	36	\$ 286199,58	42	\$ 302204,90	44	\$ 381866,36
PERMISOS VARIOS	113	\$ 111622,00	90	\$ 86574,70	120	\$ 178741,05	56	\$ 82806,00	73	\$ 57991,40	87	\$ 75131,00
CONTRATOS DE DRENAJE	2	\$ 1190,00	0	\$ -	1	\$ 595,00	7	\$ 6545,00	6	\$ 3571,00	12	\$ 8330,00
CONSTANCIAS DE TERMINACIÓN DE OBRA	0	-	4	\$ 2678,00	8	\$ 4718,00	1	337,00	1	337,00	5	1685,00
COMPATIBILIDAD URB. Y USO DE SUELO	3	\$ 771,00	10	\$ 3082,00	28	\$ 8652,00	5	\$ 1540,00	20	\$ 6180,00	31	\$ 9870,00
CONSTANCIA DE ADJUDICACIÓN Y VACANCIA	0	-										
CONSTANCIAS VARIAS	1	\$ 169,00	4	\$ 2390,00	14	\$ 6634,00			2	\$ 720,00	3	\$ 3014,00
AUTORIZACIÓN DE ANUNCIOS VARIOS	12	\$ 83215,20	5	\$ 59312,00	4	\$ 85910,00			5	\$ 156396,00	2	\$ 108565,00
AUTORIZACIÓN DE SUBDIVISIONES	13	\$ 8509,00	17	\$ 11873,00	12	\$ 54436,00	5	\$ 4155,00	5	\$ 2961,00	14	\$ 23537,00
AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS Y RELOTIFICACIONES.	0	-										
ALINEAMIENTO Y NO. OFICIALES	128	\$ 37888,00	147	\$ 83292,00	100	\$ 32528,00	28	\$ 8512,00	45	\$ 13680,00	29	\$ 8816,00
RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO											28,00	12864,00
PRORROGAS												
MULTA									3	8400,00		
LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA											1	3379,60
TOTAL	334	\$ 2956105,02	331	\$ 768861,34	367	\$ 805149,03	138	\$ 390094,58	202	\$ 552441,30	255	\$ 637057,96
